

面談資料

## 1/2号SGTS配管撤去（その1）の進捗状況について

2023年6月15日


**TEPCO**

---


東京電力ホールディングス株式会社

## SGTS配管撤去（その1）の配管切断箇所

- SGTS配管撤去（その1）では残り9本（配管①～⑨）のSGTS配管を撤去する予定。
- そのうち配管①～⑧の8本を先行切断。（現時点で、配管①②③④の切断を完了）
- 配管⑨については、SGTS配管が廃棄物処理建屋建造物と干渉していることを、3Dスキャン採取時に確認した。建屋干渉物撤去には周辺ガレキの撤去が必要であるため、工程組み替えを行いガレキを撤去した後、建屋干渉物の撤去及びSGTS配管の切断、撤去を行う予定。
- また、配管⑨は1号機大型カバー設置工事で干渉がないことを確認している。

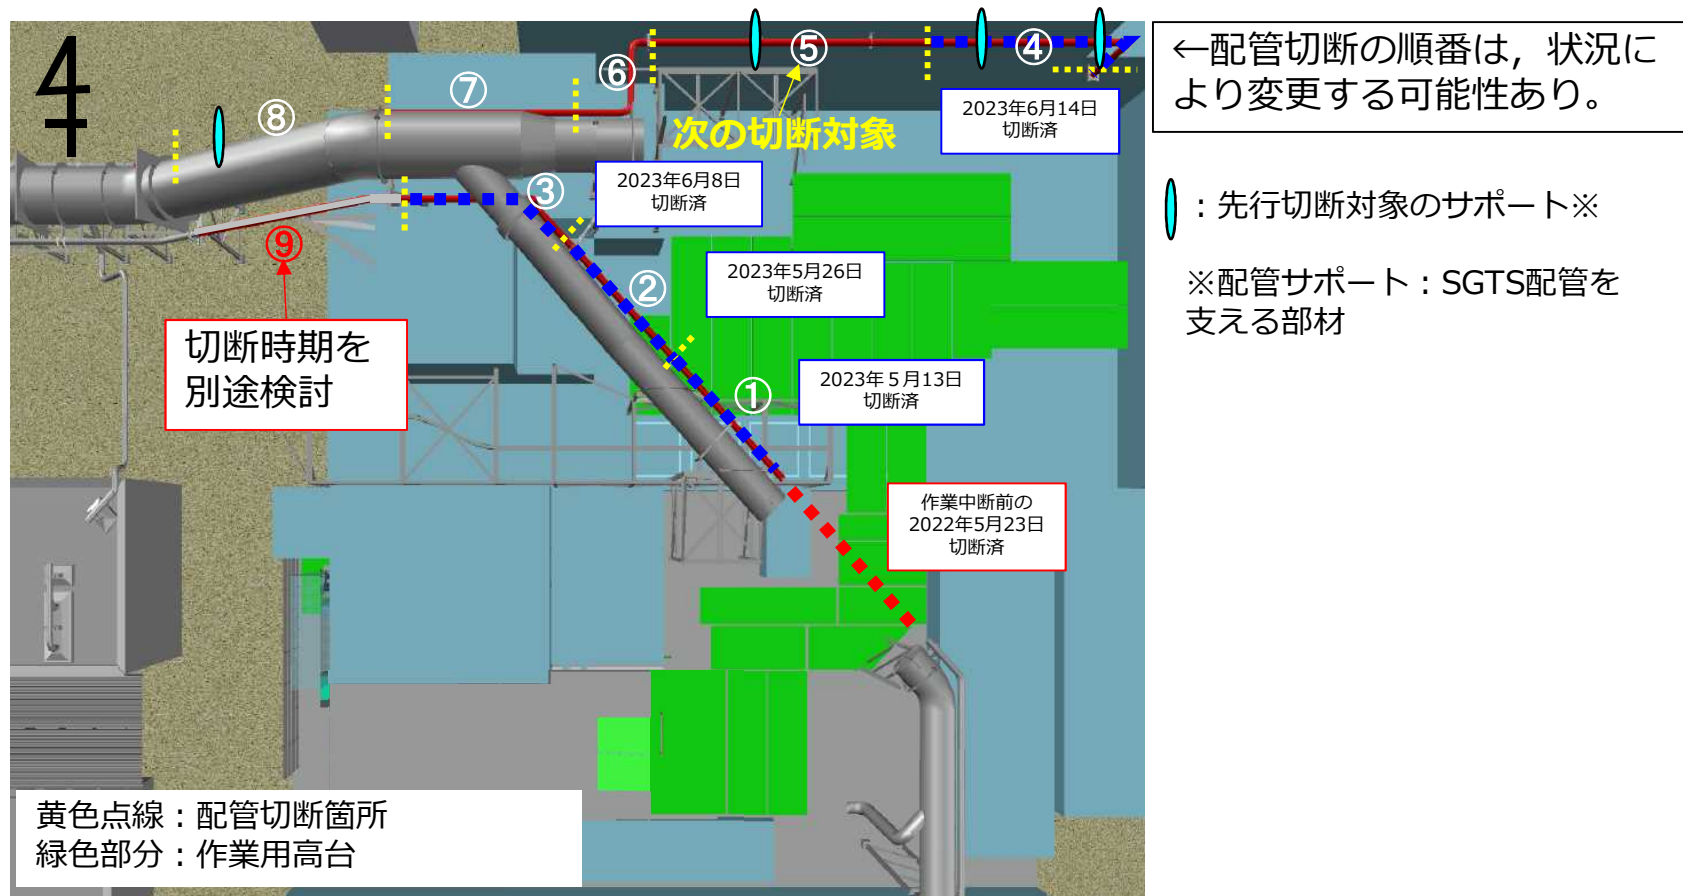


# SGTS配管撤去工程及び1/2号機周辺工事の進捗状況

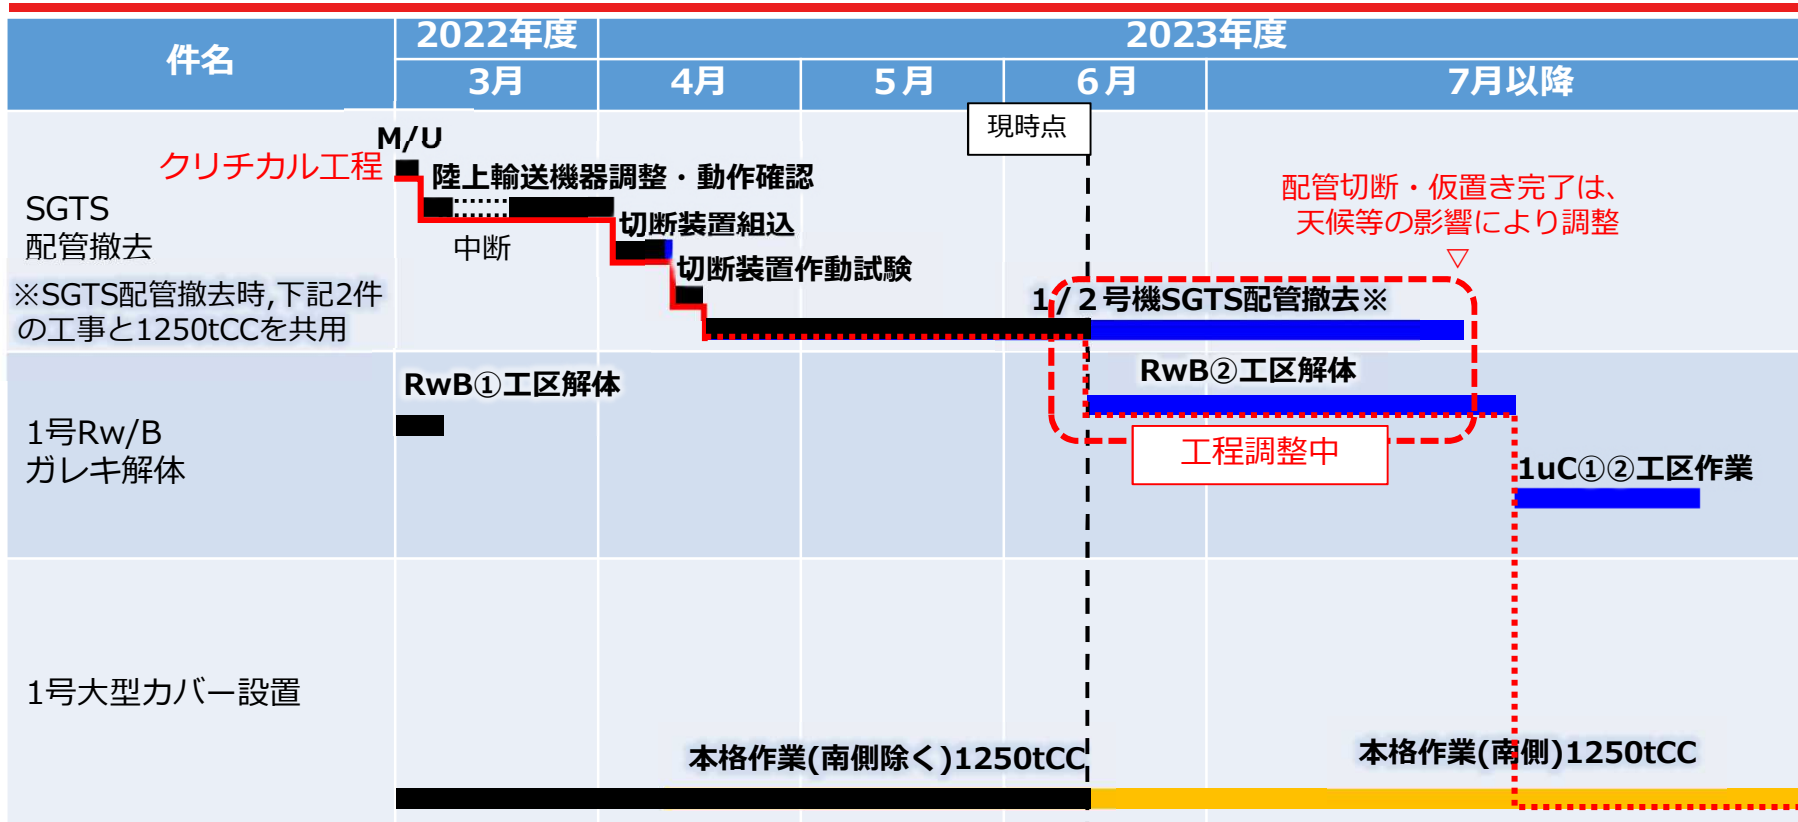

CC : クローラークレーン

## ○現状

- 1/2号機Rw/B上部のSGTS配管撤去の信頼度向上対策を完了。
- SGTS配管撤去の後工程と工程調整中。
- 1/2号機Rw/B上部のSGTS配管撤去期間中、1号Rw/Bガレキ解体及び1号大型カバー設置と1250tCCを共用する。

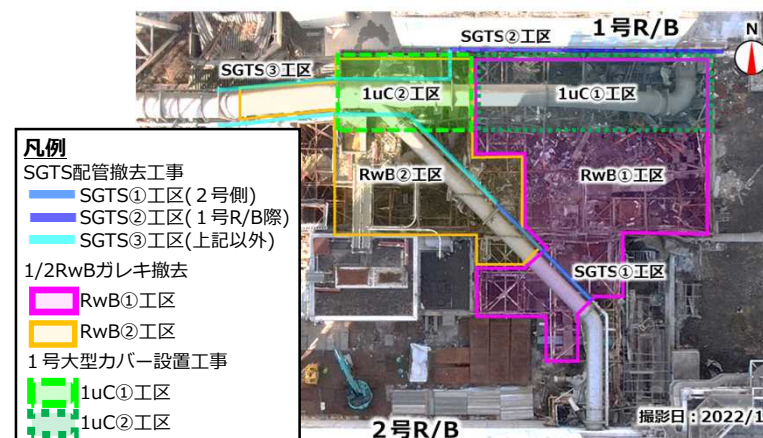

## 2号機SGTS配管仮置き状況

- 1/2号機SGTS配管仮置き時、配管の上流下流が後の事故調査で確認できるように仮置きする際、配管の方向を確認している。
- 配管の上下は、ウレタン注入点や線量測定時のマーキング跡により確認可能。

