

環境線量低減対策 スケジュール

| 区分     | 括り                              | 作業内容   | これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定                           |   | 12月 |   | 1月 |    |    | 2月 |   |   | 3月 |   |   | 4月 |   |   | 5月 |   |   | 6月 |   |   | 7月以降 | 備考   |
|--------|---------------------------------|--|---|---|-----|---|----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|------|--|
|        |                                 |  | 19  | 26  | 2   | 9 | 16 | 23 | 30 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 |      |  |
| 放射線量低減 | 敷地内線量低減<br>・段階的な線量低減            | <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構内全域の状況把握サーベイ<br/>⇒12月6日～12月16日(5、6号機西側)</li> <li>・構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>○線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>・運屋エリア(3号機海側等) (建物除去・路盤舗装等)</li> </ul> </li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構内全域の状況把握サーベイ<br/>⇒1月11日～2月(1～4号機周辺(上期分))</li> <li>・構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)<br/>⇒2月(第4回半期分)</li> </ul> </li> </ul> | 検討・設計   |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
|        |                                 |  | 現場作業  | <p>■線量率測定</p> <p>構内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ)</p> <p>■線量率測定</p> <p>構内全域の走行サーベイ</p>  |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      | 5月、8月、11月、2月実施予定                               |
|        |                                 |  | <p>2021年9月末現在</p> <p>エリア平均で5µSv/hを達成したエリア</p> |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
| 放射線量低減 | 海洋汚染拡大防止<br>・モニタリング<br>・排水路整備   | <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング<br/>地下水モニタリング</li> <li>【排水路対策】 排水路モニタリング<br/>K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認)<br/>排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理</li> <li>【深淺測量】 深淺測量2021年度</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング<br/>地下水モニタリング</li> <li>【排水路対策】 排水路モニタリング<br/>K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認)<br/>K排水路上流部調査(枝管サンプリング)(雨期)<br/>排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理</li> <li>【深淺測量】</li> </ul>   | 検討・設計   |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
|        |                                 |  | 現場作業  | <p>■護岸エリア地下水対策</p> <p>港湾内外海水モニタリング</p> <p>地下水モニタリング</p> <p>■排水路対策</p> <p>排水路モニタリング</p> <p>K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認)</p> <p>K排水路上流部調査(枝管サンプリング)</p> <p>排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理</p> <p>■深淺測量</p> |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      | 2018年9月21日1～3号機タービン建屋下層の雨樋に浄化材設置完了。浄化材の効果を確認中。 |
|        |                                 |  |   |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
| 評価     | 環境影響評価<br>・モニタリング<br>・傾向把握、効果評価 | <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>・降下物測定(月1回)</li> <li>・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回)</li> <li>・20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(毎月)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>・降下物測定(月1回)</li> <li>・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回)</li> <li>・20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(毎月)</li> </ul>  | 検討・設計   |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
|        |                                 |  | 現場作業  | <p>原子炉建屋上部ダスト濃度測定</p> <p>降下物測定</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺、宮城県沖、宮城県沖)</p> <p>20km圏内 魚介類モニタリング</p>   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |
|        |                                 |  |   |   |     |   |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |      |  |

# タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2022/1/25

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# モニタリング計画（観測点の配置）

● 港湾口北東側

● 港湾口東側


● 港湾口南東側

● 北防波堤北側

● 南防波堤南側

● 海洋への影響のモニタリング  
● 港湾内の放射能濃度分布のモニタリング

● 港湾内への影響のモニタリング  
■ 地下水濃度のモニタリング

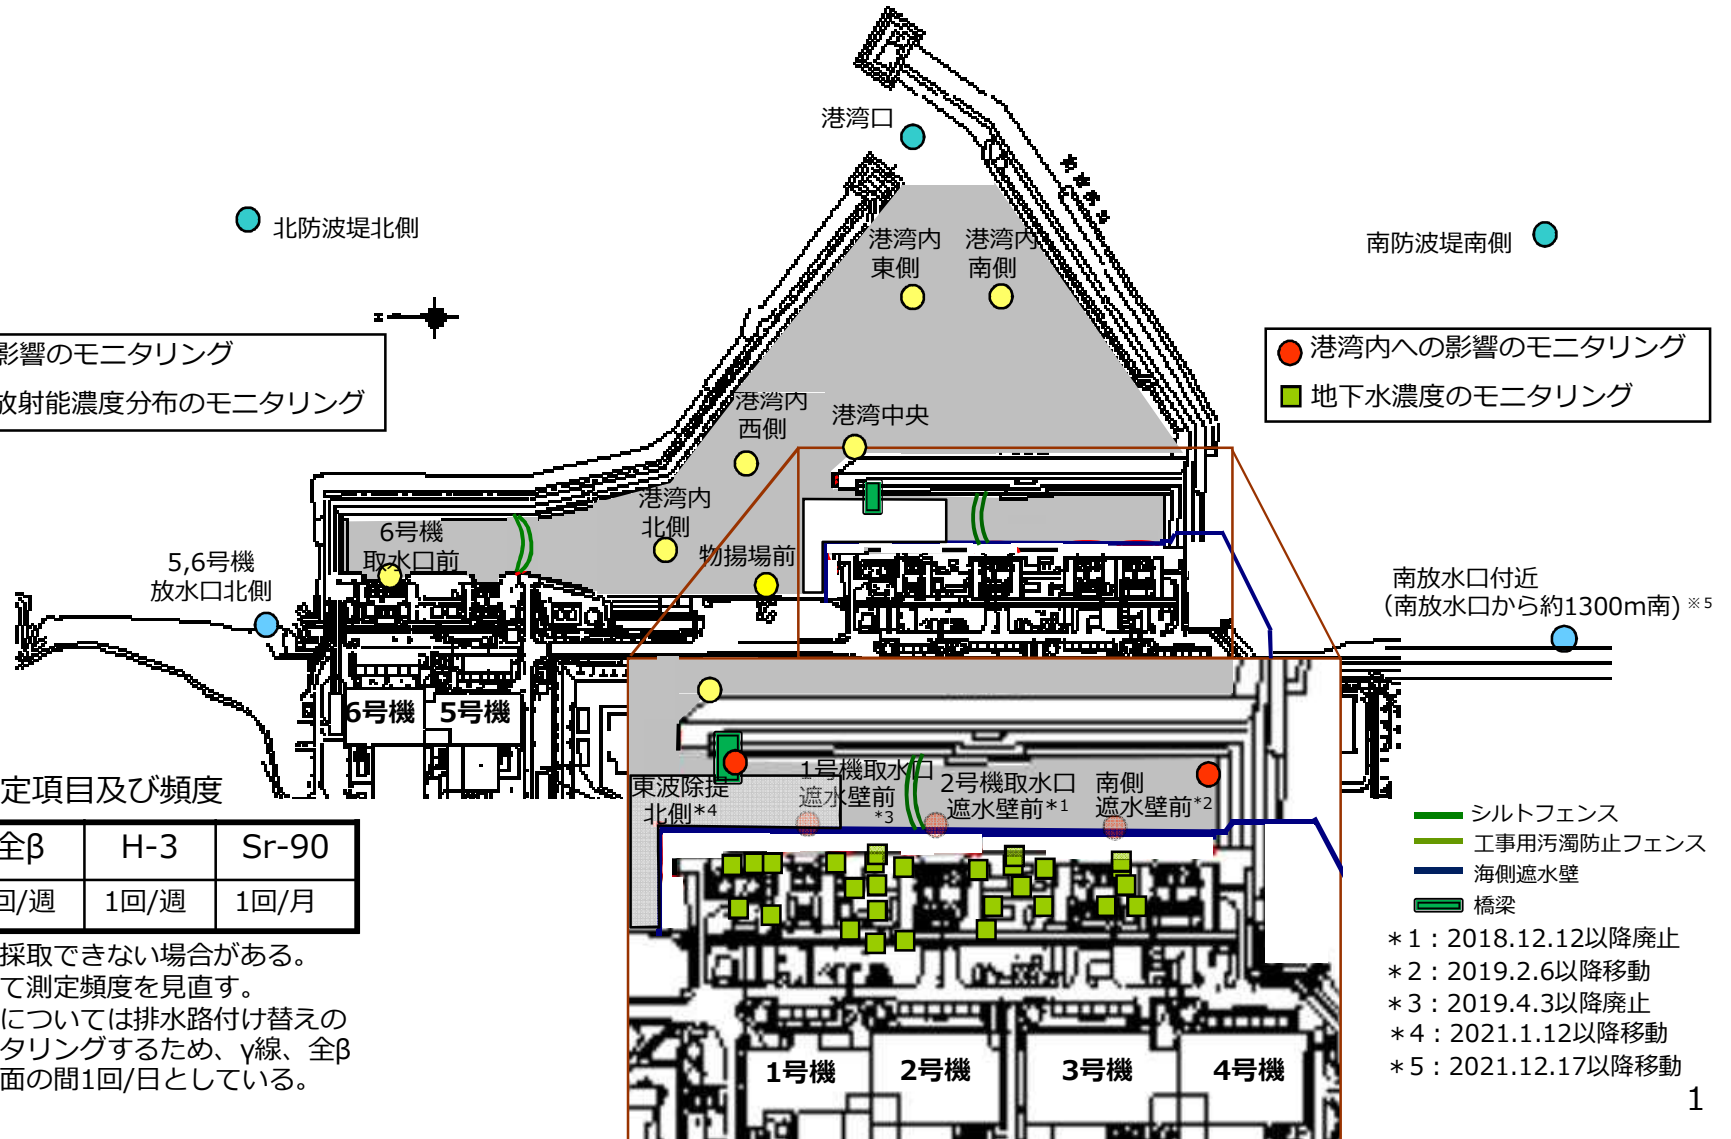

基本的な測定項目及び頻度

| γ線   | 全β   | H-3  | Sr-90 |
|------|------|------|-------|
| 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/月  |

- ・天候により採取できない場合がある。
- ・必要に応じて測定頻度を見直す。
- ・港湾内海水については排水路付け替えの影響をモニタリングするため、γ線、全βについて当面の間1回/日としている。

- シルトフェンス
- 工事用汚濁防止フェンス
- 海側遮水壁
- 橋梁
- \* 1 : 2018.12.12以降廃止
- \* 2 : 2019.2.6以降移動
- \* 3 : 2019.4.3以降廃止
- \* 4 : 2021.1.12以降移動
- \* 5 : 2021.12.17以降移動

### <タービン建屋東側の地下水濃度>

- 全体的に低下もしくは横ばい傾向にあるが、一部観測点によっては変動が見られる。  
引き続き、傾向を監視していく。

### <排水路の排水濃度>

- 降雨時に濃度が上昇する傾向にあるが、全体的に横ばい傾向にある。
  - ・ 道路・排水路の土砂回収、フェーシングを実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中。

### <港湾内外の海水濃度>

- 港湾内では降雨時に上昇が見られるが、港湾外では変化は見られず低い濃度で推移している。<sup>※1</sup>
  - ・ 港湾内（取水路開渠内含む）の濃度について、上昇時においても告示濃度を十分に下回っている。<sup>※2</sup>
  - ・ 道路・排水路の土砂回収、フェーシング、海側遮水壁閉合、取水路開渠出口へのシルトフェンス設置等の対策の効果によるものと考えられる。

「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」の記載


※1：P.3 3-1.(1)「周辺海域の海水の放射性物質濃度は、告示で定める濃度限度や世界保健機関の飲料水水質ガイドラインの水準を下回っており、低い水準を維持している。」

※2：P.26 4-6. (2) ①「港湾内の放射性物質濃度が告示に定める濃度限度を安定して下回るよう、港湾内へ流出する放射性物質の濃度をできるだけ低減させる。」



# タービン建屋東側の地下水濃度 (1/2)

## <1号機取水口北側、1,2号機取水口間>

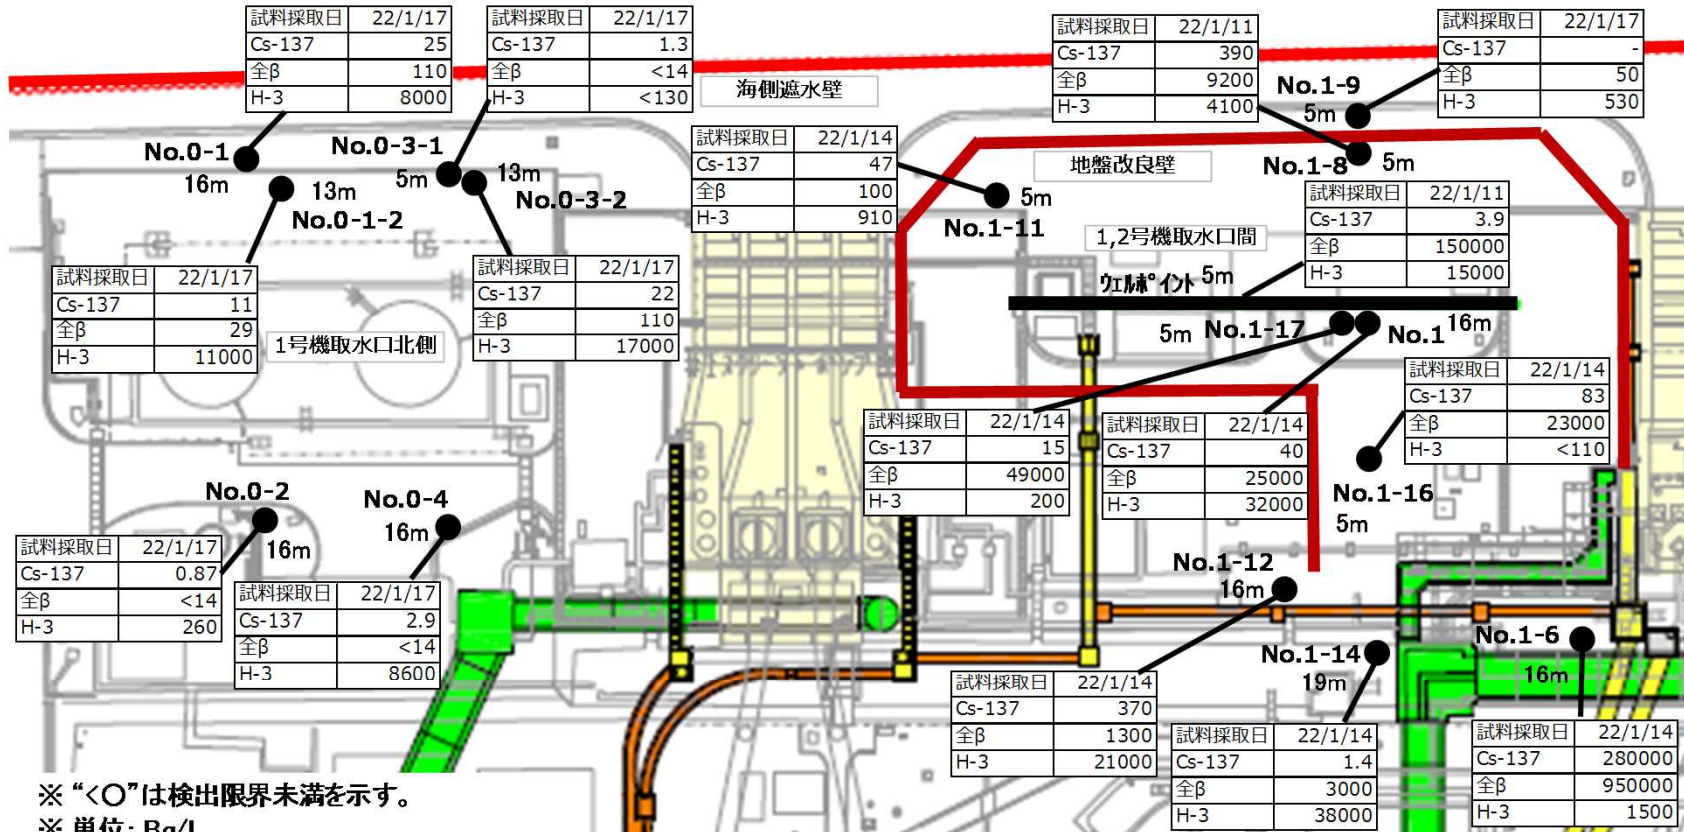


- ※ “<O”は検出限界未満を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

| 地下水移送量 (移送先: 2号機タービン建屋)                             |   |
|---|---|
| 1号機北側揚水ピット<br>1,2号機間改修ウェル, ウェルピット<br>地下水ドレン中継タンク(A) | 193m <sup>3</sup> /4週<br>(12/16 0時~1/13 0時) |

# タービン建屋東側の地下水濃度 (2/2)

## <2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

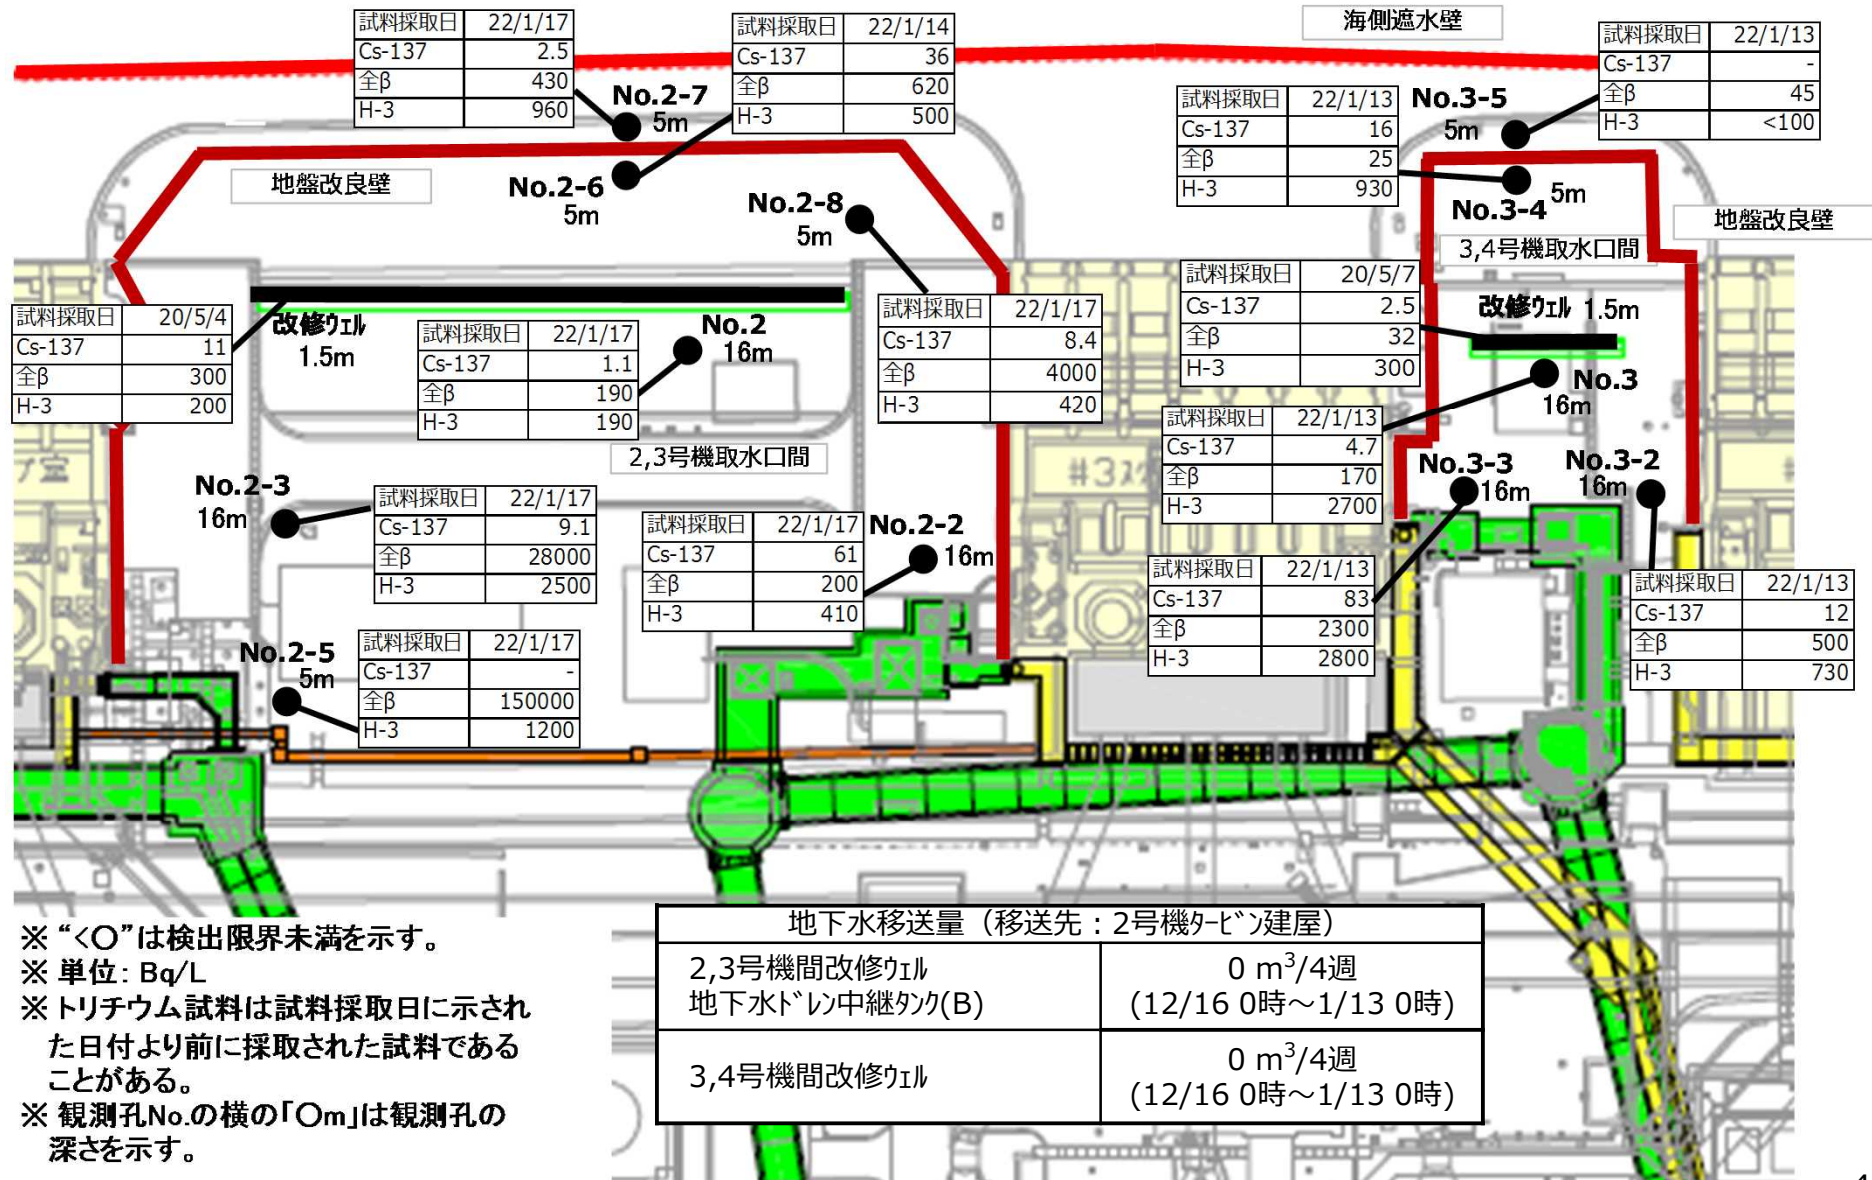

- ※ “<O”は検出限界未滿を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

### <1号機取水口北側エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、全体としては横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全ベータ濃度は、2020.4以降に一時的な上昇が見られ、No.0-3-2など上下動が見られる観測孔もあるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。

### <1,2号機取水口間エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、No.1-17など上下動が見られる観測孔もあるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、No.1-6で上昇傾向が見られるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。

### <2,3号機取水口間エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、No.2-2、2-5で上昇傾向が見られるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。

### <3,4号機取水口間エリア>


- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、No.3-3など上下動が見られる観測孔もあるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。



# 1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (1/2)



## 1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (H-3)

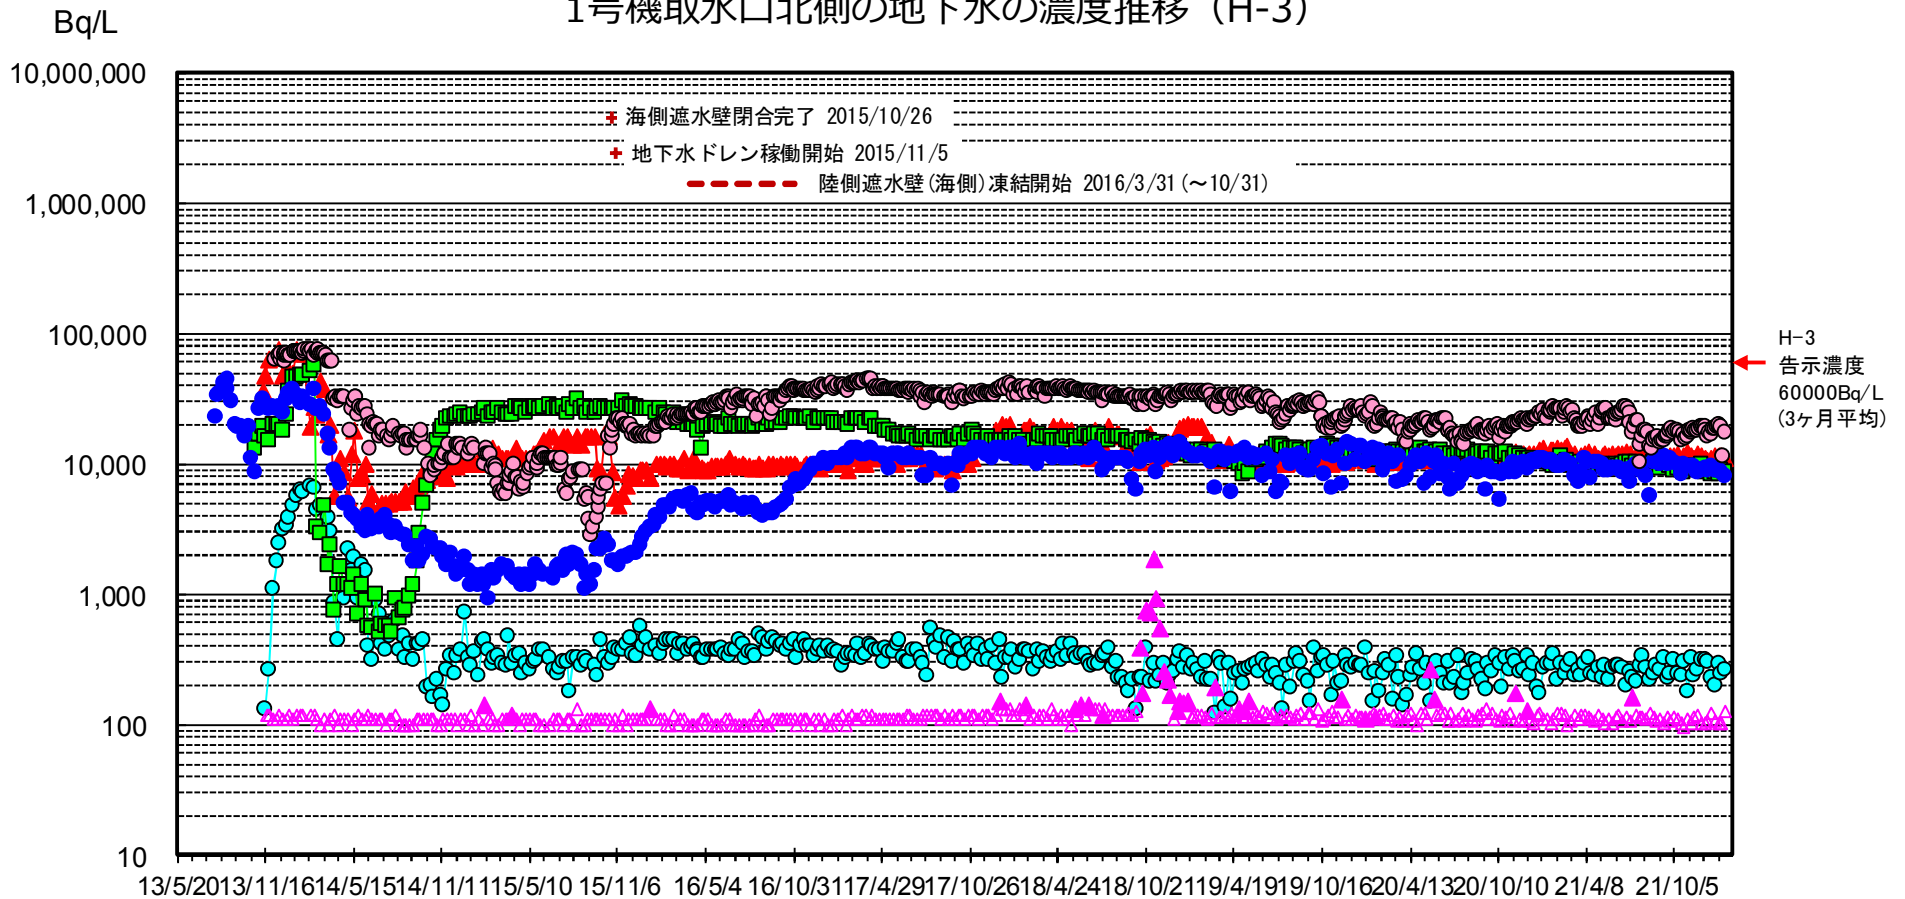


- 地下水No.0-1  
H-3
- ▲ 地下水No.0-1-2  
H-3
- 地下水No.0-2  
H-3
- ▲ 地下水No.0-3-1  
H-3
- △ 地下水No.0-3-1  
H-3ND値
- 地下水No.0-3-2  
H-3
- 地下水No.0-4  
H-3

※検出限界値未満の場合は△で示す。  
検出限界値は各地点とも同じ。

# 1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (2/2)



## 1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (全β)

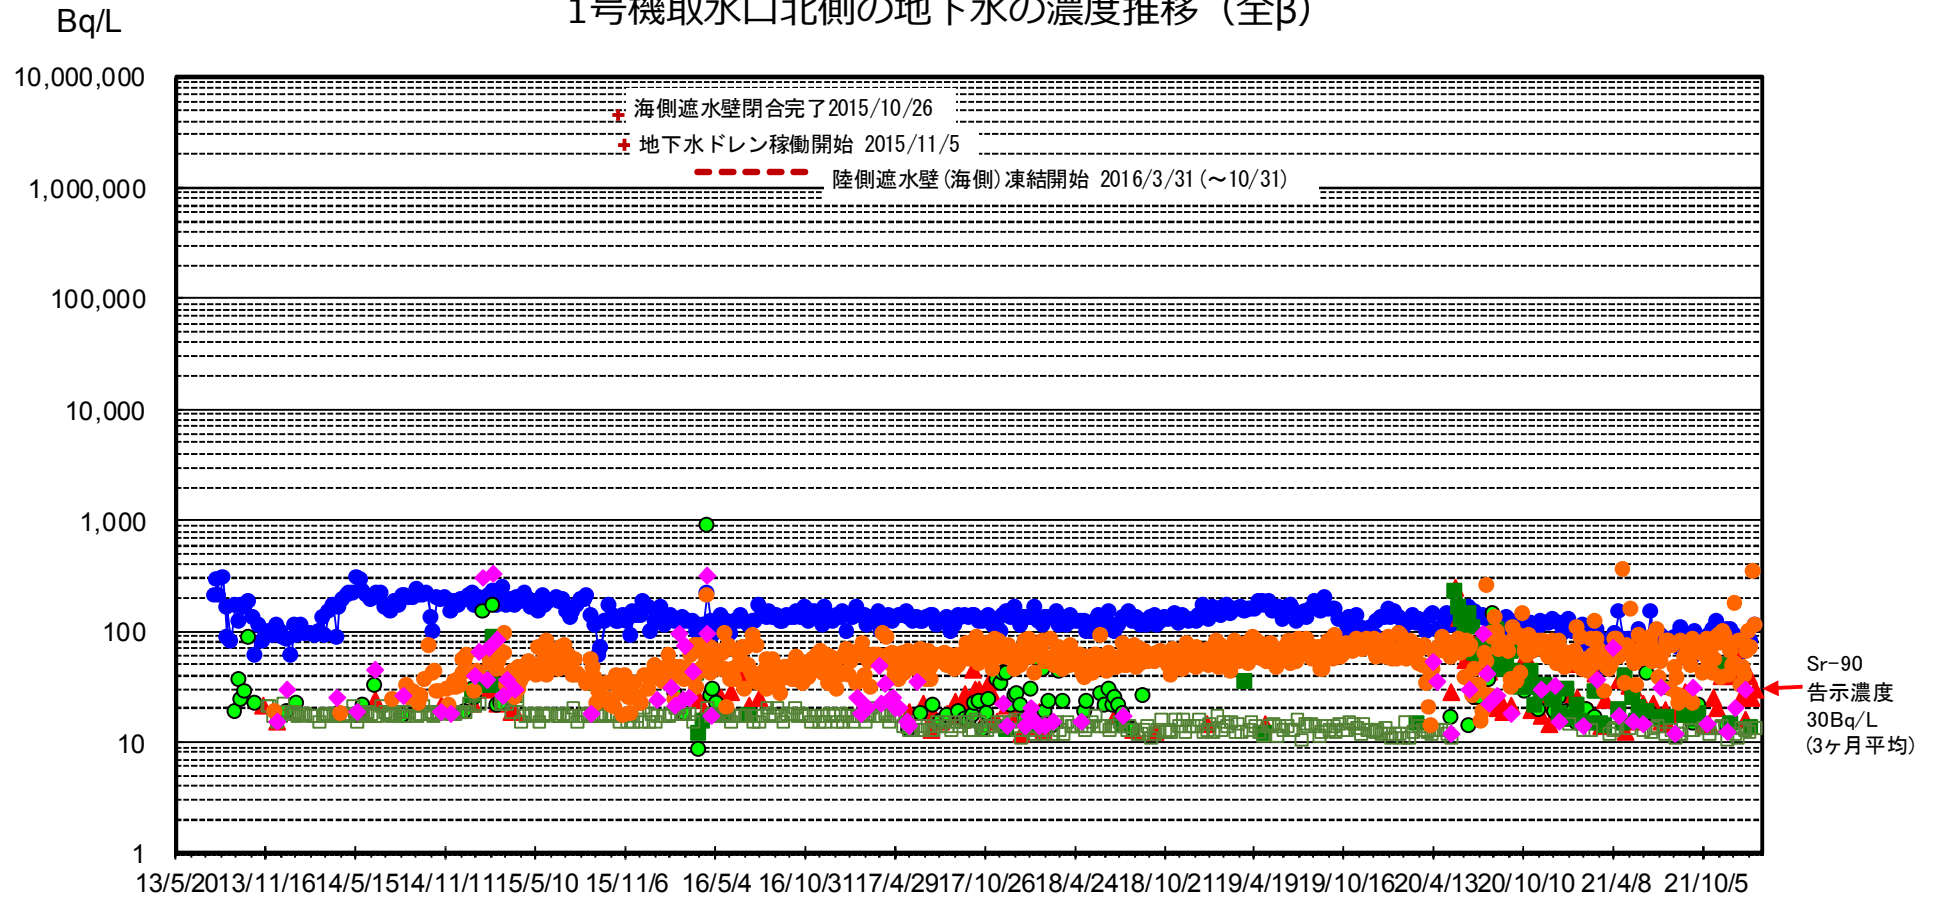


- 地下水No.0-1  
全β
  - ▲ 地下水No.0-1-2  
全β
  - 地下水No.0-2  
全β
  - 地下水No.0-3-1  
全β
  - 地下水No.0-3-1  
全βNND値
  - 地下水No.0-3-2  
全β
  - ◆ 地下水No.0-4  
全β
- ※検出限界値未満の場合は口で示す。  
 検出限界値は各地点とも同じ。

# 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



## 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

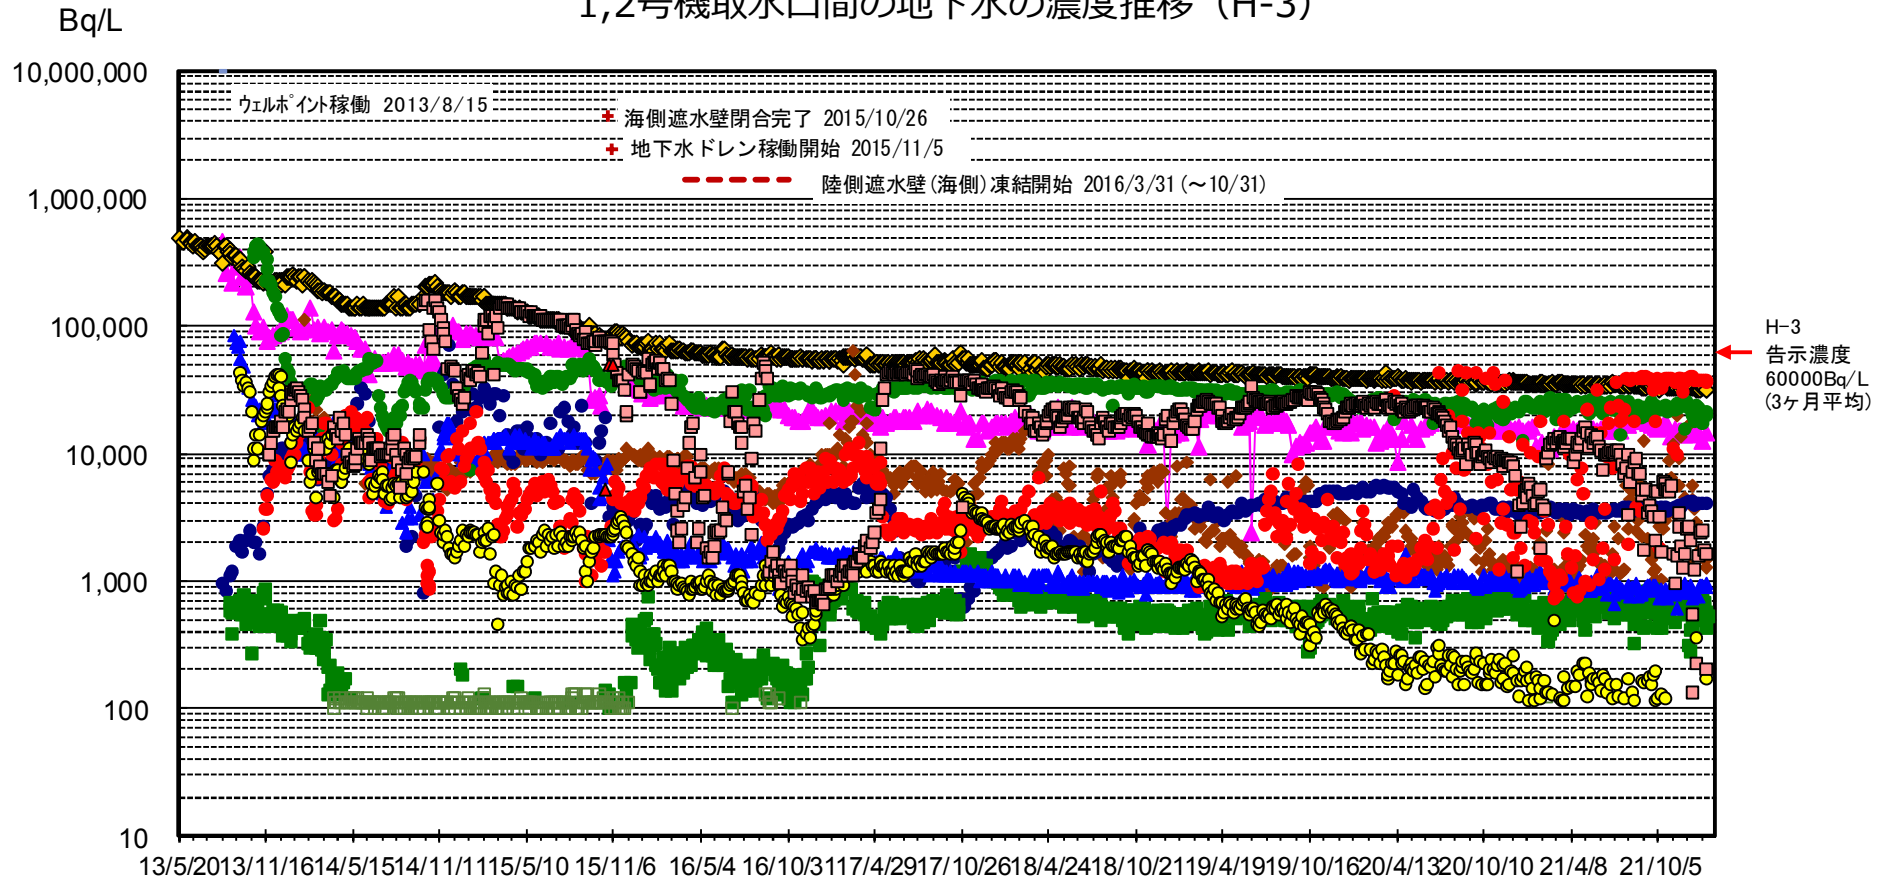


- ◆ 地下水No.1  
H-3
- ◇ 地下水No.1-6  
H-3
- 地下水No.1-8  
H-3
- 地下水No.1-9  
H-3
- 地下水No.1-9  
H-3ND値
- ▲ 地下水No.1-11  
H-3
- 地下水No.1-12  
H-3
- 地下水No.1-14  
H-3
- 地下水No.1-16  
H-3
- 地下水No.1-17  
H-3
- ▲ 1,2uウエルポイント  
H-3
- ▲ 1,2u改修ウエル  
H-3

※検出限界値未満の場合は口で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

# 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)

## 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)

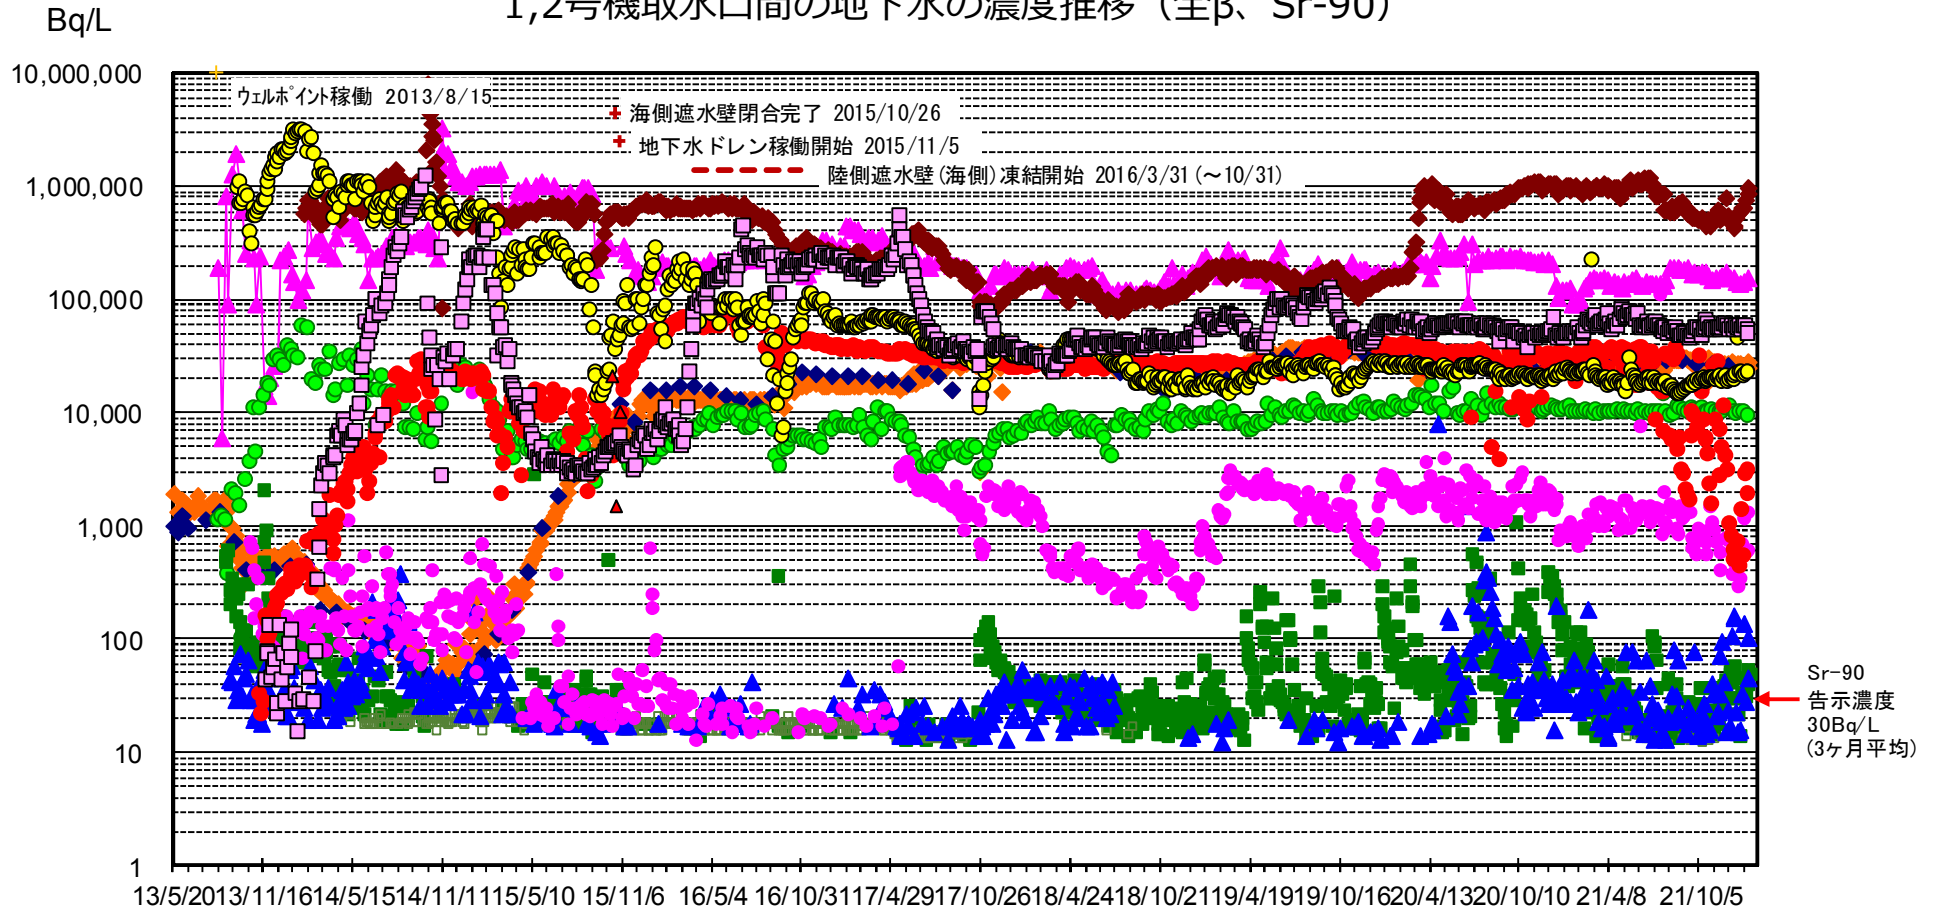


- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- 地下水No.1-9 全βND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-16 全β
- 地下水No.1-17 全β
- ▲ 1,2uウエル<sup>レ</sup>イント 全β
- ▲ 1,2u改修ウエル 全β

※検出限界値未満の場合は口で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

# 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)




## 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

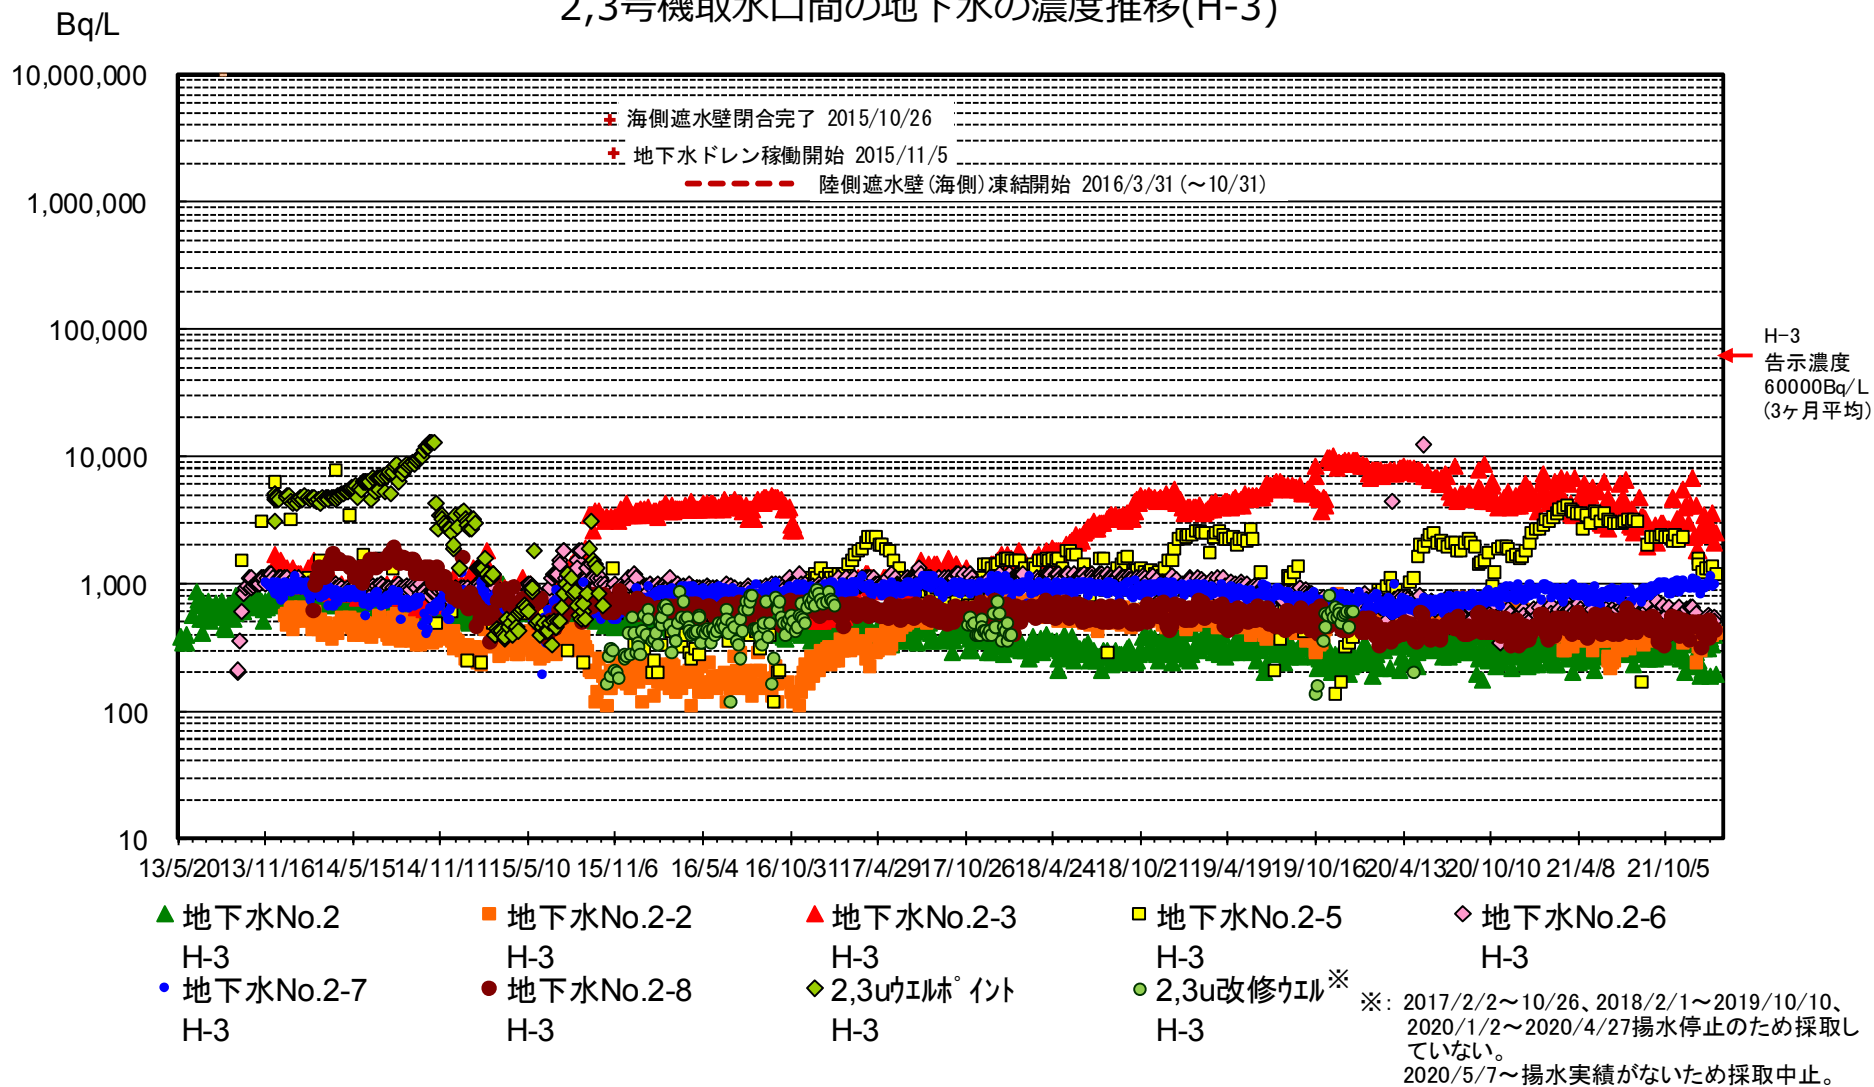



# 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)

## 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

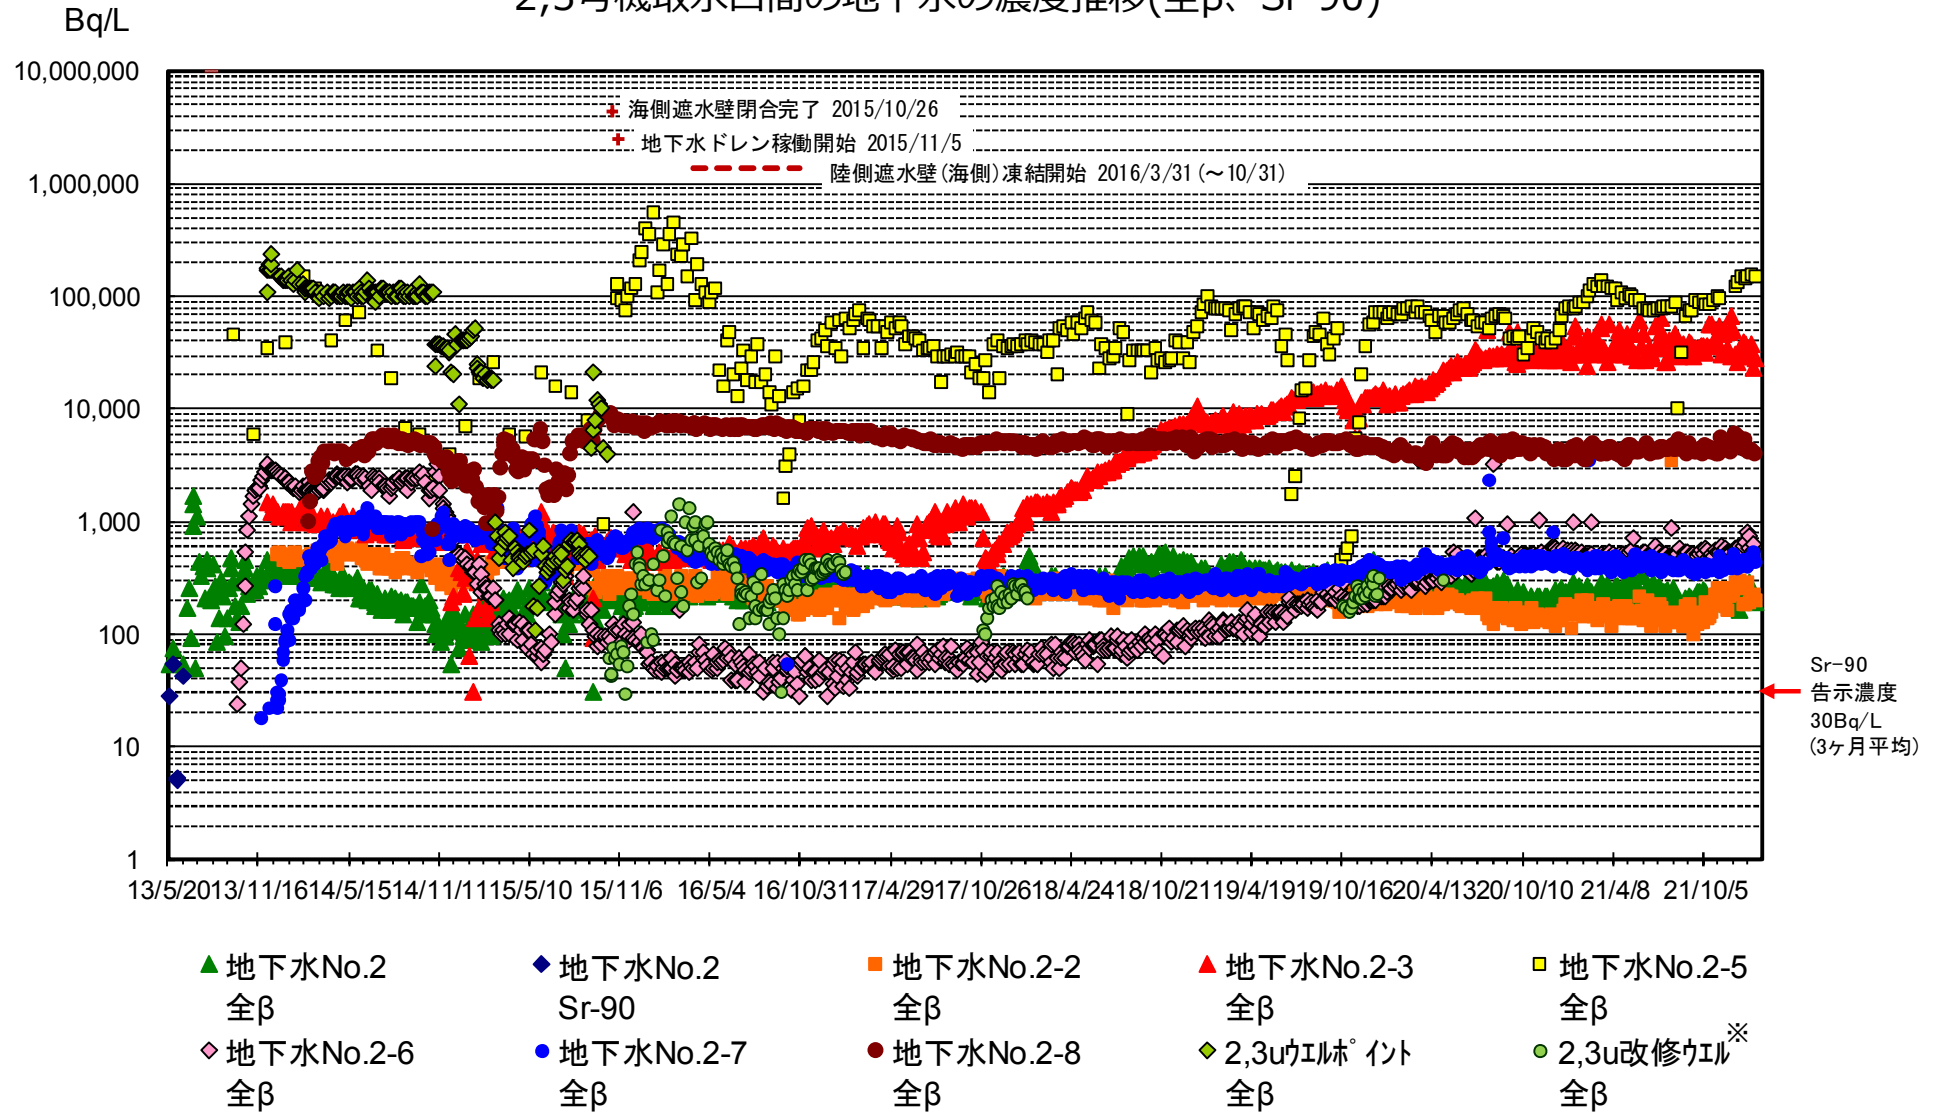


※: 2017/2/2~10/26、2018/2/1~2019/10/10、2020/1/2~2020/4/27揚水停止のため採取していない。  
 2020/5/7~揚水実績がないため採取中止。

# 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



## 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

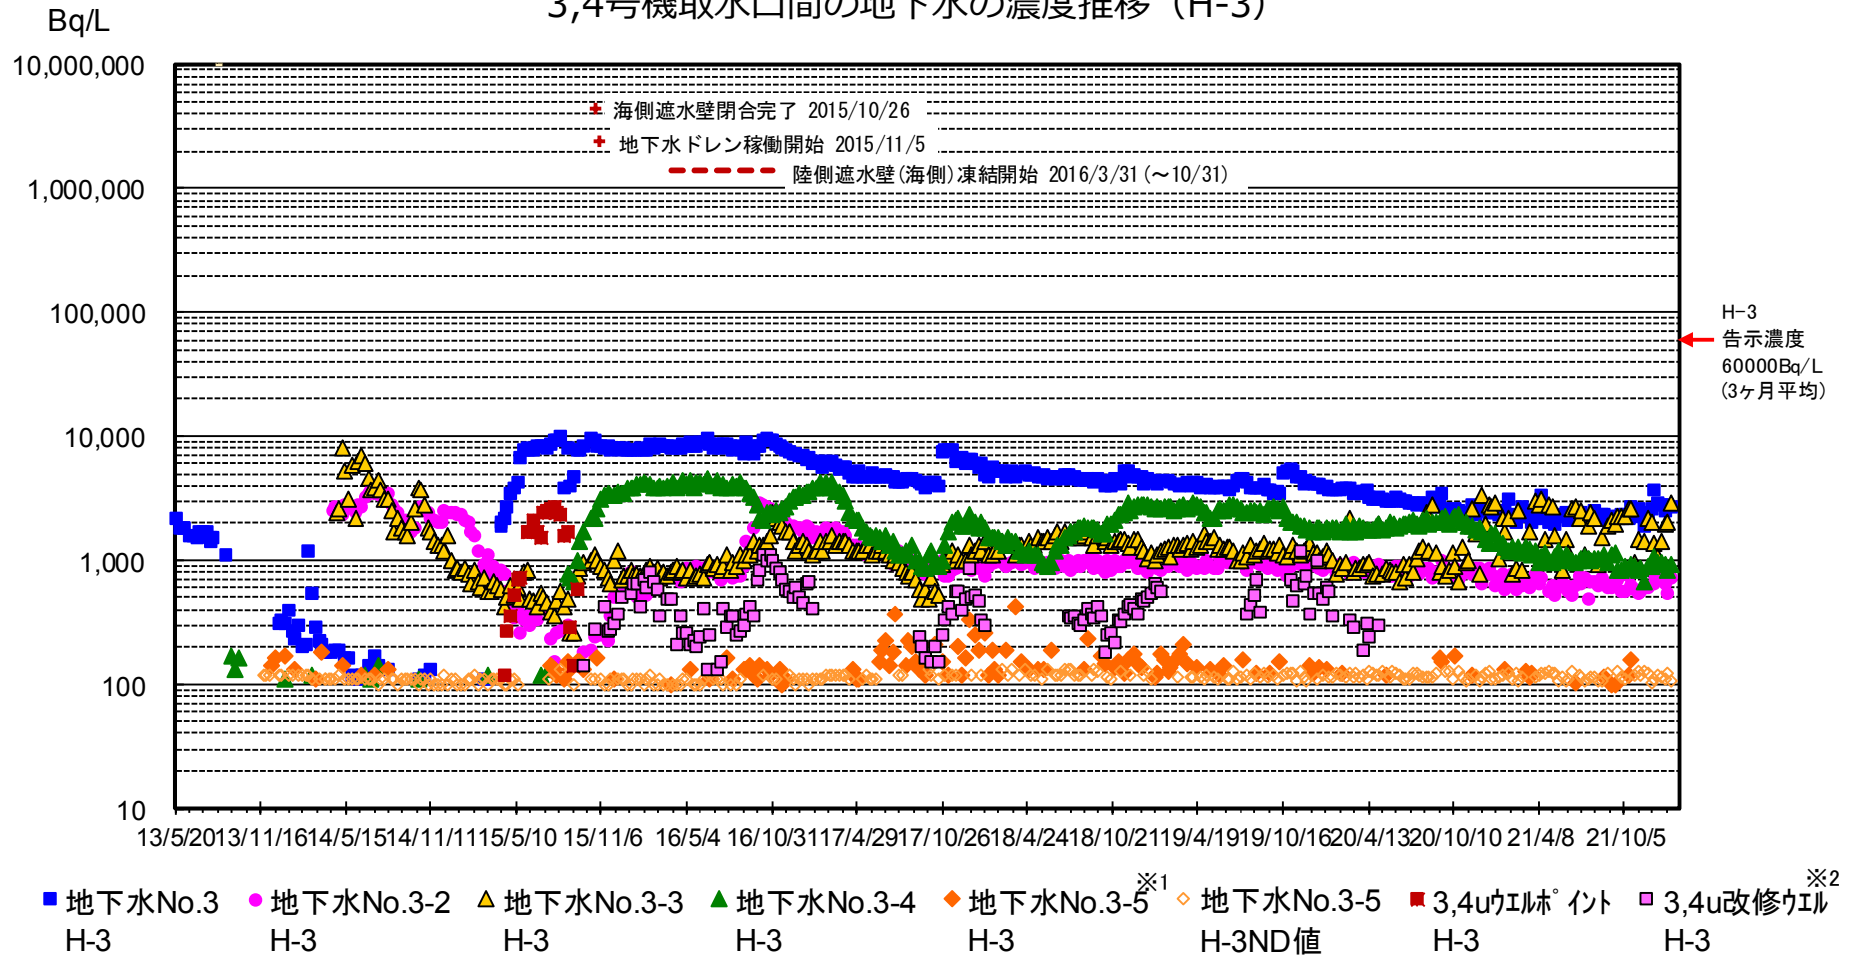

※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。

※2: 2015/10/15, 29, 11/5 水位低下のため採取できず。2018/2/1~2018/7/12, 2019/2/7~2019/7/25, 2019/9/5~10/24, 2020/2/6~2/27, 3/19~3/26揚水停止のため採取していない。2020/5/14~揚水実績がないため採取中止。

# 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



## 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β)

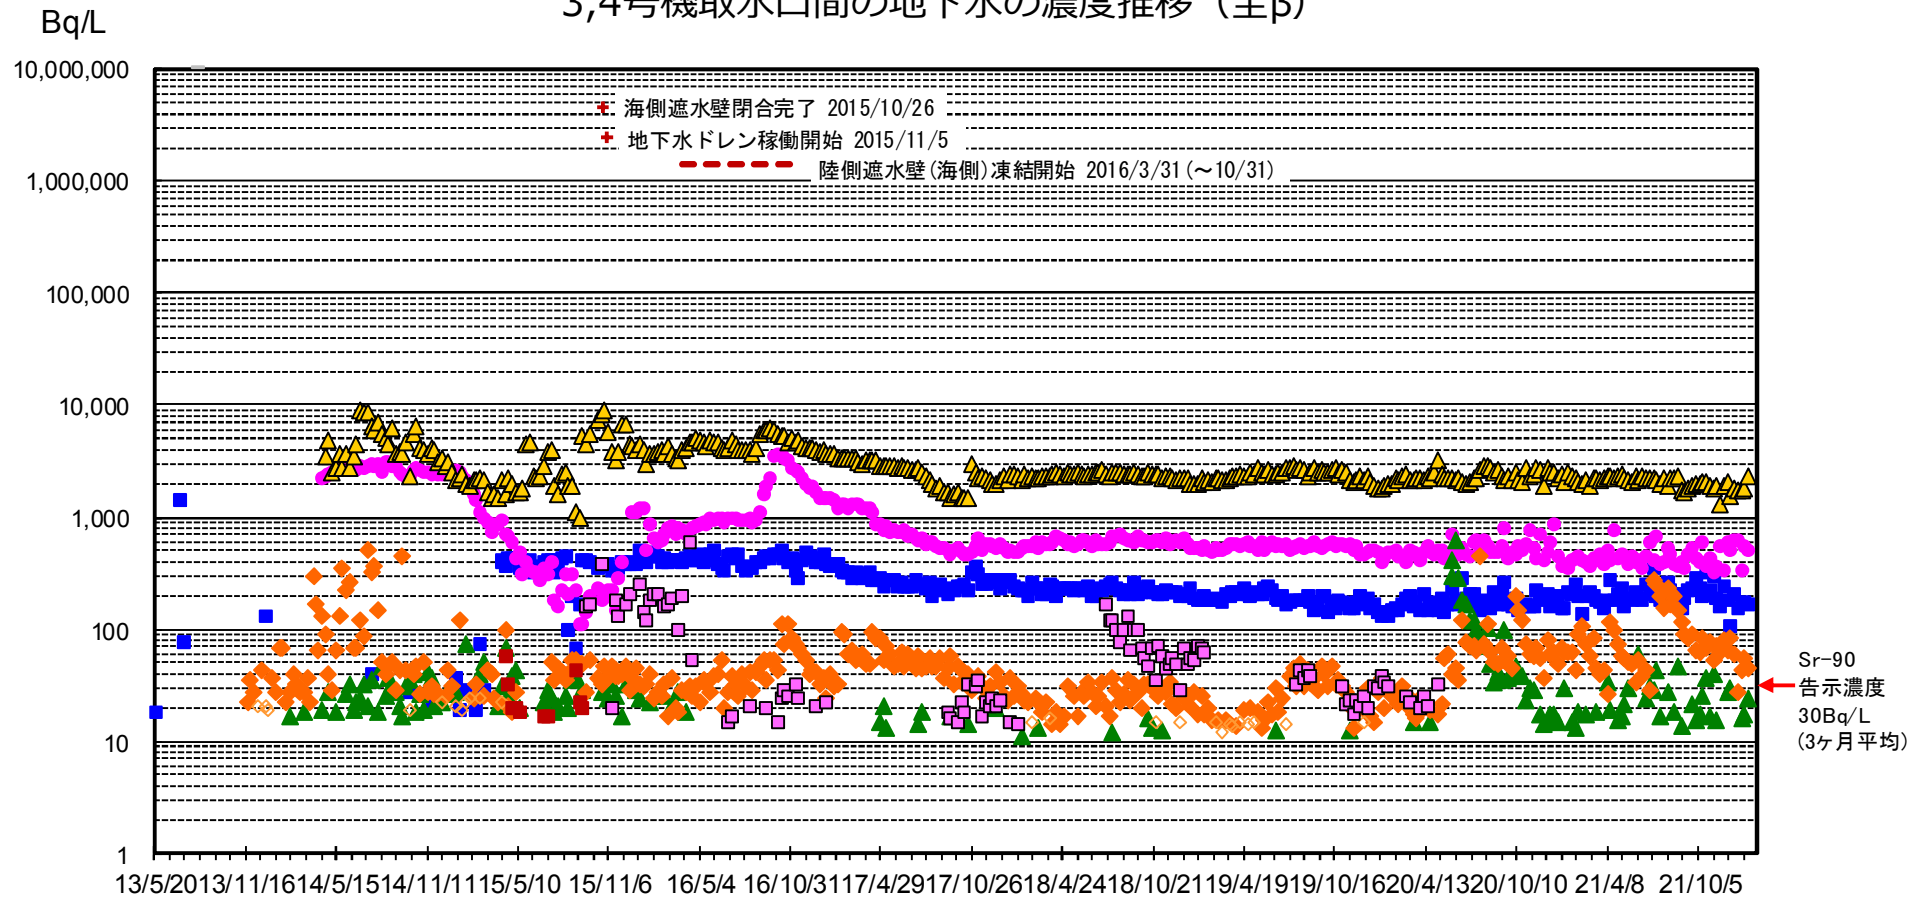

- 地下水No.3 全β
- 地下水No.3-2 全β
- ▲ 地下水No.3-3 全β
- ▲ 地下水No.3-4 全β
- ◆ 地下水No.3-5 全β
- ◇ 地下水No.3-5 全βND値
- 3,4uウエル<sup>※1</sup> イント 全β
- 3,4u改修ウエル<sup>※2</sup> 全β

※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。

※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2018/2/1~2018/7/12, 2019/2/7~2019/7/25, 2019/9/5~10/24, 2020/2/6~2/27,3/19~3/26揚水停止のため採取していない。2020/5/14~揚水実績がないため採取中止。

### <A排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。

### <物揚場排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。

### <K排水路>


- 道路・排水路の土砂回収を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中。
- Cs-137濃度、全β濃度は横ばい傾向にあるが、降雨時に上昇する傾向にある。
- H-3濃度は低下傾向にあったが、2017.9以降横ばい傾向となっている。

### <C排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。



# 排水路の排水の濃度推移 (Cs-137)

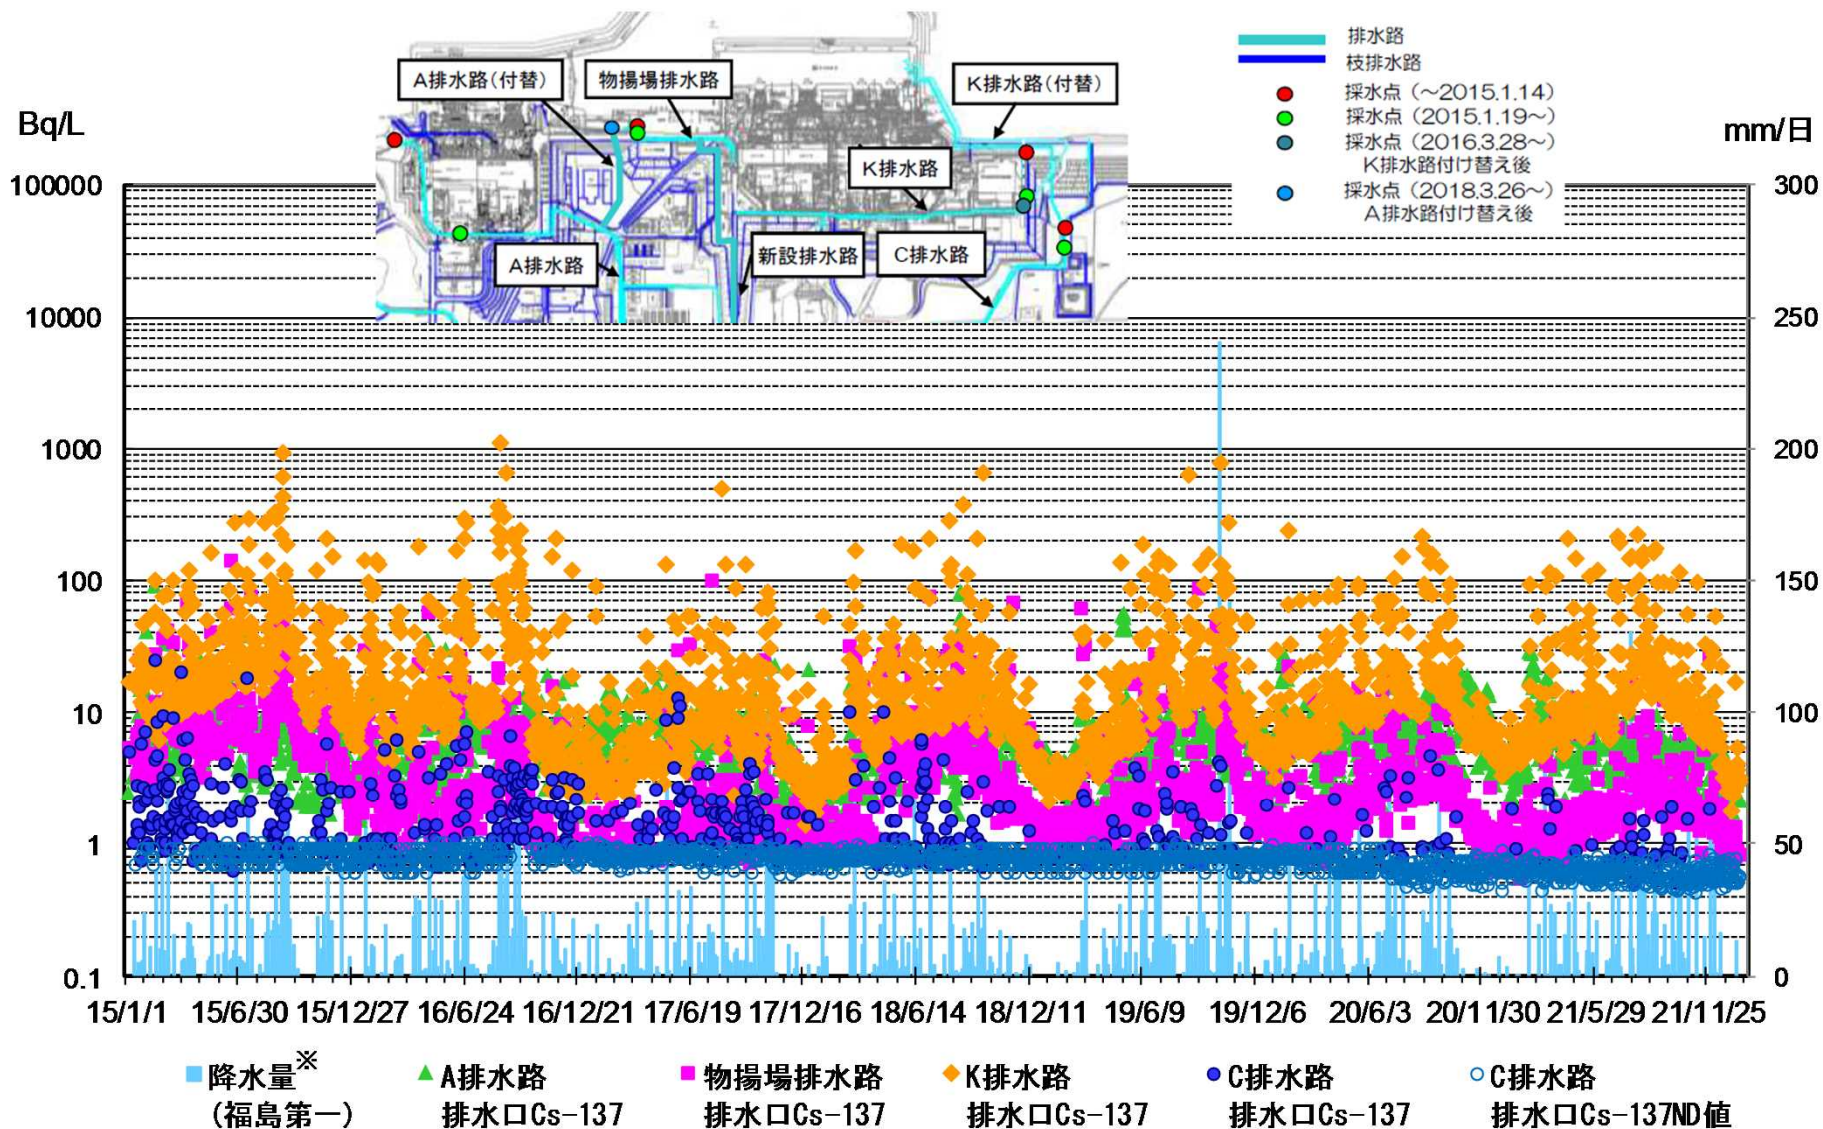


※: 2017/5/13～5/15 欠測につき浪江アダスのデータを使用。

注: 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同等。



# 排水路の排水の濃度推移 (H-3)

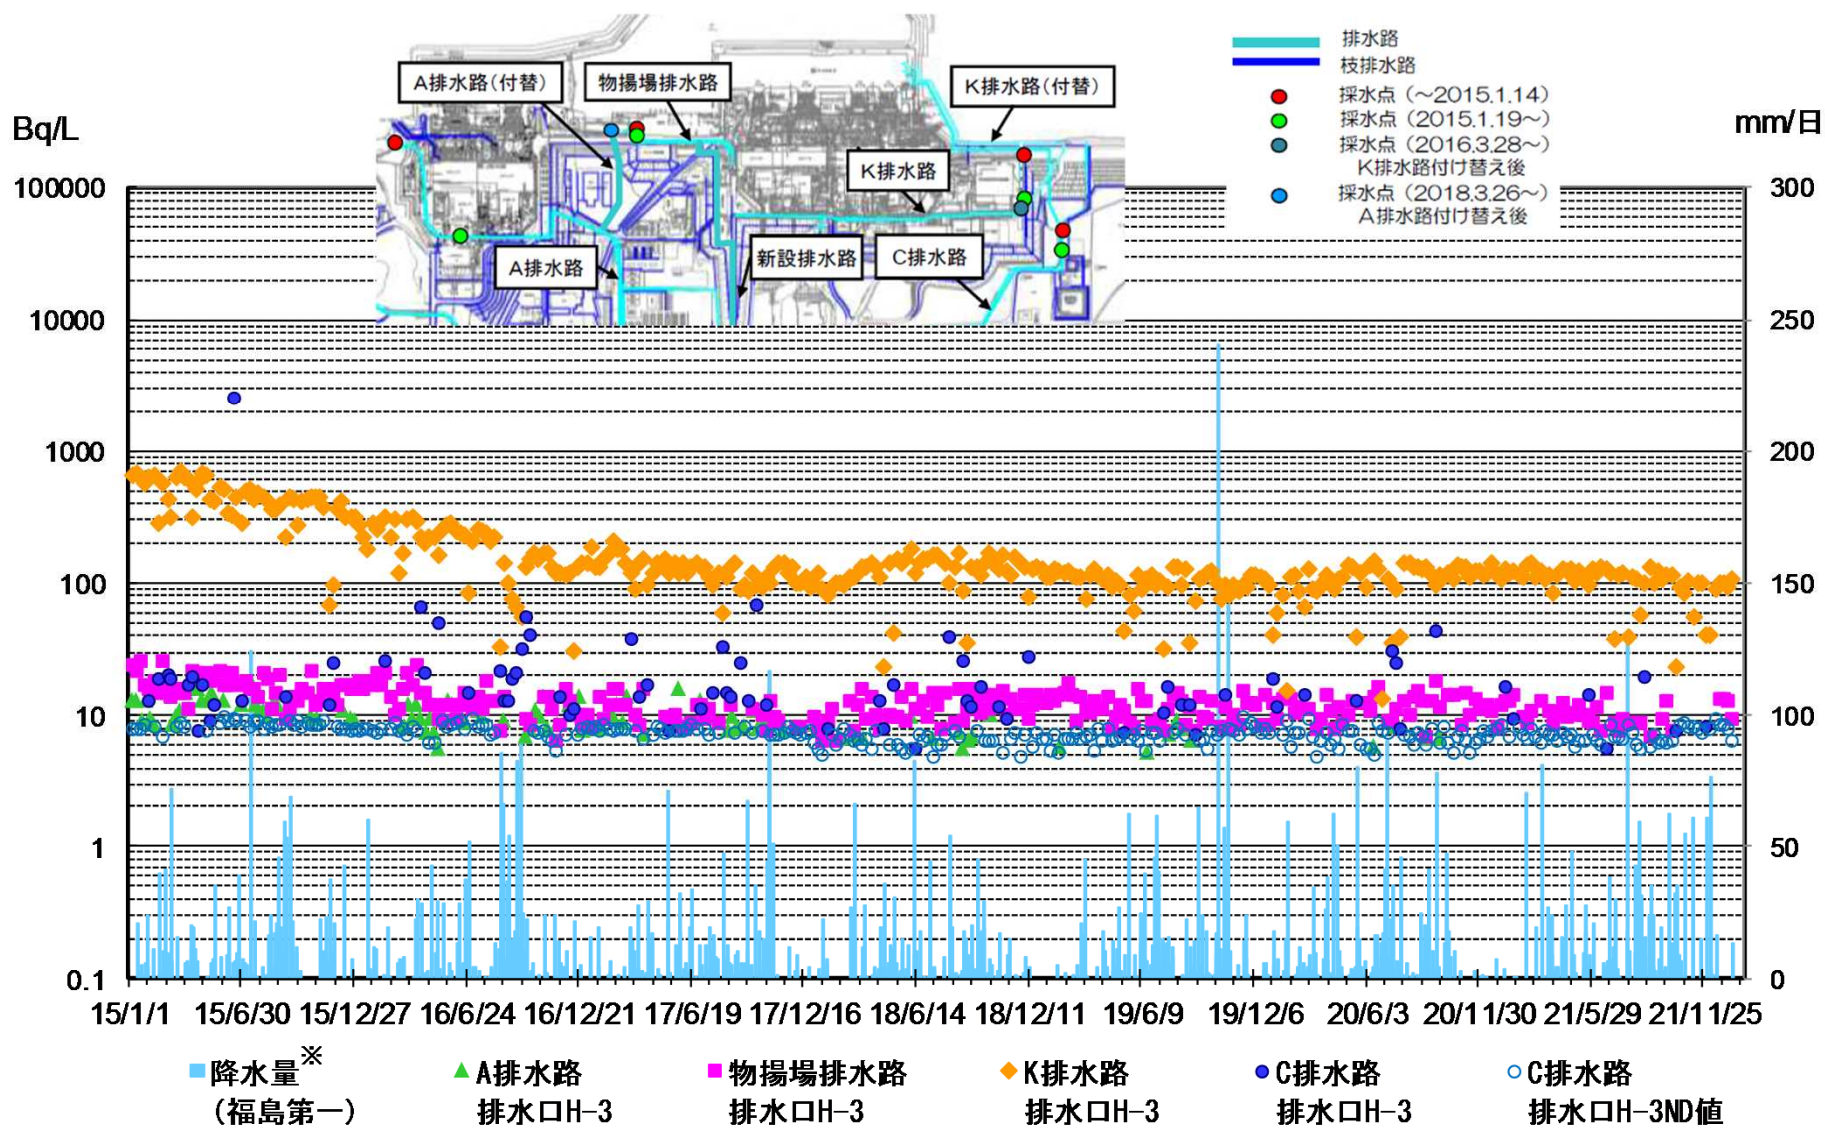


※:2017/5/13~5/15 欠測につき浪江Aダムのデータを使用。


注:検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。



# 排水路の排水の濃度推移 (全β)

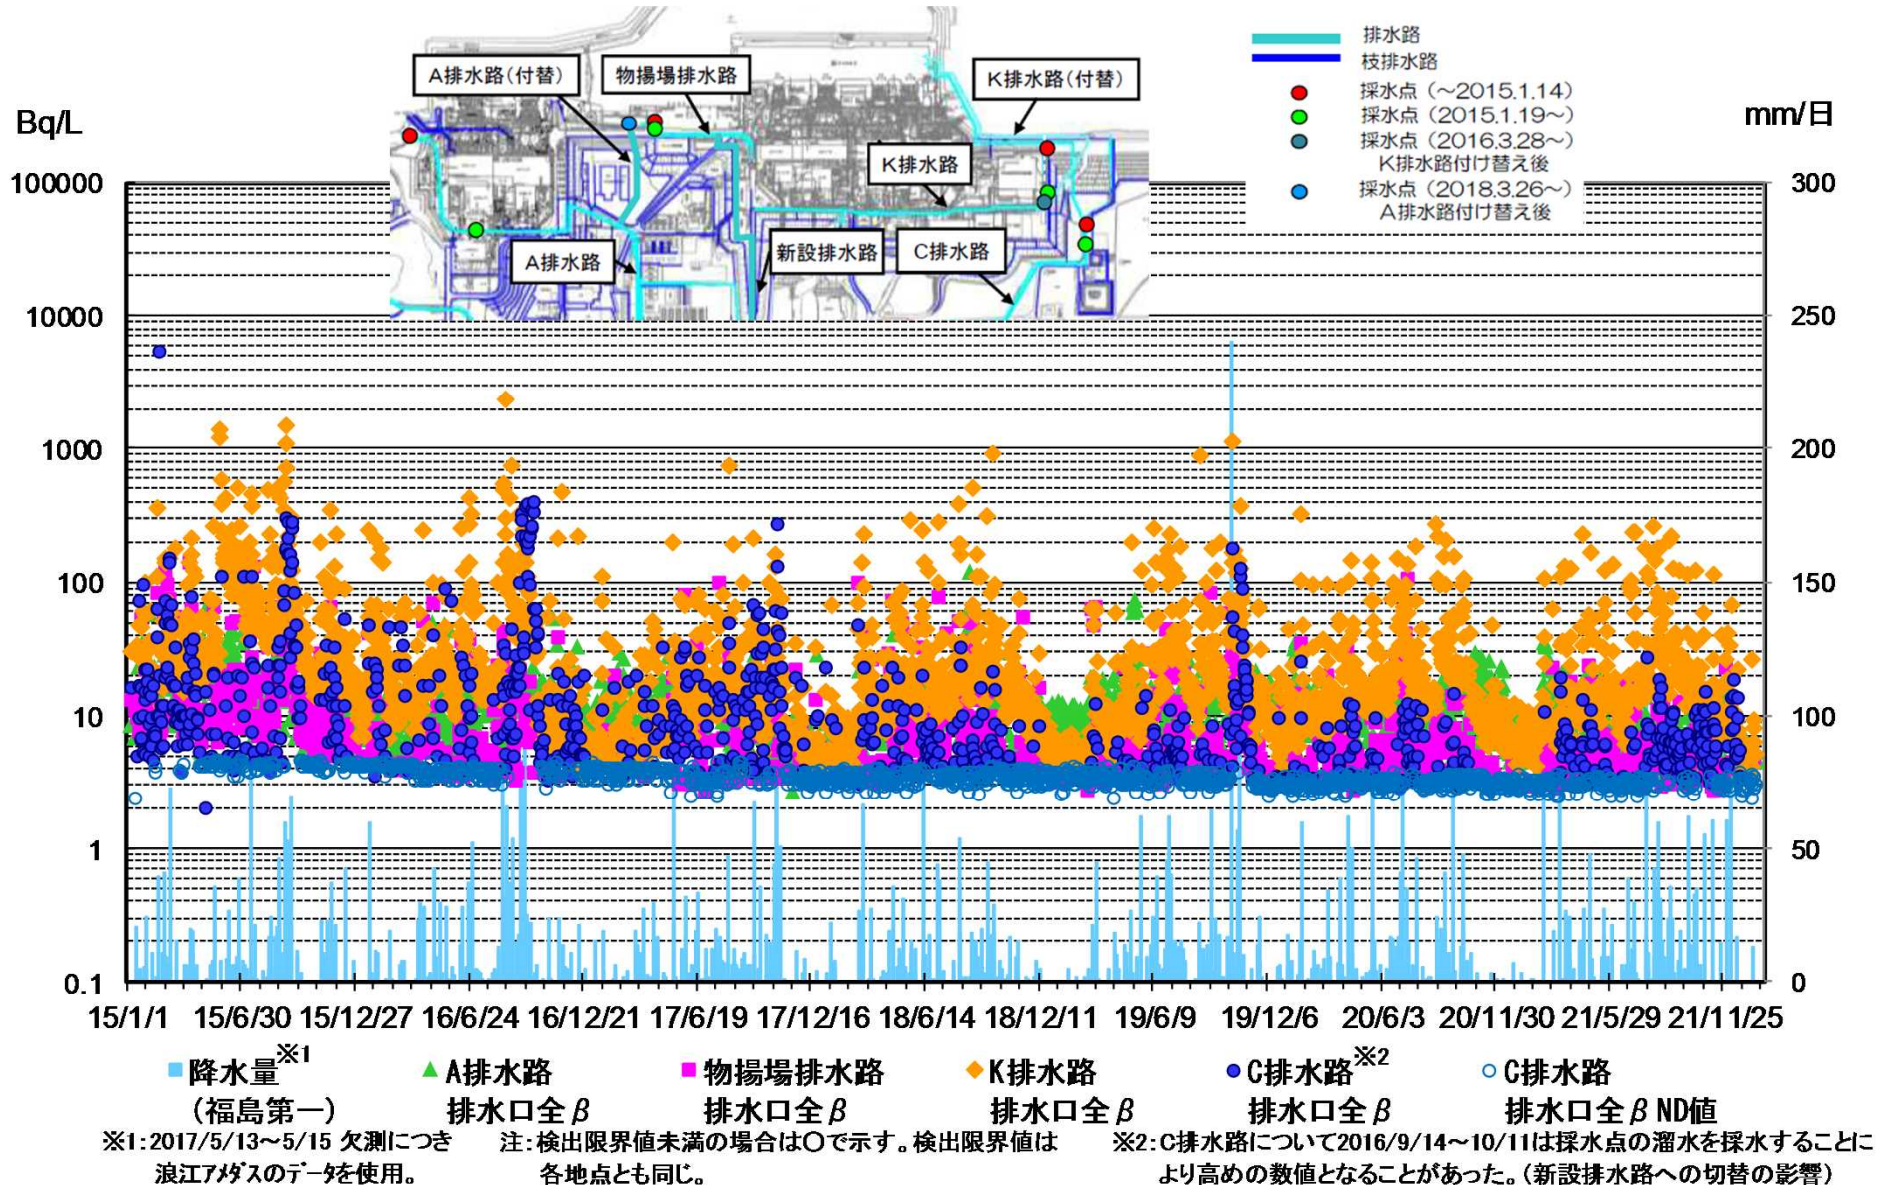

# 港湾内外の海水濃度

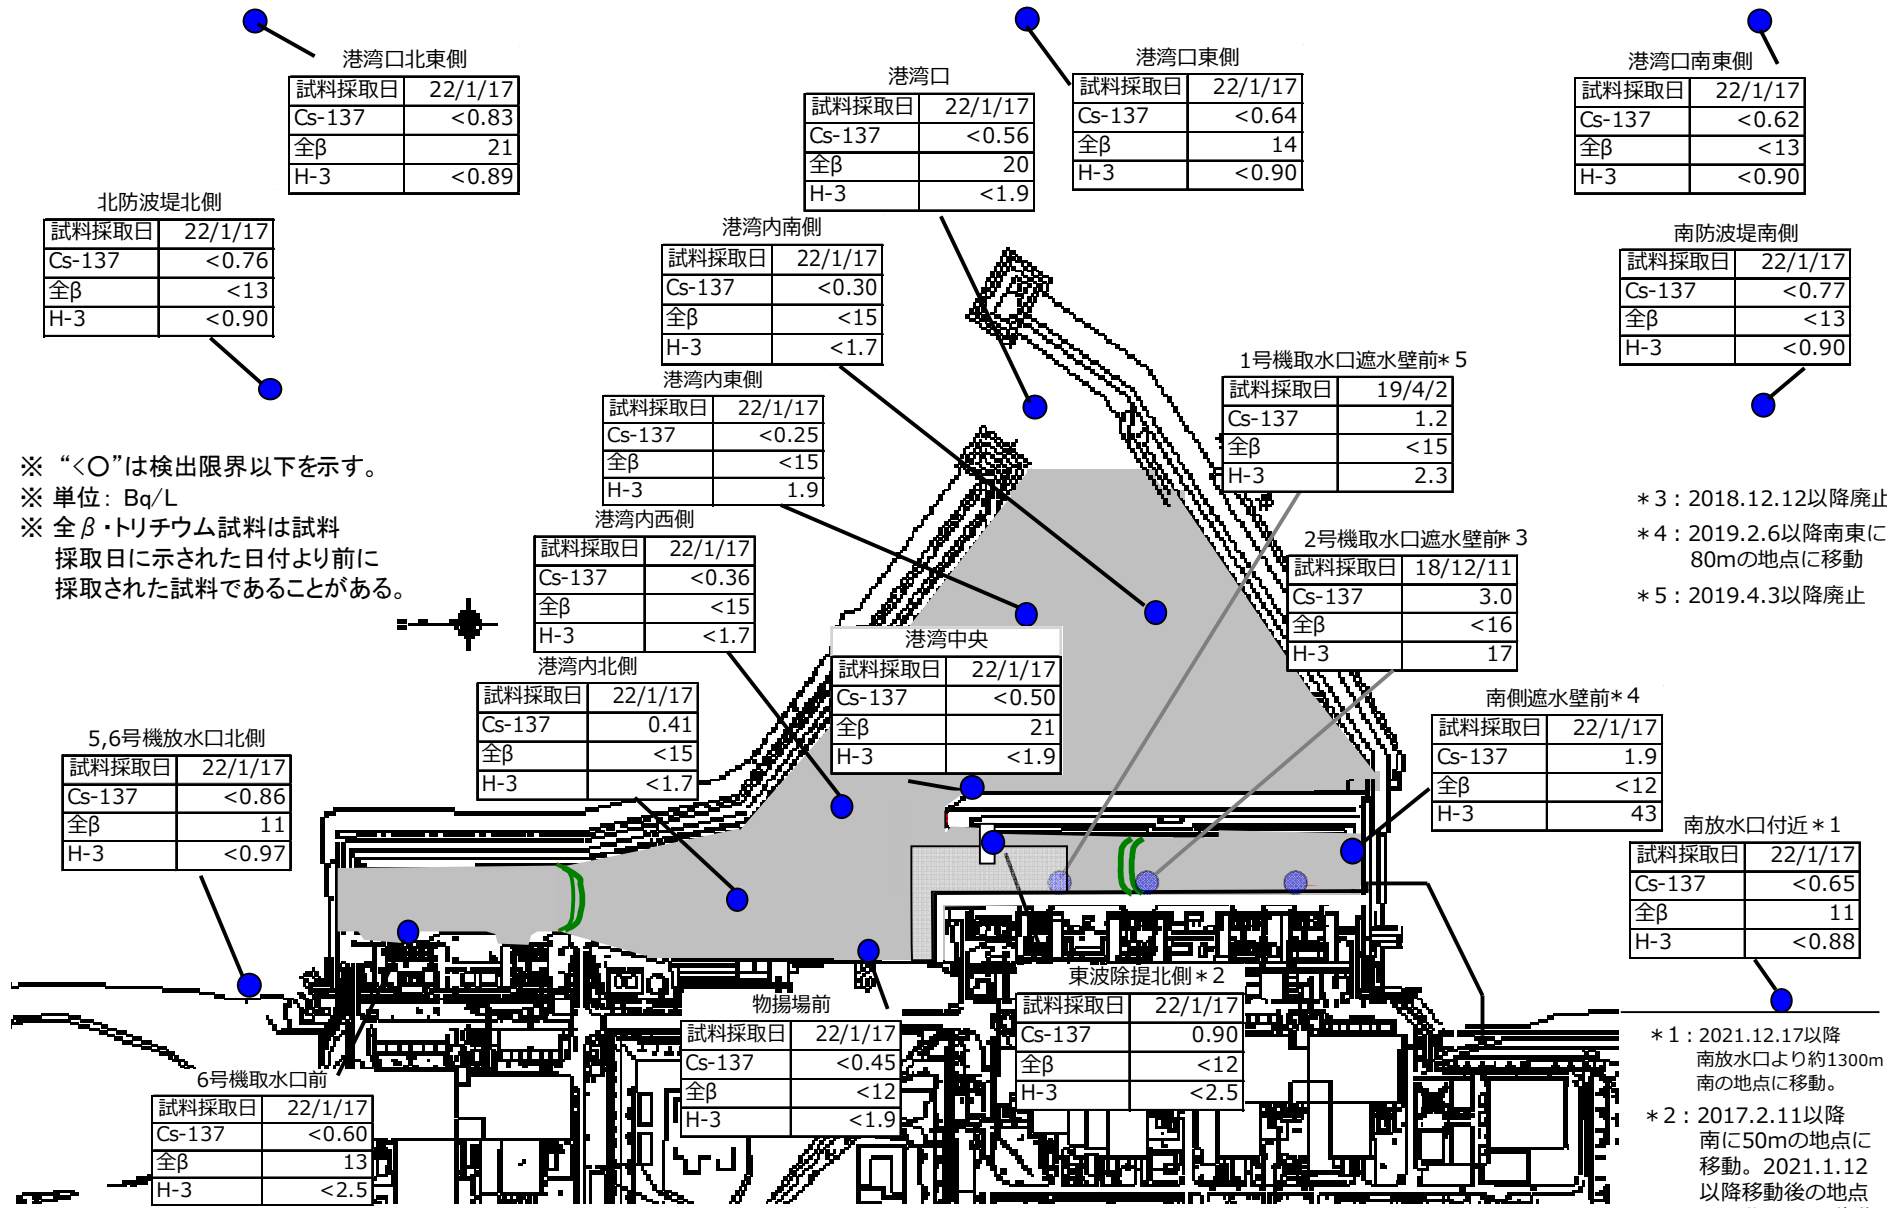

※ “<〇”は検出限界以下を示す。  
 ※ 単位: Bq/L  
 ※ 全β・トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。

\* 3 : 2018.12.12以降廃止  
 \* 4 : 2019.2.6以降南東に80mの地点に移動  
 \* 5 : 2019.4.3以降廃止

\* 1 : 2021.12.17以降南放水口より約1300m南の地点に移動。  
 \* 2 : 2017.2.11以降南に50mの地点に移動。2021.1.12以降移動後の地点から北に25m移動。



### <1～4号機取水路開渠内エリア>

- 告示濃度未満で推移しており、降雨時に一時的なCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られるが、長期的には低下傾向が見られる。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。
- メガフロート関連工事によりシルトフェンスを開渠中央へ移設した2019.3.20以降、Cs-137濃度について、南側遮水壁前が高め、東波除堤北側が低めで推移している。


### <港湾内エリア>

- 告示濃度未満で推移しており、降雨時に一時的なCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られるが、長期的には低下傾向が見られる。
- 1～4号機取水路開渠内エリアより低いレベルとなっている。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。

### <港湾外エリア>

- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、Cs-137濃度、Sr-90濃度の低下が見られ、低い濃度で推移している。
- Cs-137濃度は、5, 6号機放水口北側、南放水口付近で気象・海象等の影響により、一時的な上昇が観測される事がある。
- Sr-90濃度は、港湾外（南北放水口）で昨年より変動が見られるが、気象・海象等による影響の可能性など引き続き傾向を監視していく。


# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (1/3)

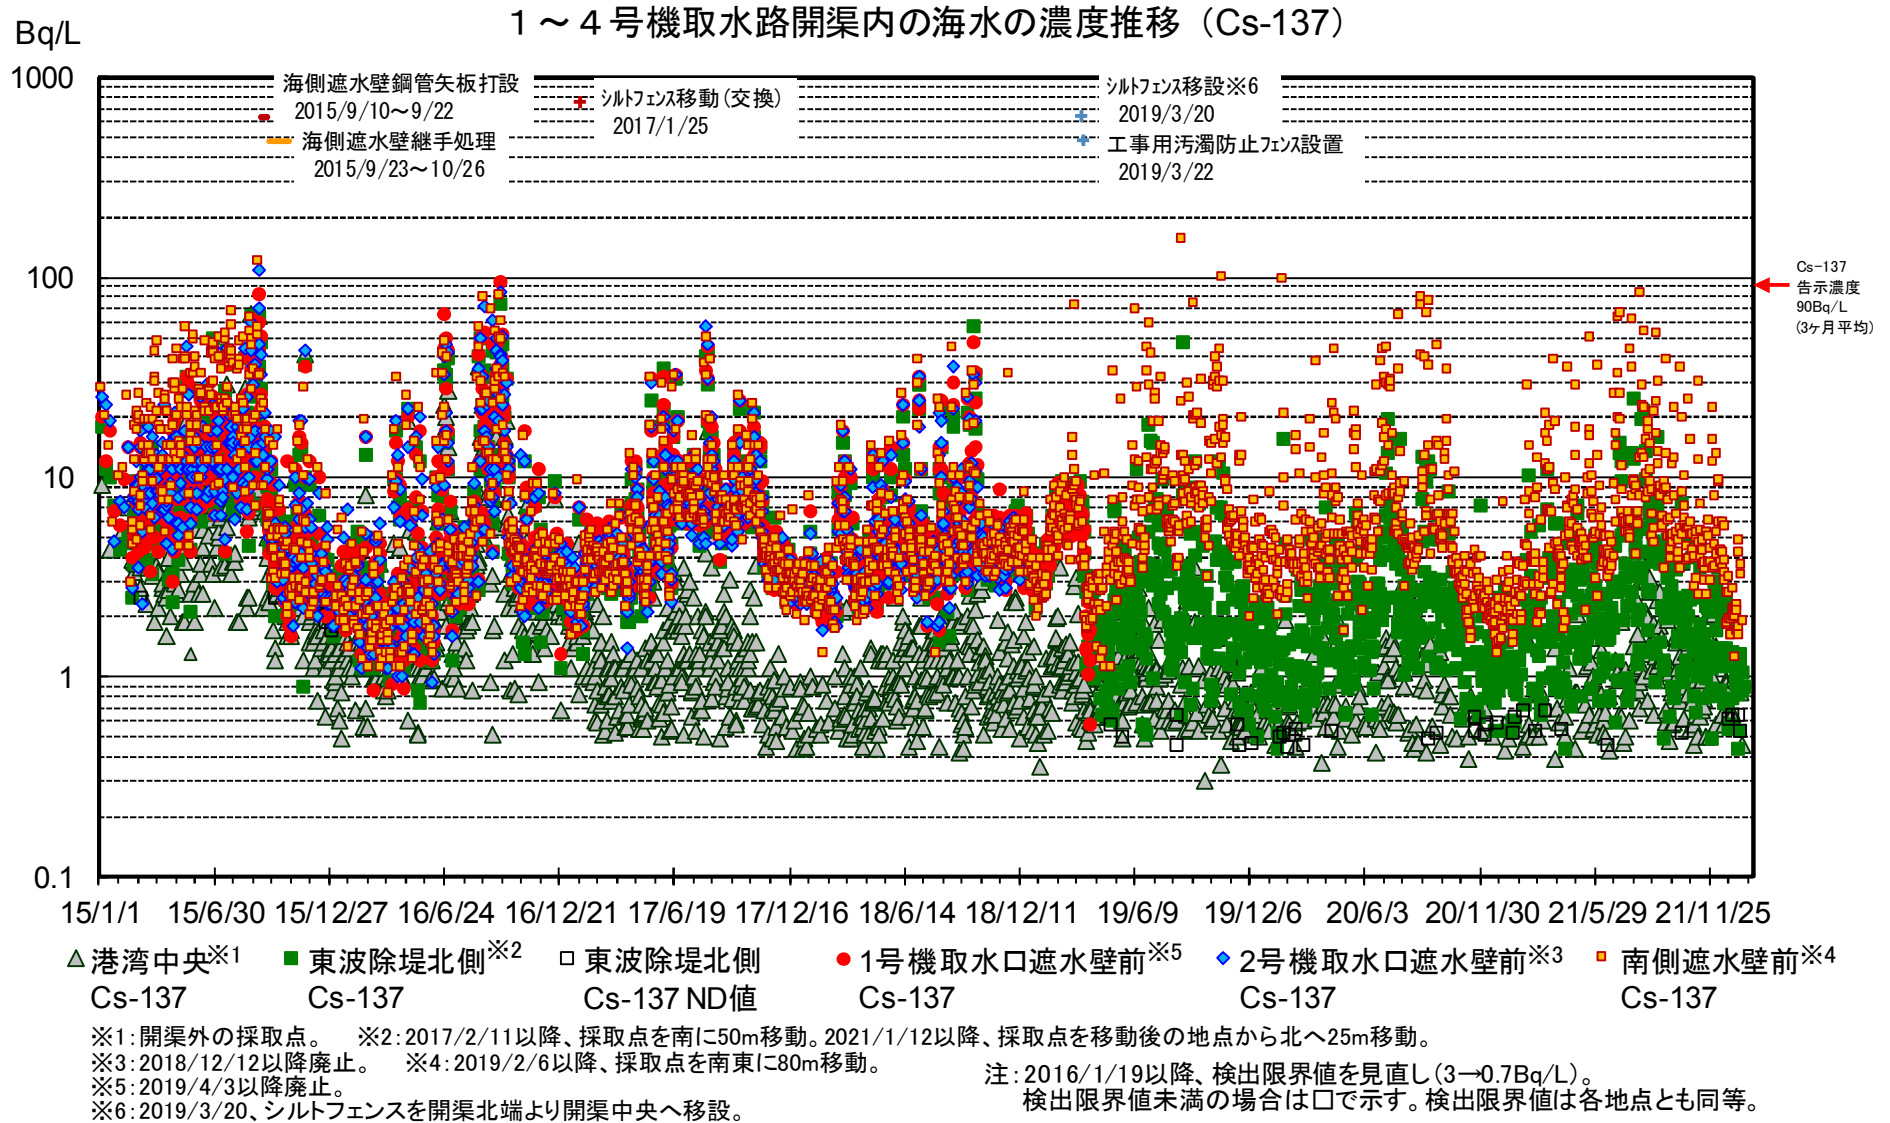


# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (2/3)



## 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (H-3)

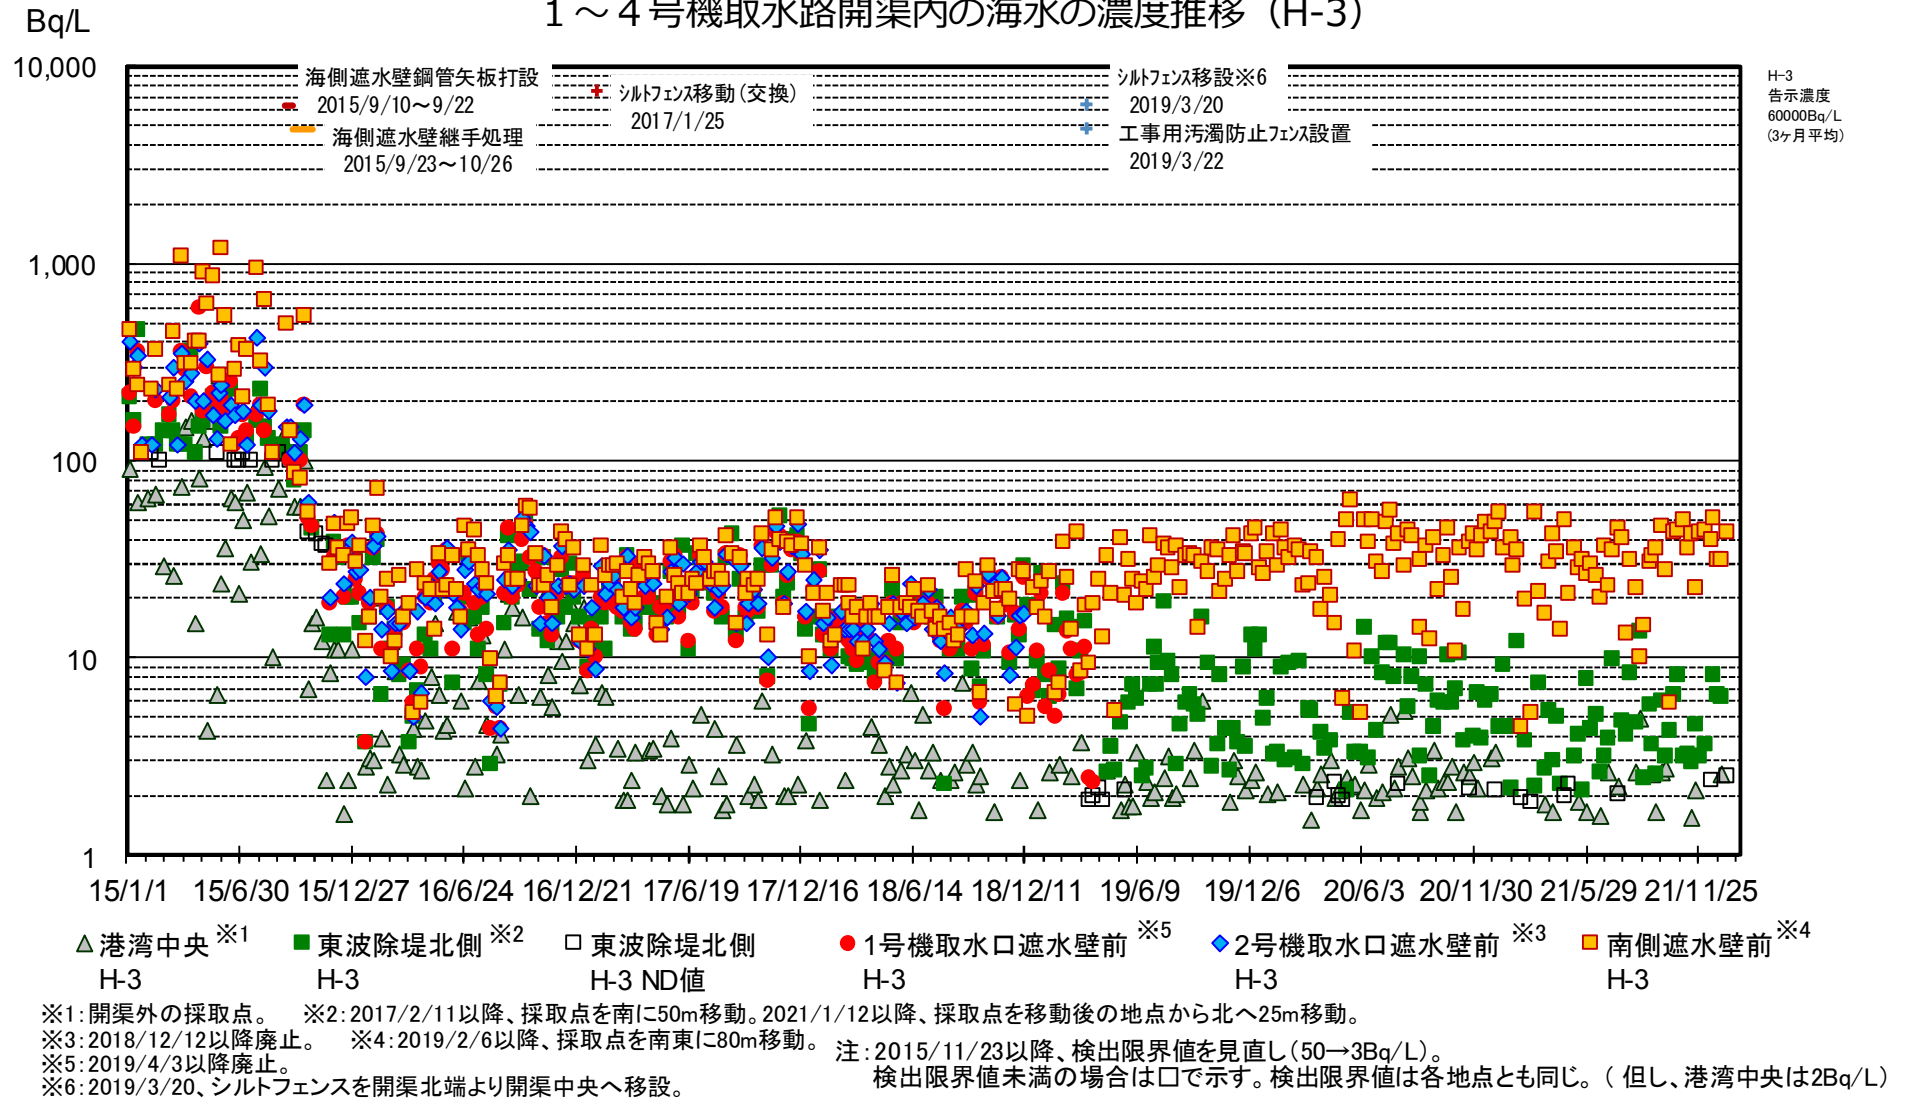


# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (3/3)

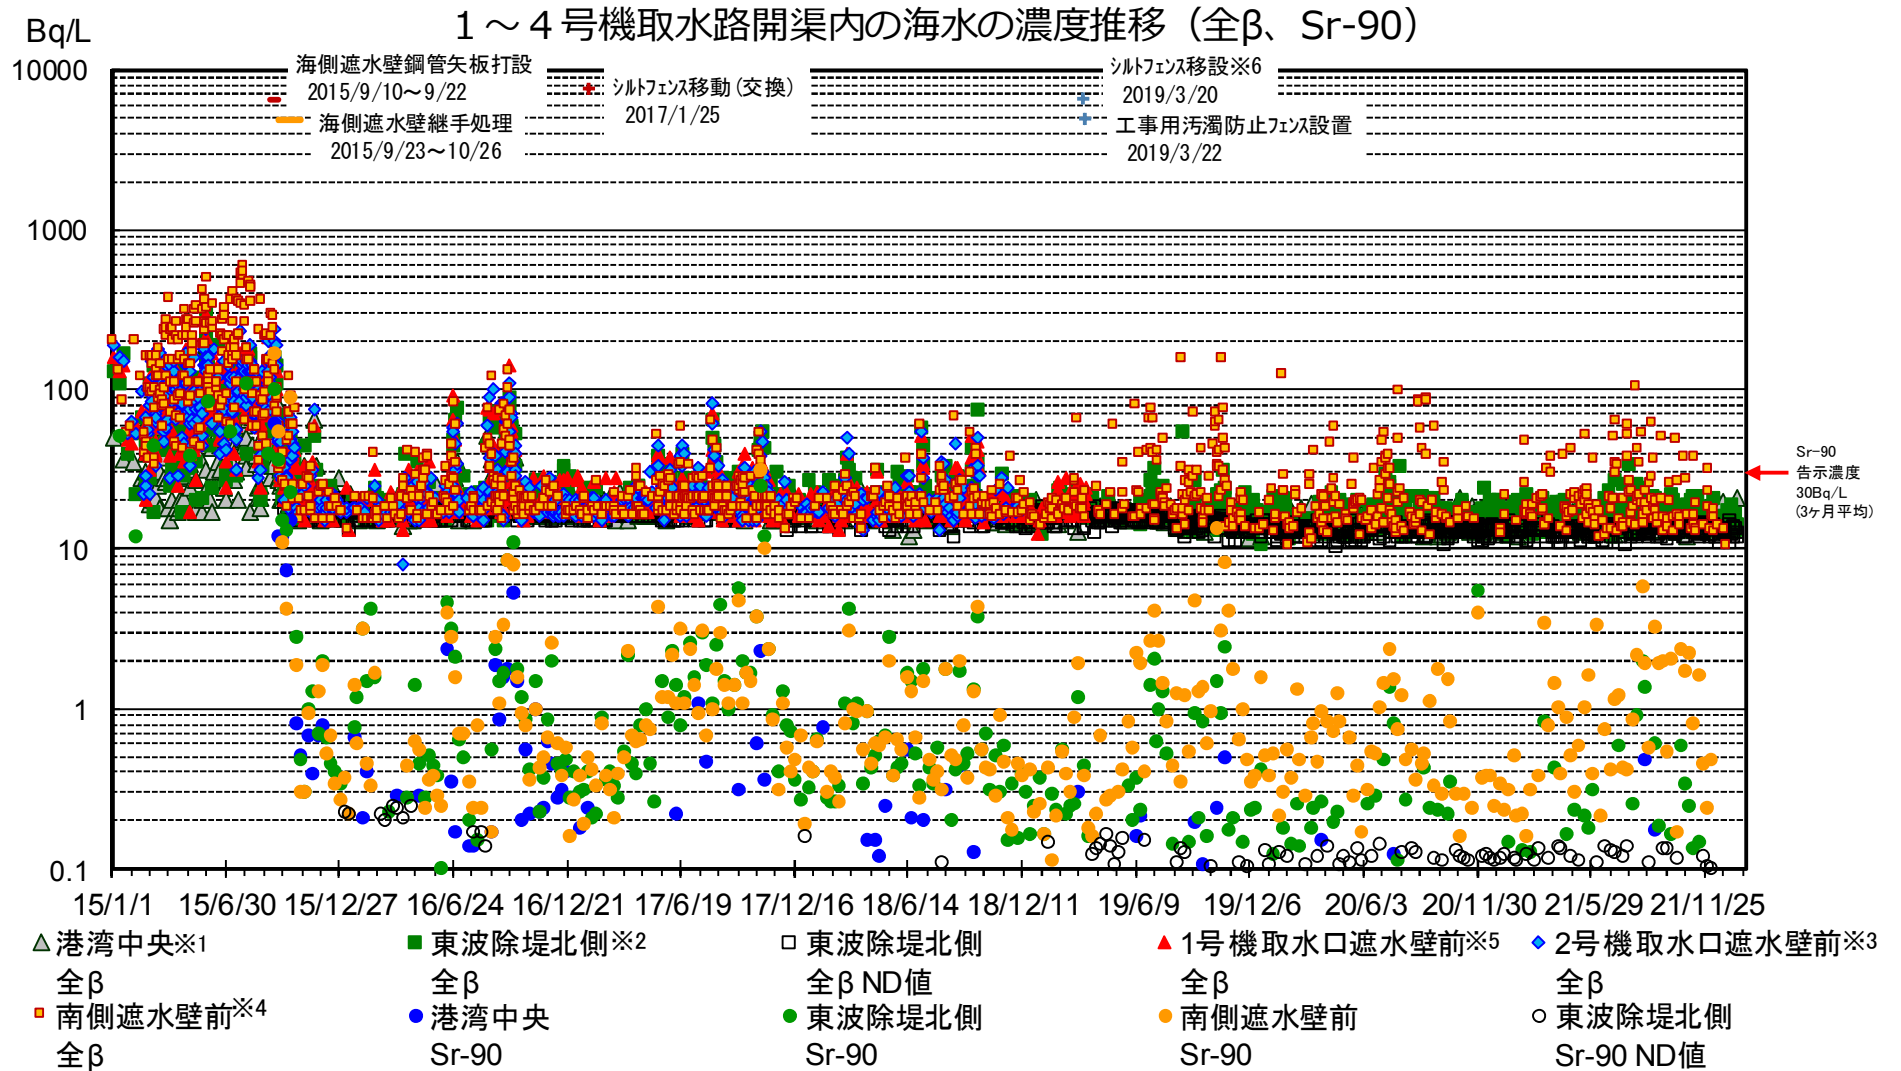


※1: 開渠外の採取点。  
 ※2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動。2021/1/12以降、採取点を移動後の地点から北へ25m移動。  
 ※3: 2018/12/12以降廃止。 ※4: 2019/2/6以降、採取点を南東に80m移動。  
 ※5: 2019/4/3以降廃止。 ※6: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。

注: 全βは天然の放射性物質K-40(10～20Bq/L)を含む。  
 全βについて検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。  
 Sr-90について検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

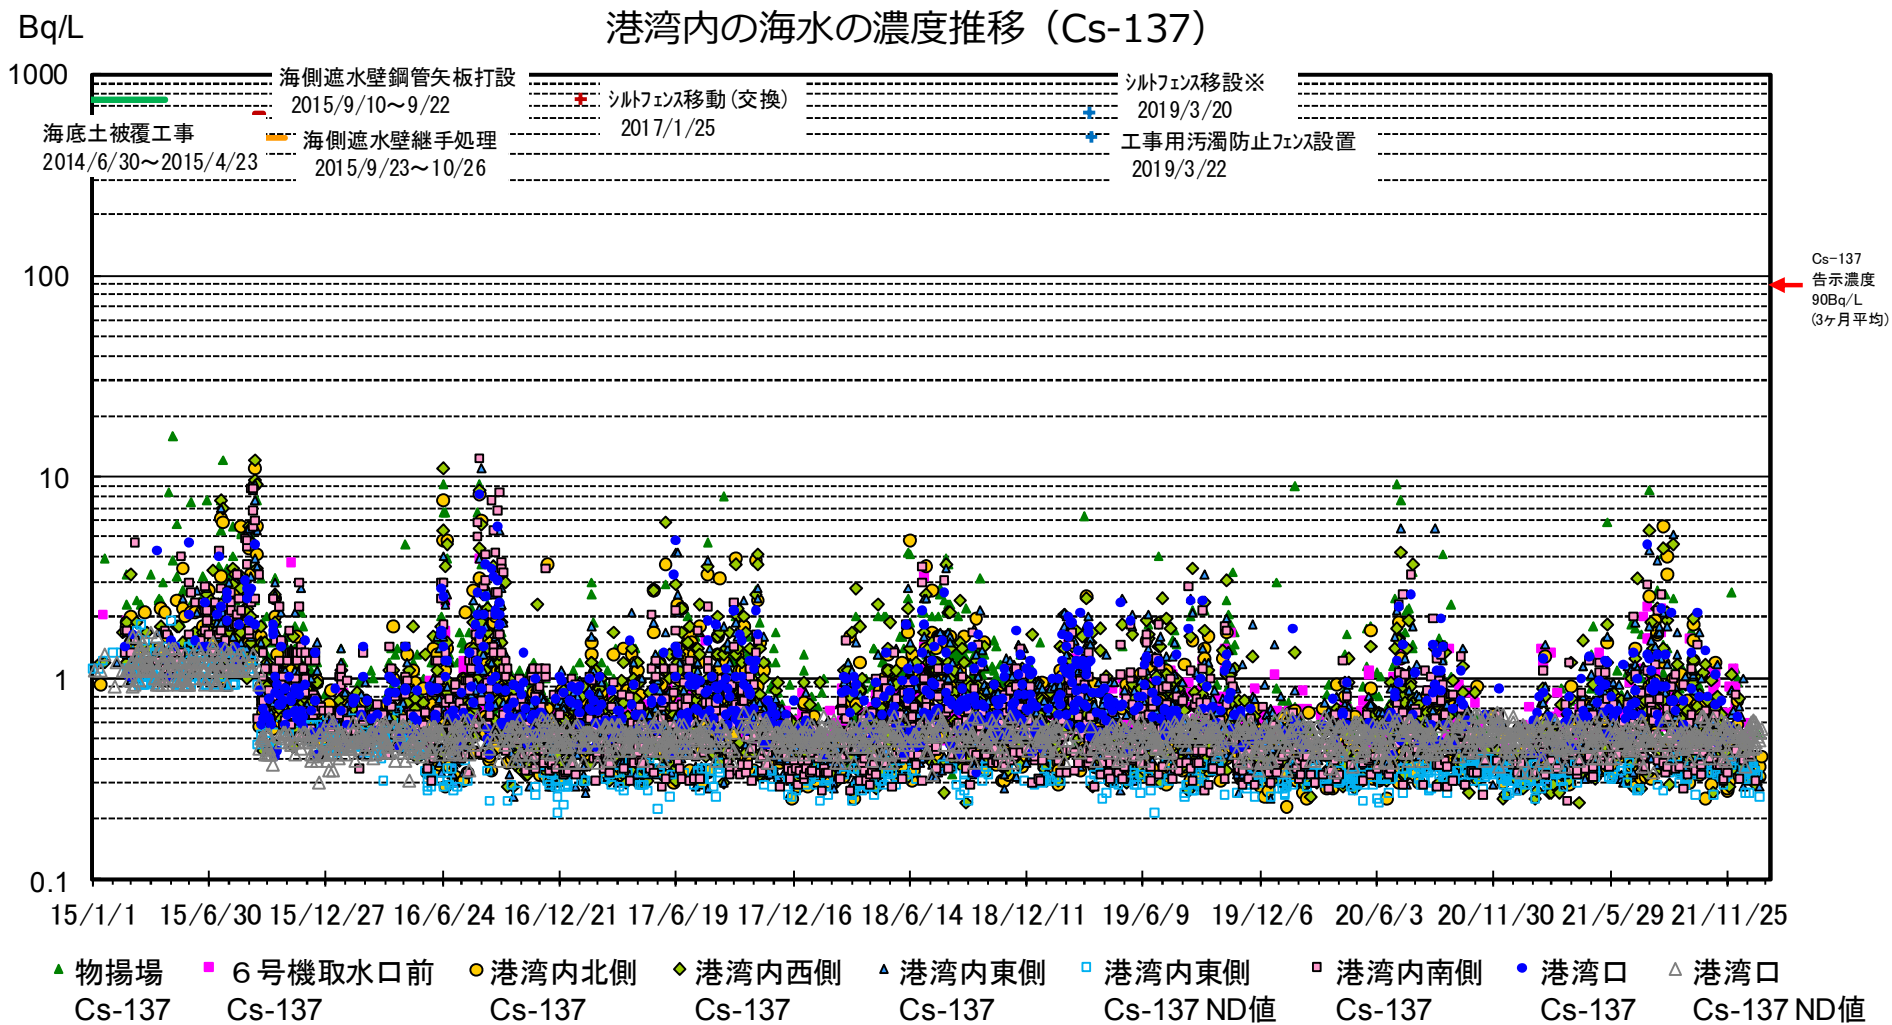


注: 2015/9/16以降、検出限界値を見直し(1.5→0.7Bq/L)。  
 港湾口が検出限界値未満の場合は △ で示す。(検出限界値は物揚場、6号機取水口前も同等)  
 港湾内北側・西側・東側・南側について2016/6/1以降、検出限界値を見直し(0.7→0.4Bq/L)。検出限界値未満の場合は □ で示す。  
 ※: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。



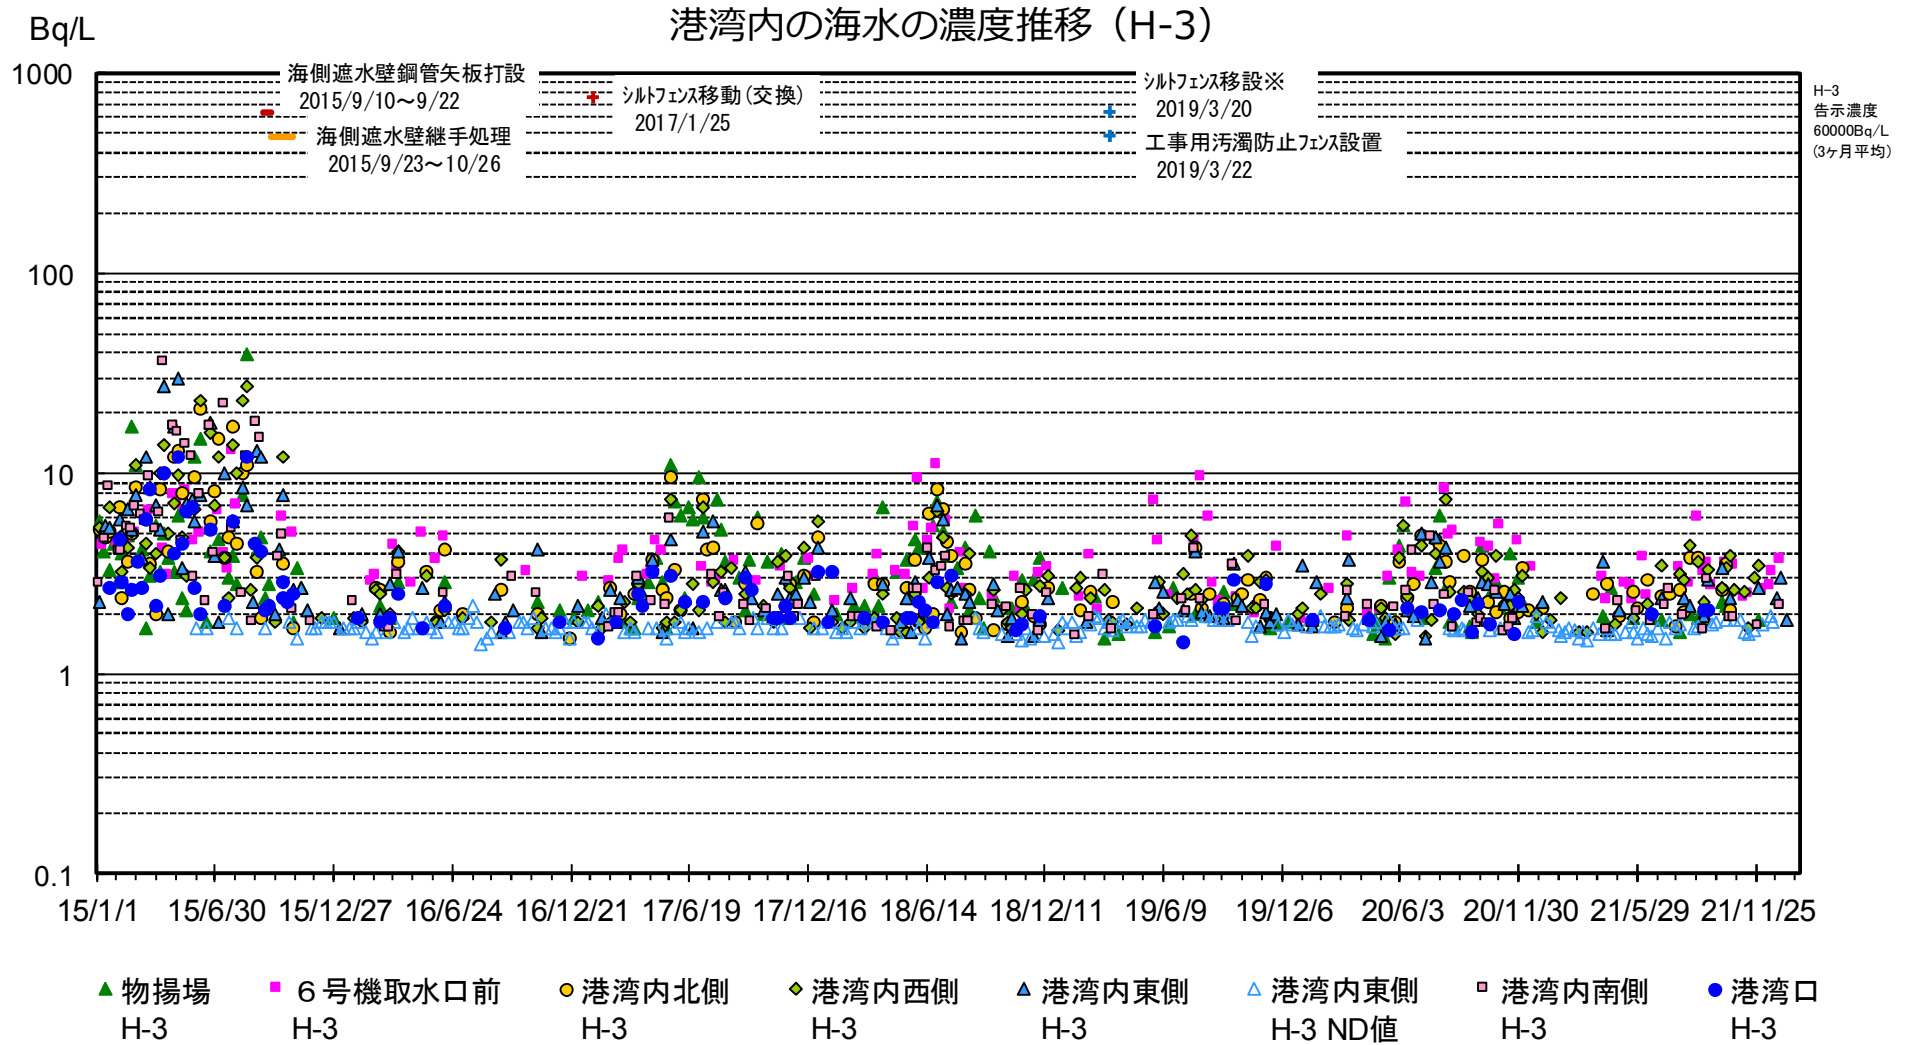

※: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。

# 港湾内の海水の濃度推移 (3/3)

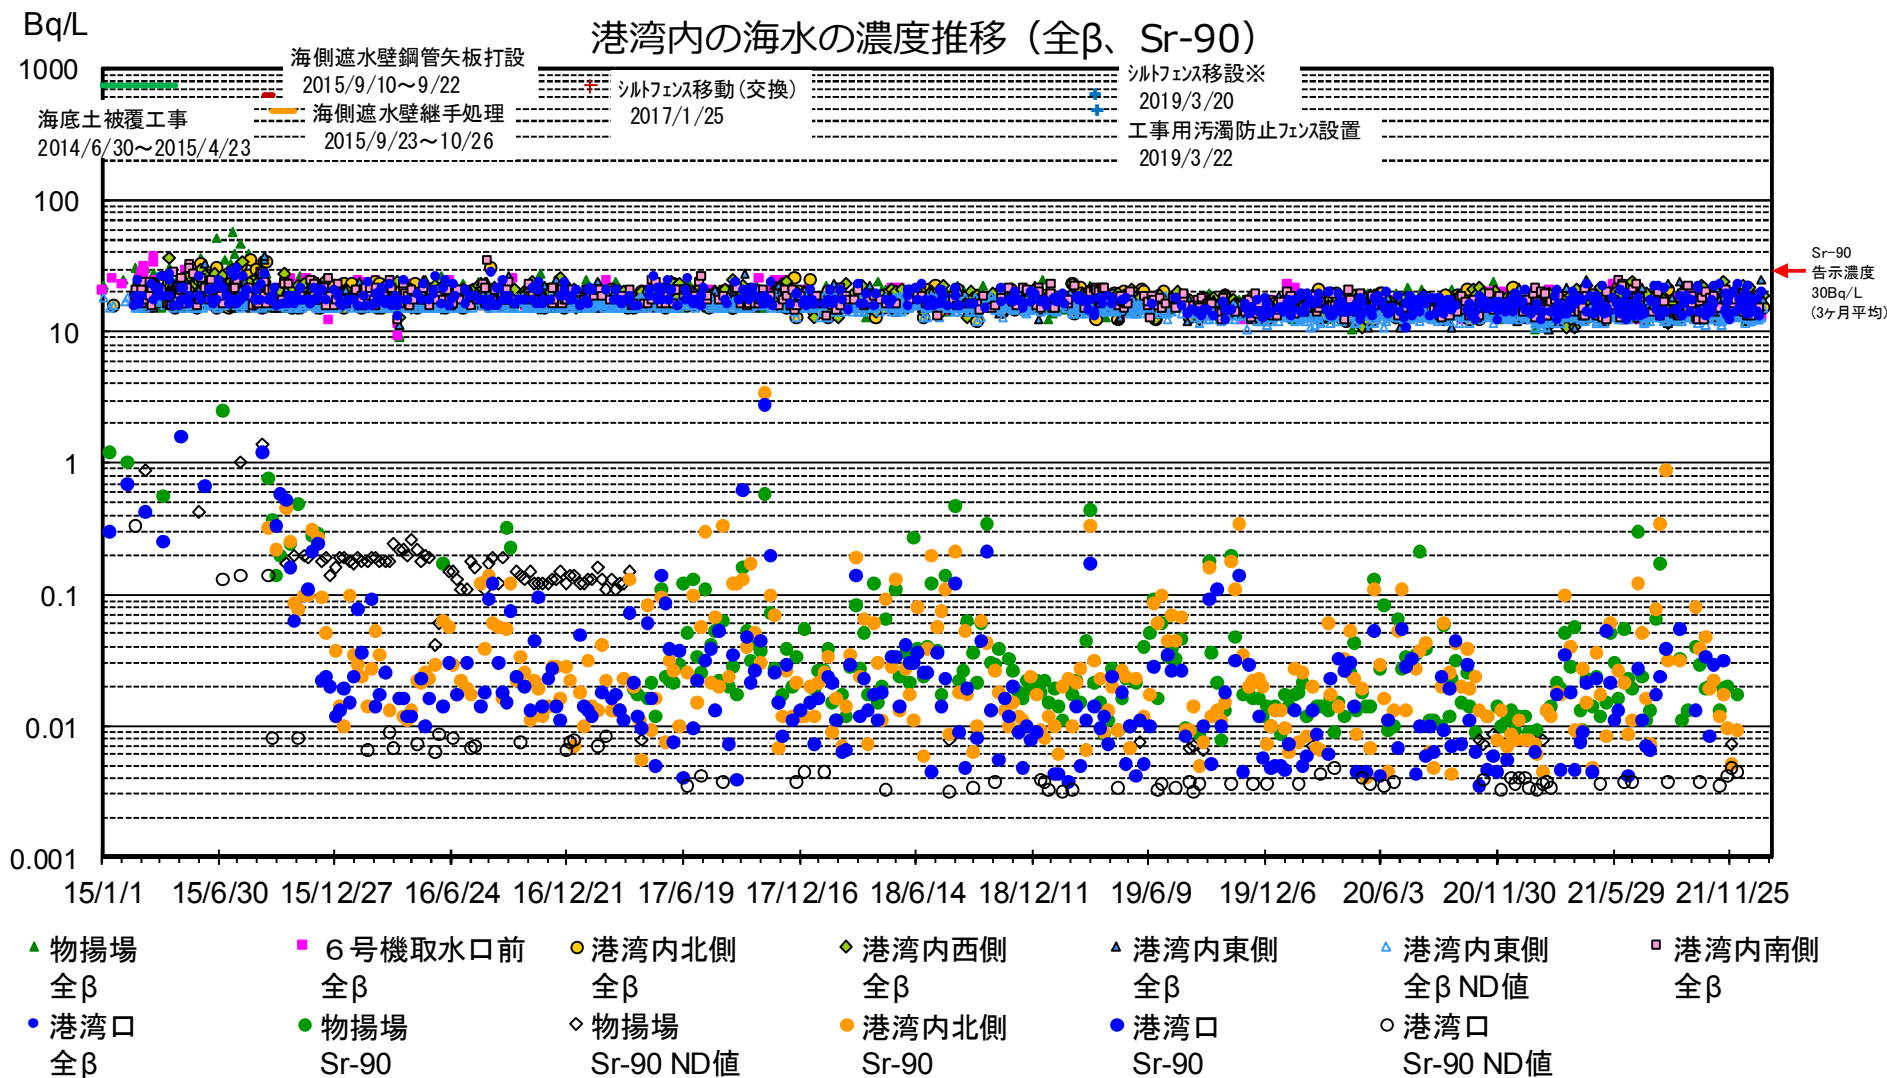


注: 全βは天然の放射性物質K-40(10~20Bq/L)を含む。全βについて、検出限界値未満の場合は△で示す(検出限界値は各地点とも同じ)。

Sr-90について、物揚場が検出限界値未満の場合は◇で示す。2017/4/3以降、検出限界値を見直し(0.3→0.01Bq/L)。

港湾口が検出限界値未満の場合は○で示す(検出限界値は港湾内北側も同じ)。

※: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。

## 港湾外の海水の濃度推移 (Cs-137)

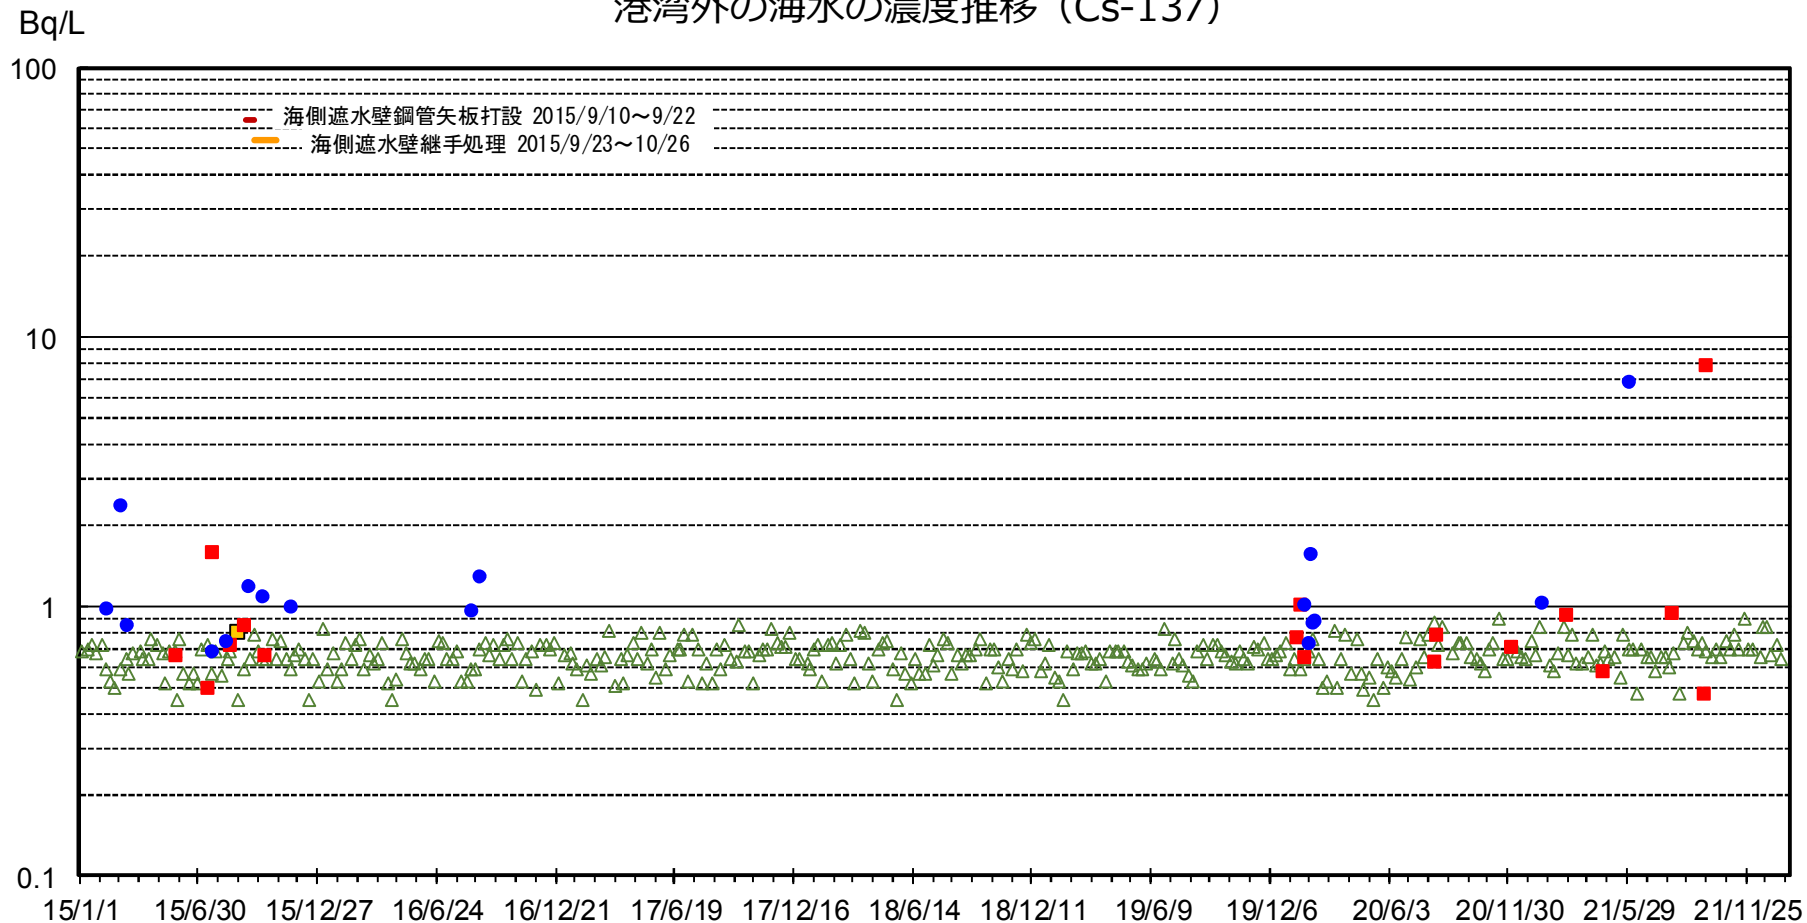


- ▲ 港湾口東側 Cs-137    △ 港湾口東側 Cs-137 ND値    □ 港湾口北東側 Cs-137    ■ 北防波堤北側 Cs-137    ● 港湾口南東側 Cs-137    ● 南防波堤南側 Cs-137    ■ 5,6号機放水口北側 Cs-137    ● 南放水口付近 Cs-137

※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。  
 2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。  
 2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。





## 港湾外の海水の濃度推移 (H-3)

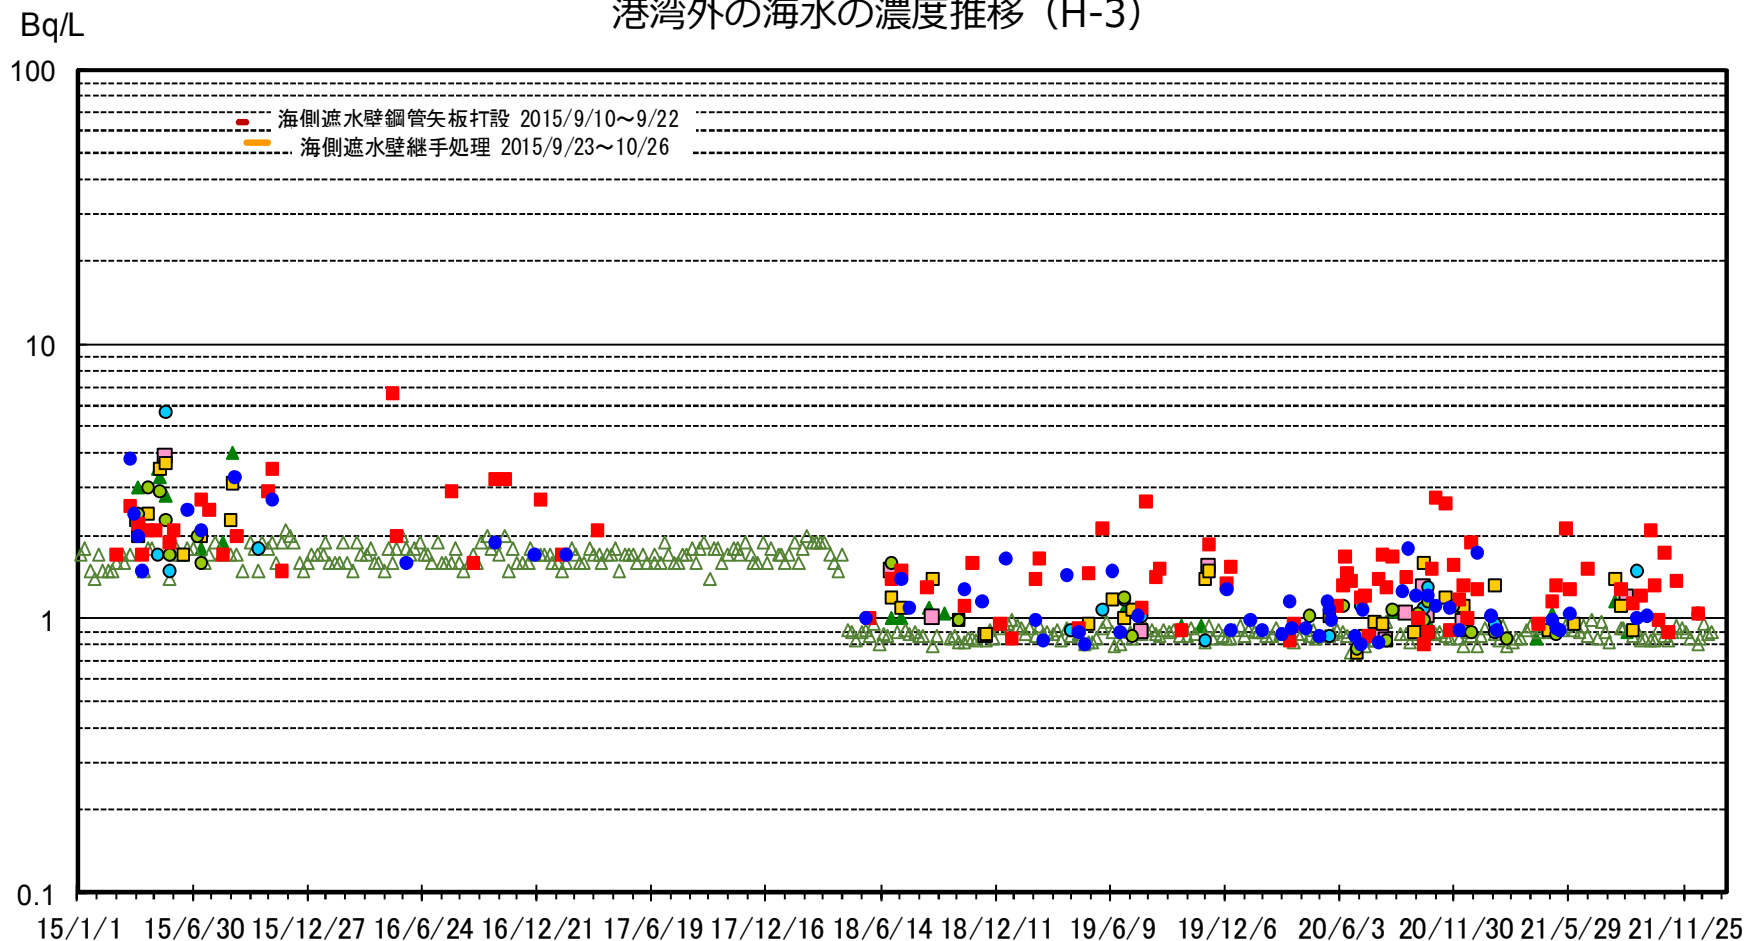

▲ 港湾口東側 H-3   
 △ 港湾口東側 H-3 ND値   
 ■ 港湾口北東側 H-3   
 ■ 北防波堤北側 H-3   
 ● 港湾口南東側 H-3   
 ● 南防波堤南側 H-3   
 ■ 5,6号機放水口北側 H-3   
 ● 南放水口付近 H-3

※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。  
 2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。 2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。  
 注: 2018/4/23以降、検出限界値を見直し(2→1Bq/L)。


# 港湾外の海水の濃度推移 (3/3)

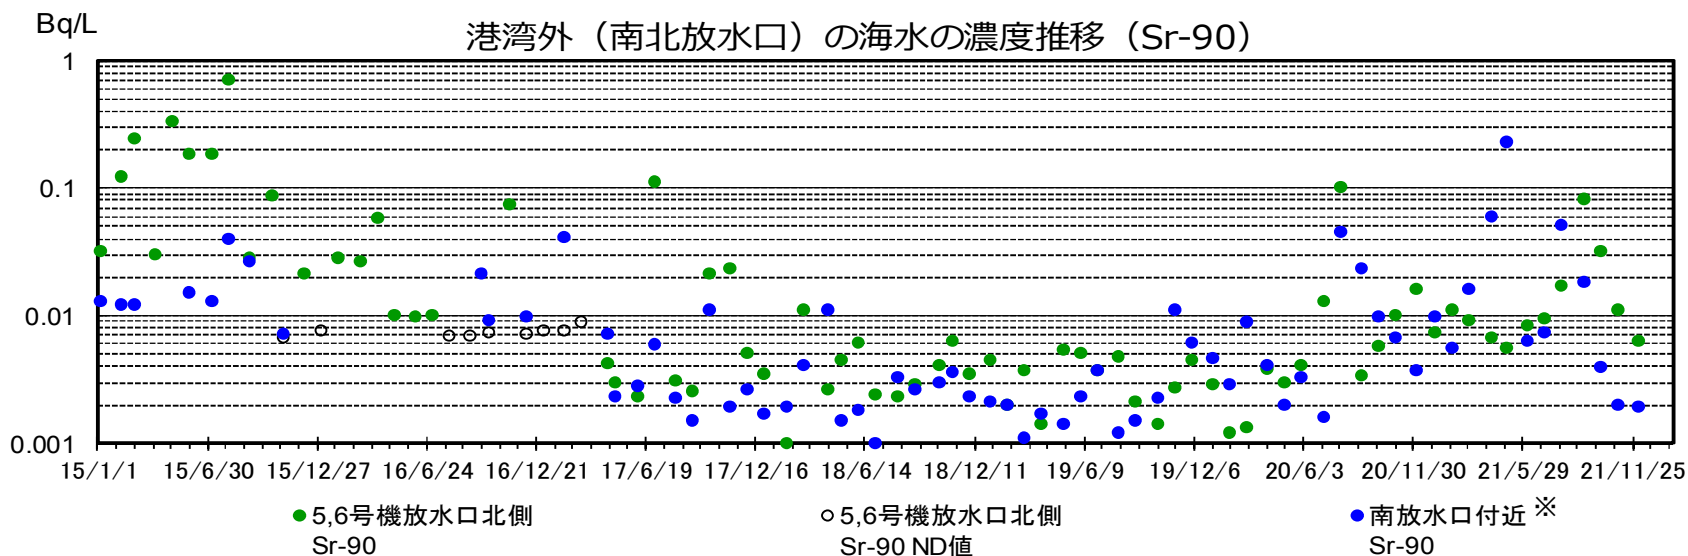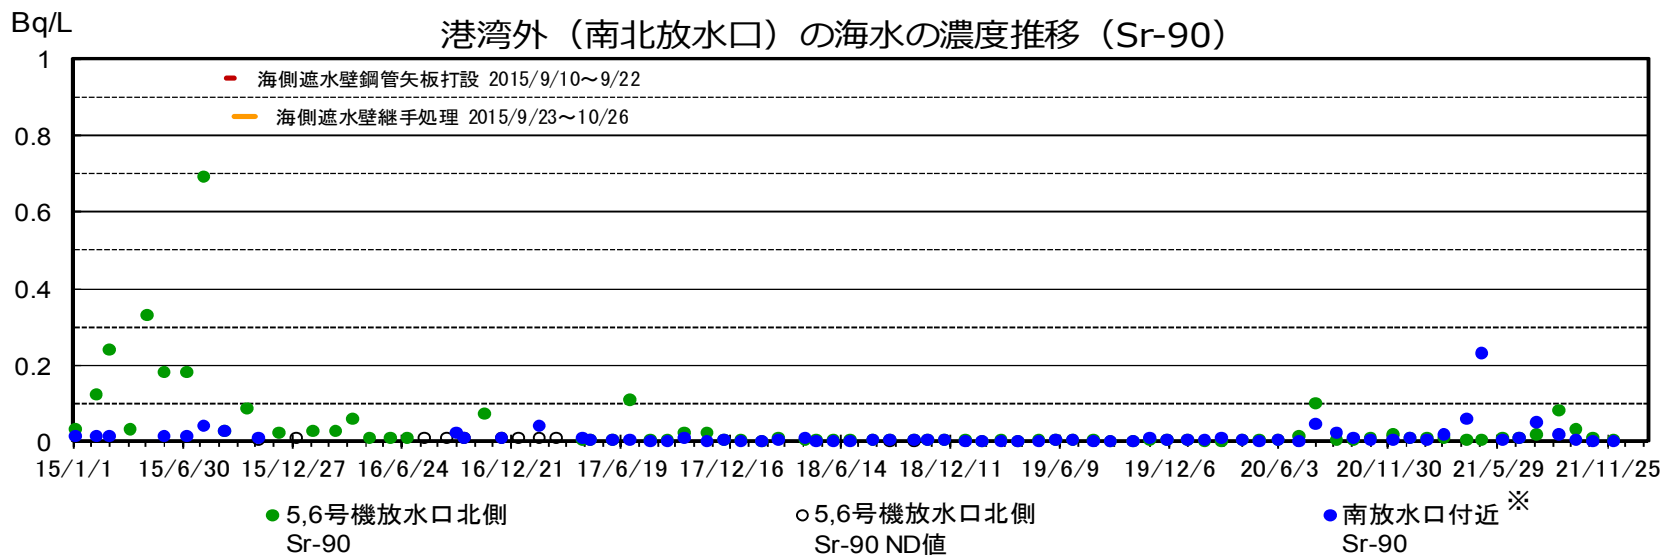

注：2017/4/17以降、検出限界値を見直し(0.01→0.001Bq/L)。  
 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※：2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更

## <参考> 港湾口海水モニタの測定結果

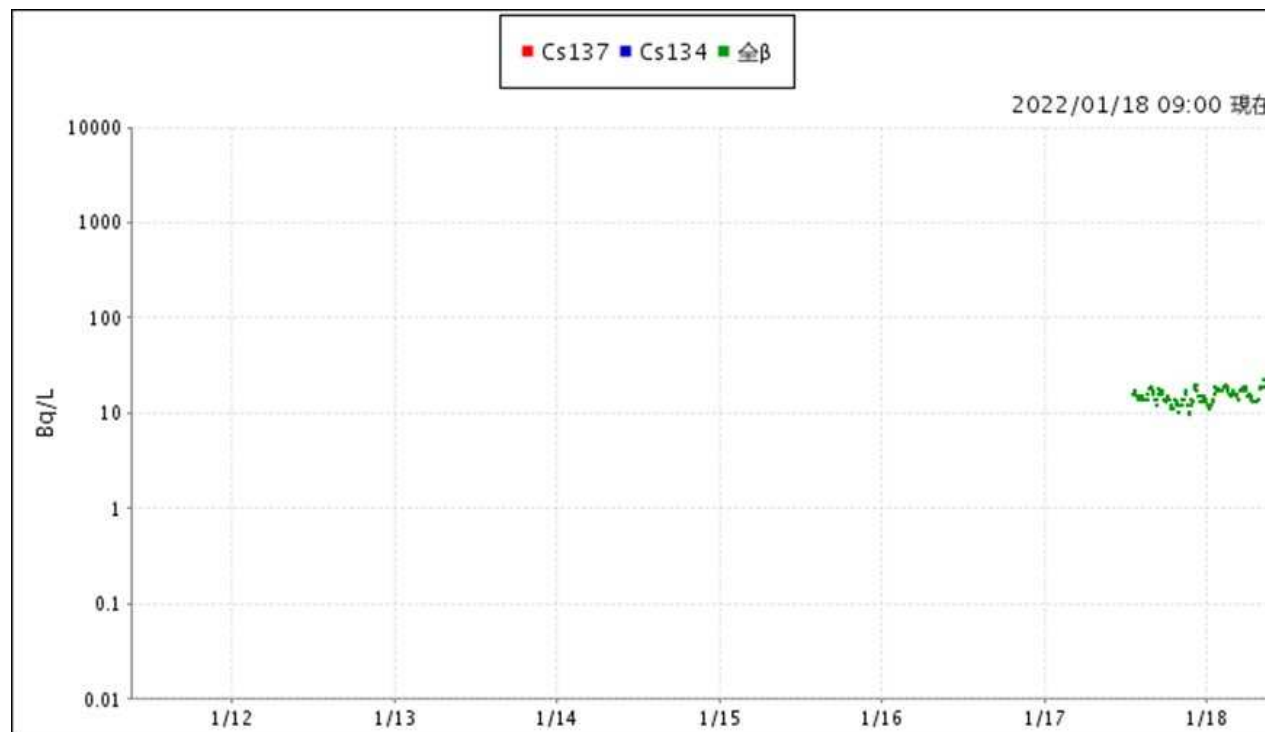

※検出限界値未満 (ND) の場合は、グラフにデータが表示されません。  
(検出限界値)

- ・セシウム (Cs)134 : 0.02 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 0.05 Bq/L
- ・全β : 8.7 Bq/L

※海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻き上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。

※設備清掃後は、検出槽に付着していた放射性物質が除去されることによりセシウム濃度のデータが低下します。

※参考 「福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」に定める告示濃度限度は、以下の通り。

- ・セシウム (Cs)134 : 60 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 90 Bq/L

○2021年12月19日23時10分に設備不具合により停止しました。2022年1月17日13時03分に復旧作業が終了し起動しております。

○設備の不具合および清掃・点検保守作業等により、データが欠測する場合があります。

## 1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2021年12月)

### 【評価の目的】


- 廃炉作業の進捗による周辺環境への影響を確認するとともに、1～4号機の安定冷却状況を確認するため、追加的放出量を毎月評価し、それを基に一般公衆への被ばく線量を評価すること。

### 【評価結果】

- 2021年12月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果、 $1.1 \times 10^4$  (ベクレル/時)未満であり、放出管理の目標値( $1.0 \times 10^7$ ベクレル/時)を下回っていることを確認した。
- 本評価値における敷地境界の空气中放射性物質濃度は Cs-134: $2.1 \times 10^{-12}$ (ベクレル/cm<sup>3</sup>)、Cs-137: $1.8 \times 10^{-12}$ (ベクレル/cm<sup>3</sup>)であり告示濃度<sup>\*1</sup>を下回っていることを確認した。また、本評価値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間0.04マイクロシーベルト未満(0.00004ミリシーベルト未満)であり、年間30マイクロシーベルト(0.03ミリシーベルト<sup>\*2</sup>)と比較し十分に小さい値である。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(周辺監視区域外の空气中の濃度限度)はCs-134: $2 \times 10^{-5}$ (ベクレル/cm<sup>3</sup>)、Cs-137: $3 \times 10^{-5}$ (ベクレル/cm<sup>3</sup>)である。

※2 「特定原子力施設に係る実施計画」(以下、実施計画)において敷地境界における一般公衆の被ばく線量1ミリシーベルト/年を満たすための気体の放出による被ばく線量は、年間30マイクロシーベルト(0.03ミリシーベルト)としている。また、その評価に用いた放出量( $1.0 \times 10^7$ ベクレル/時)を、放出管理の目標値として定めている。

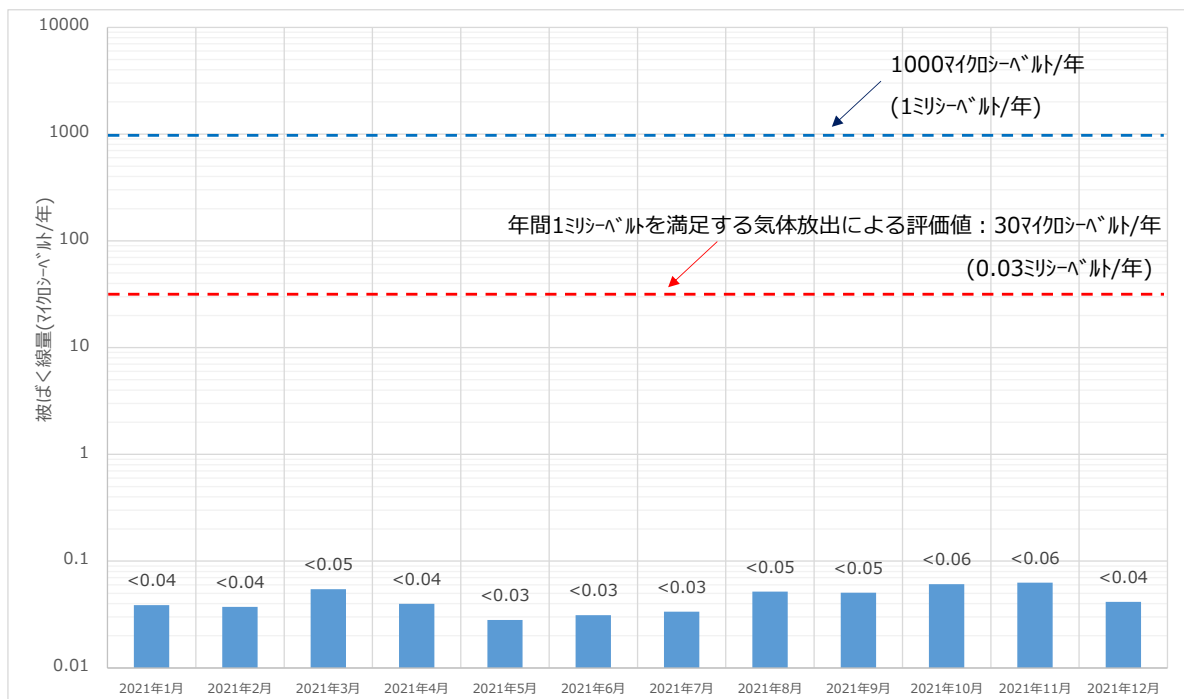

\*1 被ばく線量は1～4号機の放出量評価値と5、6号機の測定実績に基づき算出。

(2019年10月公表分まで、5、6号機の被ばく線量は、運転中の評価値0.17マイクロシーベルトを一律加算していた。見直し前後の被ばく線量は、2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合 第72回事務局会議資料に掲載。)

\*2 5、6号機は当月の測定結果が検出限界値未満であったことから被ばく影響はないとした。


## 【評価手法】

- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)は各号機の放出箇所ごとに放出量を計算して、その合計値としている。  
(計算に使用したデータについては別紙参照)
- 放出量は過小評価にならないように条件を設定※した以下の計算式より求めている。  
放出量(ベクレル/時) = ①空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>) × ②月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)  
①「空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>)」は連続ダストモニタデータを使って月間の変動を考慮した濃度を計算で求めている。(詳細は別紙の参考1参照)  
②「月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)」は放出箇所ごとに以下の評価手法で算出している。
  - ・原子炉上部の場合は評価時点の燃料の崩壊熱(MW)による蒸気発生量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・排気設備の出口の場合は排気設備の定格流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・PCV ガス管理システムの場合は1ヶ月間の平均流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・建屋の開口部の場合は日々の外部風速、建屋内外圧、隙間面積から算出した月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)。  
(詳細は別紙の参考2参照)
- 被ばく線量は年間の気象条件による大気拡散を考慮し、実施計画(Ⅲ章2.2)の評価方法と同様に計算している。
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。


※設定した条件:①空気中放射性物質濃度の測定結果が検出限界値未満の場合、放出気体の空気中放射性物質濃度を検出限界値として放出量を算出している。

## 【モニタリングポスト及び敷地境界ダストモニタのトレンド】

- 空間放射線量  
低いレベルで安定。

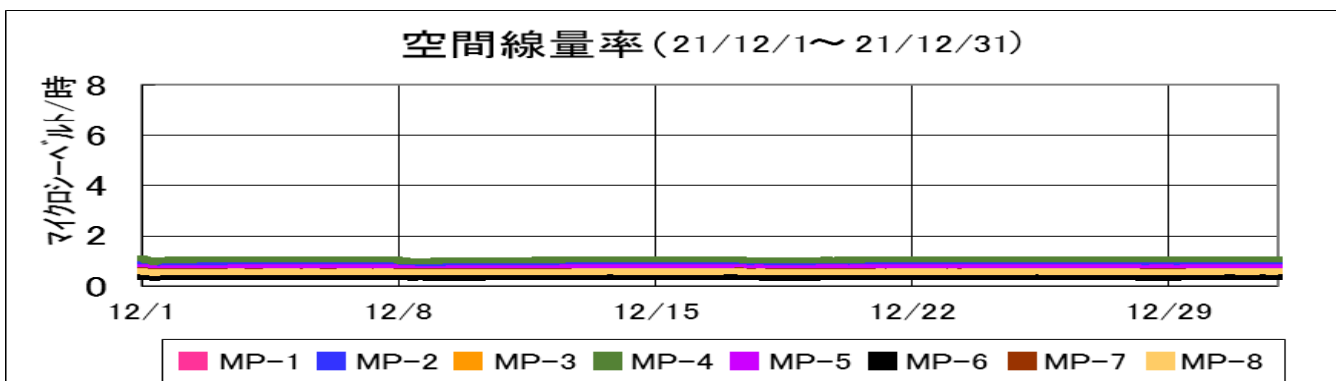


- 空気中の放射性物質  
大きな上昇はなく、低濃度で安定。

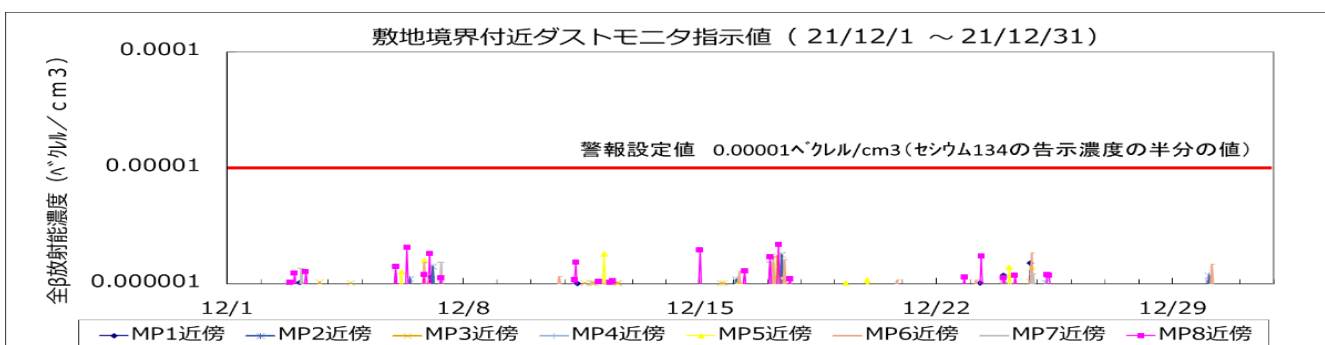


## 【各号機における放出量の推移】

1～4号機について、11月とほぼ同程度の放出量であった。


### 1号機～4号機からの放出量推移

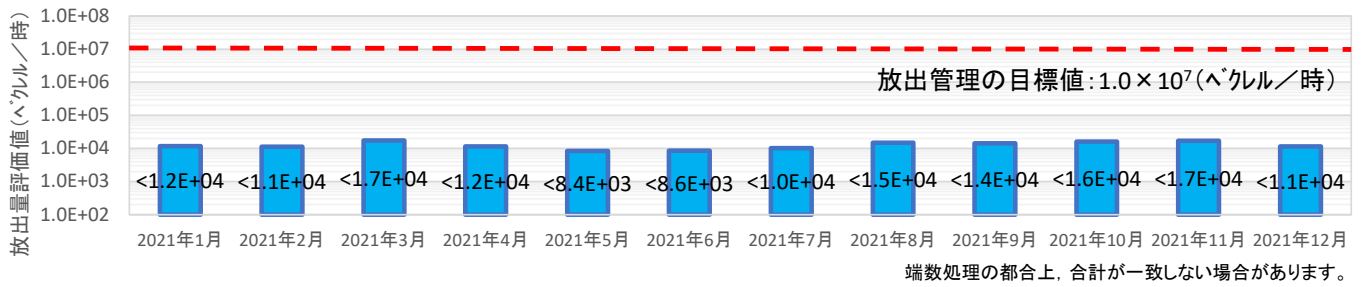


### 1号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

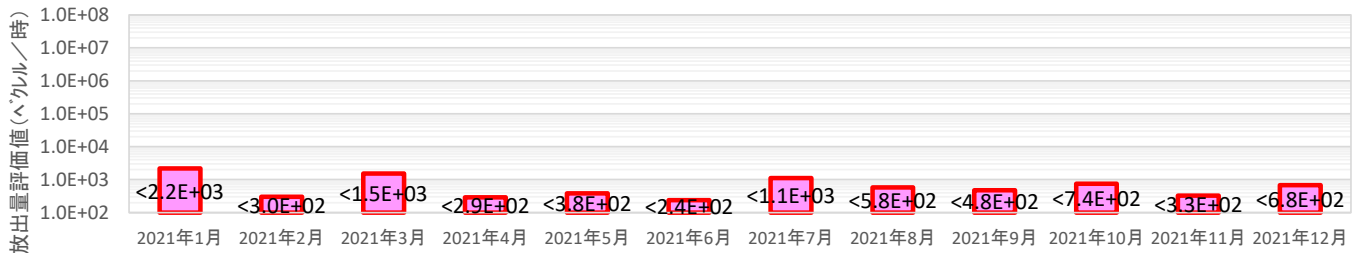


### 2号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

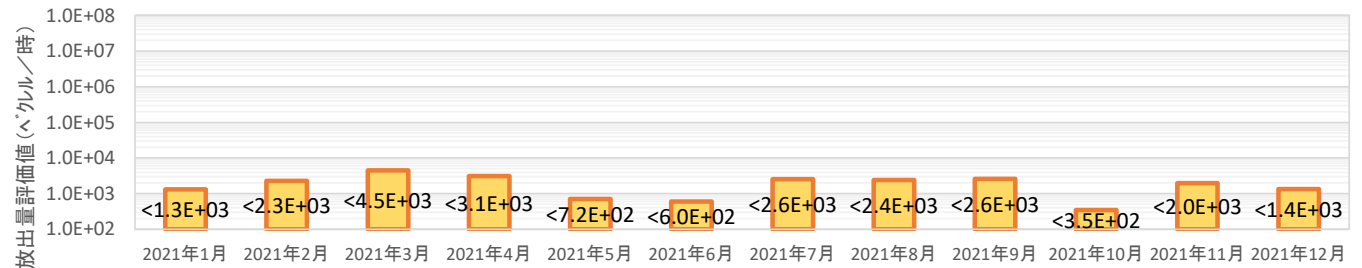

### 3号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

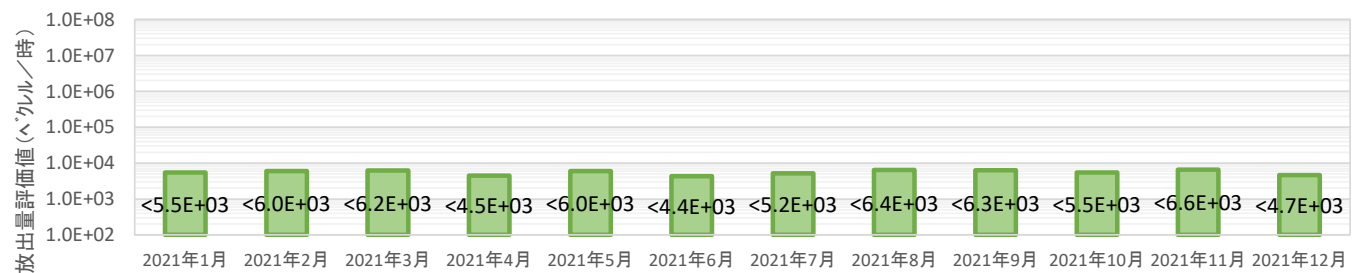

### 4号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移

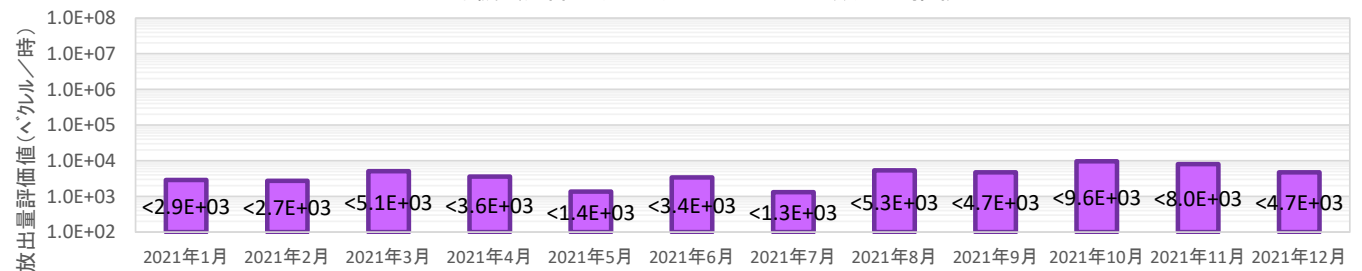




## 【評価手法】

- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)は各号機の放出箇所ごとに放出量を計算して、その合計値としている。  
(計算に使用したデータについては別紙参照)
- 放出量は過小評価にならないように条件を設定※した以下の計算式より求めている。  
放出量(ベクレル/時) = ①空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>) × ②月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)  
①「空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>)」は連続ダストモニタデータを使って月間の変動を考慮した濃度を計算で求めている。(詳細は別紙の参考1参照)  
②「月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)」は放出箇所ごとに以下の評価手法で算出している。
  - ・原子炉上部の場合は評価時点の燃料の崩壊熱(MW)による蒸気発生量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・排気設備の出口の場合は排気設備の定格流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・PCV ガス管理システムの場合は1ヶ月間の平均流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・建屋の開口部の場合は日々の外部風速、建屋内外圧、隙間面積から算出した月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)。(詳細は別紙の参考2参照)
- 被ばく線量は年間の気象条件による大気拡散を考慮し、実施計画(Ⅲ章2.2)の評価方法と同様に計算している。
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。


※設定した条件:①空気中放射性物質濃度の測定結果が検出限界値未満の場合、放出気体の空気中放射性物質濃度を検出限界値として放出量を算出している。

## 【モニタリングポスト及び敷地境界ダストモニタのトレンド】

- 空間放射線量  
低いレベルで安定。

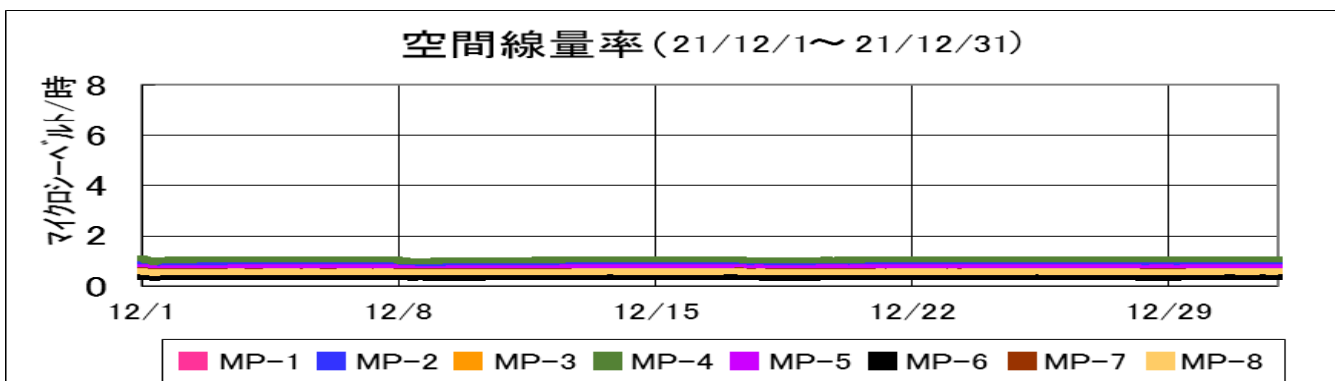


- 空気中の放射性物質  
大きな上昇はなく、低濃度で安定。

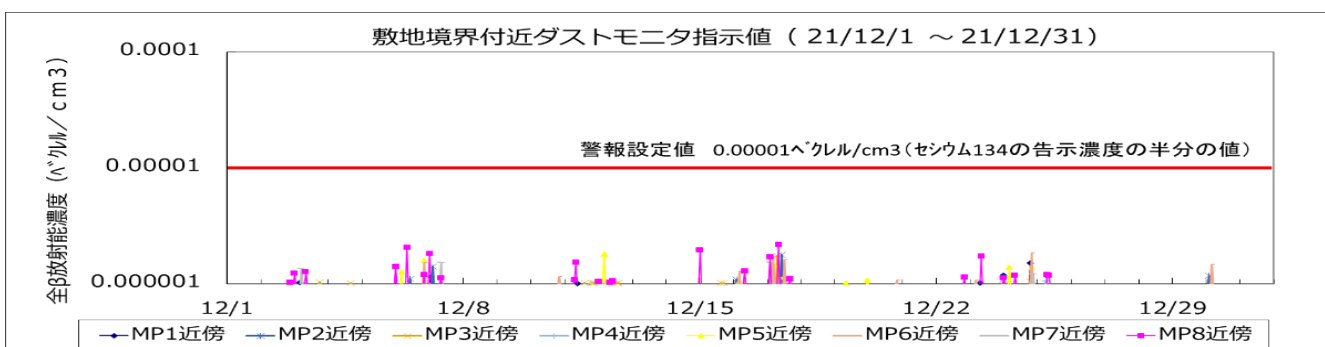


## 【各号機における放出量の推移】

1～4号機について、11月とほぼ同程度の放出量であった。


### 1号機～4号機からの放出量推移

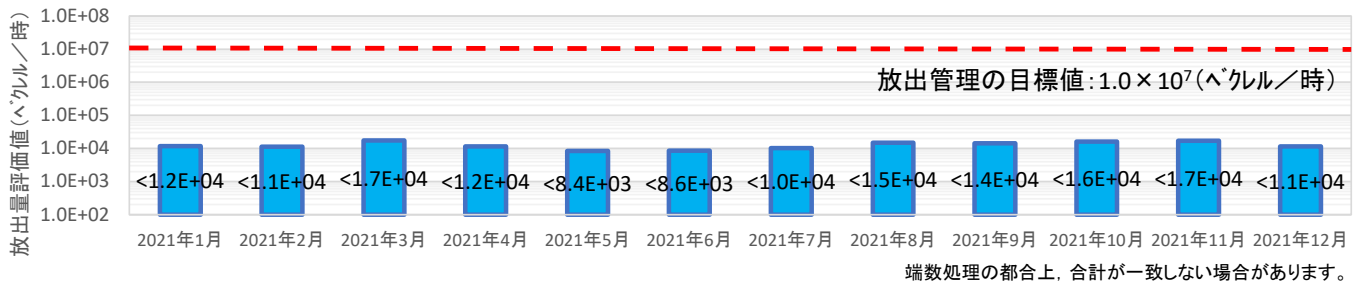


### 1号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

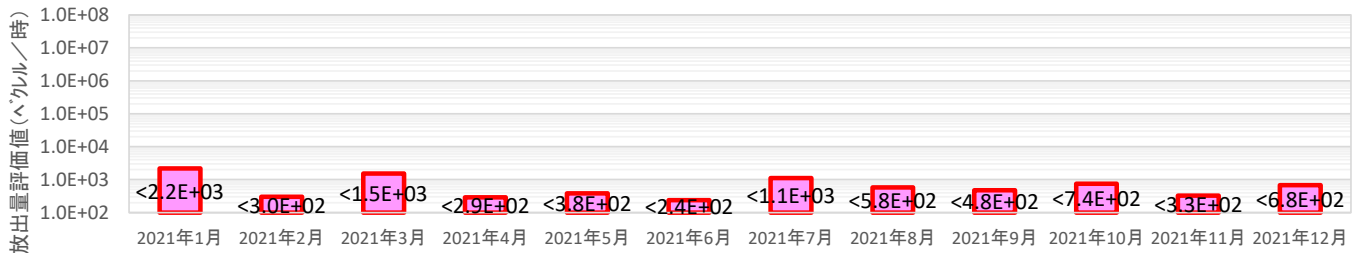


### 2号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

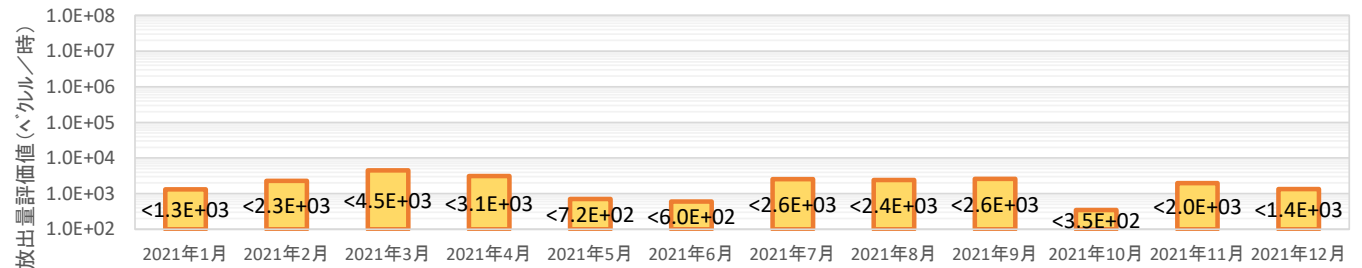

### 3号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

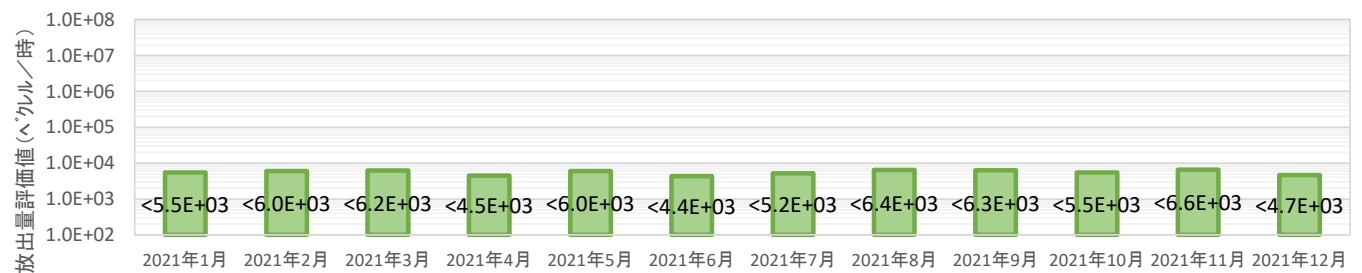

### 4号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移

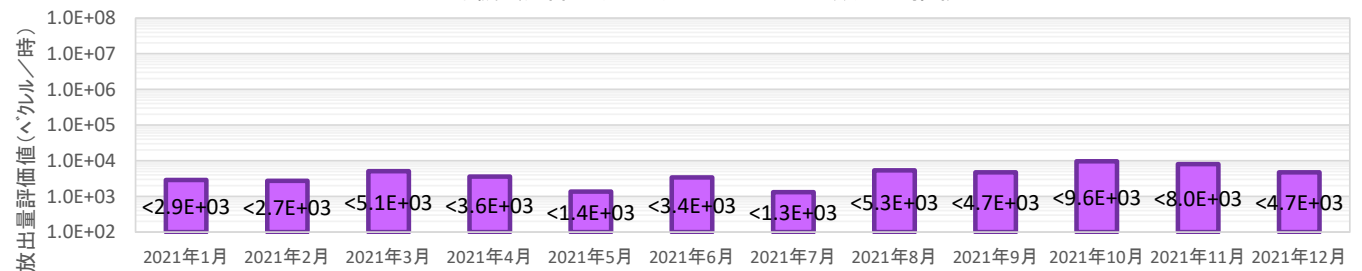



空气中放射性物質濃度の分析結果(1~4号機) (1/2)

| 採取地点                              | 採取日時                                | 分析項目                           |                                 |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                     | I-131<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | Cs-134<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | Cs-137<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 1号機原子炉建屋 原子炉ウエル上部 南側              | 2021/12/02 09:55 ~ 2021/12/02 10:25 | <9.9E-08                       | <8.9E-08                        | 1.6E-07                         |
| 1号機原子炉建屋 原子炉ウエル上部 北西側             | 2021/12/02 10:35 ~ 2021/12/02 11:05 | <1.0E-07                       | <1.0E-07                        | 2.7E-07                         |
| 1号機原子炉建屋 原子炉ウエル上部 北側              | 2021/12/02 11:15 ~ 2021/12/02 11:45 | <9.5E-08                       | <9.4E-08                        | 2.1E-07                         |
| 1号機原子炉建屋 機器ハッチオベフ口階 <sup>※1</sup> | 2021/12/02 09:15 ~ 2021/12/02 09:45 |                                | <1.0E-07                        | <9.8E-08                        |
| 1号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(粒子状)         | 2021/12/03 07:14 ~ 2021/12/03 07:54 | <5.9E-07                       | <7.4E-07                        | <8.4E-07                        |
| 1号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(揮発性)         | 2021/12/03 07:14 ~ 2021/12/03 07:54 | <7.9E-07                       | <1.1E-06                        | <9.5E-07                        |
| 2号機原子炉建屋排気設備出口                    | 2021/12/06 06:57 ~ 2021/12/06 08:57 | <9.8E-08                       | <1.4E-07                        | <8.1E-08                        |
|                                   | - ~ -                               | -                              | -                               | -                               |
| 2号機原子炉建屋排気設備入口                    | 2021/12/06 06:49 ~ 2021/12/06 08:49 | <1.0E-07                       | <2.7E-07                        | 5.4E-06                         |
|                                   | - ~ -                               | -                              | -                               | -                               |
| 2号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(粒子状)         | 2021/12/06 07:36 ~ 2021/12/06 07:46 | <9.5E-07                       | <9.7E-07                        | <8.0E-07                        |
| 2号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(揮発性)         | 2021/12/06 07:46 ~ 2021/12/06 08:16 | <6.9E-07                       | <1.2E-06                        | <9.0E-07                        |
| 3号機原子炉建屋上部 原子炉上南側                 | 2021/12/07 07:17 ~ 2021/12/07 07:47 | <9.9E-08                       | <1.2E-07                        | 4.0E-07                         |
| 3号機原子炉建屋上部 機器ハッチ開口部               | 2021/12/07 07:09 ~ 2021/12/07 08:09 | <1.0E-07                       | <1.0E-07                        | 3.9E-07                         |
| 3号機燃料取出し用カバー排気設備入口                | 2021/12/07 09:02 ~ 2021/12/07 12:02 | <8.6E-08                       | <8.9E-08                        | 1.1E-07                         |
| 3号機燃料取出し用カバー排気設備出口                | 2021/12/07 09:08 ~ 2021/12/07 12:08 | <8.4E-08                       | <7.6E-08                        | <6.8E-08                        |
| 3号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(粒子状)         | 2021/12/07 07:16 ~ 2021/12/07 07:26 | <8.2E-07                       | <1.1E-06                        | <8.3E-07                        |
| 3号機原子炉格納容器ガス管理システム出口(揮発性)         | 2021/12/07 07:26 ~ 2021/12/07 07:56 | <6.4E-07                       | <9.5E-07                        | <7.1E-07                        |
| 4号機燃料取出し用カバー排気設備入口 <sup>※1</sup>  | 2021/12/13 05:04 ~ 2021/12/13 06:04 |                                | <1.1E-07                        | <9.2E-08                        |
| 4号機燃料取出し用カバー排気設備出口                | 2021/12/13 09:13 ~ 2021/12/13 12:13 | <8.8E-08                       | <1.2E-08                        | <9.7E-09                        |
| 4号機原子炉建屋 SFP近傍                    | 2021/12/13 09:28 ~ 2021/12/13 10:28 | <9.4E-08                       | <1.1E-07                        | <8.9E-08                        |
| 4号機原子炉建屋 チェンジング近傍 <sup>※1</sup>   | 2021/12/13 08:08 ~ 2021/12/13 09:08 |                                | <1.3E-07                        | <9.5E-08                        |
| 告示濃度限度 <sup>※2</sup>              |                                     | 1E-03                          | 2E-03                           | 3E-03                           |

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 分析結果は粒子状のみの値。

※2 告示濃度限度：東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第四欄：放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度)

空气中放射性物質濃度の分析結果(1~4号機) (2/2)

| 採取地点                            | 採取日時                                | 分析項目                            |                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                     | Cs-134<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | Cs-137<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 1号機廃棄物処理建屋 西側開口部 <sup>※1</sup>  | 2021/12/12 06:49 ~ 2021/12/12 06:56 | <9.8E-07                        | <9.2E-07                        |
| 2号機廃棄物処理建屋 西側開口部 <sup>※1</sup>  | 2021/12/12 06:49 ~ 2021/12/12 06:55 | <1.1E-06                        | <9.2E-07                        |
| 3号機廃棄物処理建屋 西側開口部 <sup>※1</sup>  | 2021/12/12 07:02 ~ 2021/12/12 07:08 | <1.1E-06                        | <9.3E-07                        |
| 4号機廃棄物処理建屋 北西側開口部 <sup>※1</sup> | 2021/12/12 07:03 ~ 2021/12/12 07:10 | <9.6E-07                        | 9.8E-07                         |
| 4号機原子炉建屋開口部 大物搬入口 <sup>※1</sup> | 2021/12/16 06:41 ~ 2021/12/16 06:48 | <1.4E-06                        | <9.0E-07                        |
| プロセス主建屋 4階大物搬入口 <sup>※1</sup>   | 2021/12/12 07:39 ~ 2021/12/12 07:44 | 1.2E-06                         | 3.1E-05                         |
| 焼却工作建屋開口部 南西側開口部 <sup>※1</sup>  | 2021/12/12 07:19 ~ 2021/12/12 07:25 | <7.1E-07                        | <9.0E-07                        |
| サイトバンカ建屋開口部 大物搬入口 <sup>※1</sup> | 2021/12/12 07:17 ~ 2021/12/12 07:24 | <9.9E-07                        | <9.8E-07                        |
| 告示濃度限度 <sup>※2</sup>            |                                     | 2E-03                           | 3E-03                           |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。





・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 分析結果は、粒子状のみの値。

※2 告示濃度限度：東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第四欄：放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度)

1~4号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 2021年12月 評価分(詳細データ)
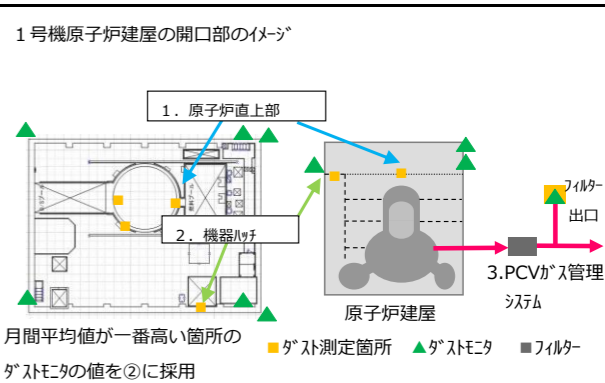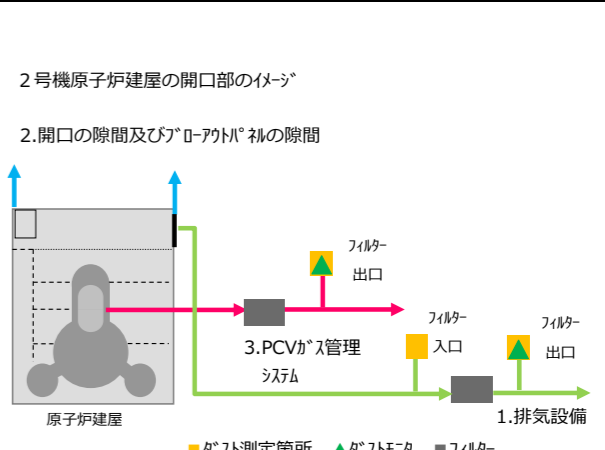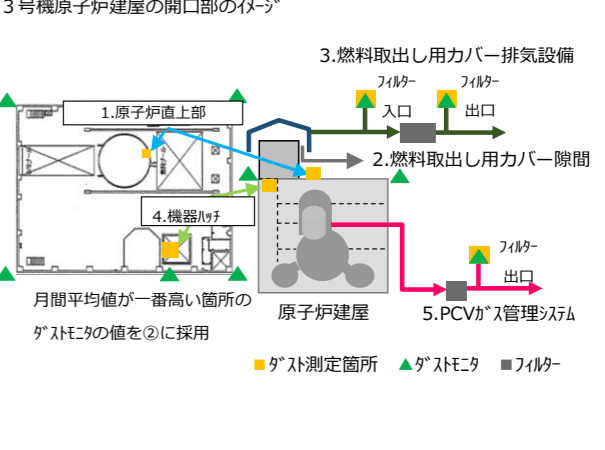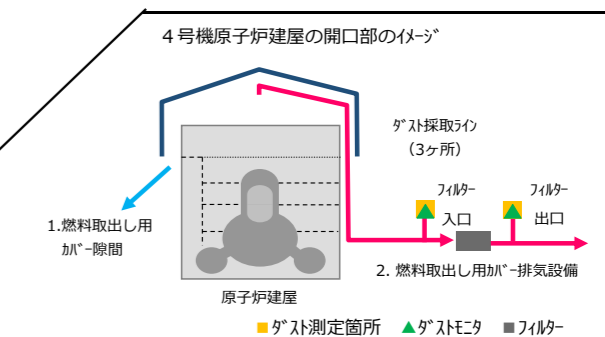
| 機   | 単位  | ダストモニタデータ<br>(図中の▲で採取)            |                                | ダスト測定データ<br>(図中の■で採取) |                      | 相対比                  |                  | 月間漏洩率評価          |               | 放出量評価                       |                         | 放出量評価の号機ごとの合計値                                   |                      | 図        |   |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------|---|
|     |   | μg/L/cm³                          | μg/L/cm³                       | 月/日                   | μg/L/cm³             | μg/L/cm³             | (-)              | cm³/時            | 月間漏洩率<br>算出方法 | μg/L/時                      | μg/L/時                  | μg/L/時   | μg/L/時               |          |   |
| 1号機 | 1. 原子炉直上部<br>(ダストモニタ: 原子炉建屋四隅の▲)<br>(ダスト測定箇所: ウェル上の■)                               | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 2021年12月<br>現在の崩壊熱<br>量より評価 | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | Cs-134合計             | Cs-137合計 | 1号機原子炉建屋の開口部のイメージ<br><br>月間平均値が一番高い箇所の ■ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター<br>ダストモニタの値を②に採用<br>※1号機ダストモニタは、12月27日6:52~21:00において電源停止のため停止している。<br>当該停止期間においてモニタリングポスト・構内連続ダストモニタ・構内線量表示器<br>の指示値で変動が見られず、オペフロ上で作業が実施されていないことから、停止期<br>間を除く2021年12月の平均ダスト濃度と同等として放出量を評価する。 |
|     | 2. 機器ハッチ<br>(ダストモニタ: 機器ハッチ近傍の▲)<br>(ダスト測定箇所: 機器ハッチ近傍の■)                             | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | 1号機合計(Cs-134+Cs-137) |          |   |
|     | 3. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ: PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: PCVガス管理設備フィルター出口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)<br>(単位: cps) | ②ダストモニタ<br>(月間平均)<br>(単位: cps) | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 計測値の月間<br>平均値               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | Kr-85<br>(②×⑦)              |                         | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×2.5E-19×0.0022÷0.5×1E3) |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | 6.3E+06                     |                         | 6.1E-08 (ミリシーベルト/年)                              |                      |          |   |
| 2号機 | 1. 排気設備出口<br>(ダストモニタ: 排気設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: 排気設備フィルター入口の■)                    | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 排気設備の定<br>格流量               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | Cs-134合計             | Cs-137合計 | 2号機原子炉建屋の開口部のイメージ<br><br>2. 開口の隙間及びローアクトバルブの隙間<br>※2号機の作業期間外は作業工程上ダスト採取が出来なかったため<br>保守的に残置物撤去作業期間中のダスト採取結果により、放出量評価を実施した。   |
|     | 残置物撤去作業期間中<br>(1ヶ月のうち作業時間6時間で23日間)  |                                   |                                | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) |                  |                  | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(③×⑦×138÷744) | Cs-137<br>(④×⑦×138÷744)                          | 2号機合計(Cs-134+Cs-137) |          |   |
|     | 2. 開口の隙間及びBOP隙間<br>(ダスト測定箇所: 排気設備フィルター入口の■)   |                                   |                                | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) |                  |                  | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(③×⑦×606÷744) | Cs-137<br>(④×⑦×606÷744)                          |                      |          |   |
|     | 3. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ: PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: PCVガス管理設備フィルター出口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 計測値の月間<br>平均値               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | Kr-85<br>(②×⑦)              |                         | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×2.4E-19×0.0022÷0.5×1E3) |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | 4.4E+08                     |                         | 4.1E-06 (ミリシーベルト/年)                              |                      |          |   |
| 3号機 | 1. 原子炉直上部<br>(ダストモニタ: 原子炉建屋四隅の▲)<br>(ダスト測定箇所: ウェル上の■)                               | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 2021年12月<br>現在の崩壊熱<br>量より評価 | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | Cs-134合計             | Cs-137合計 | 3号機原子炉建屋の開口部のイメージ<br><br>月間平均値が一番高い箇所の ■ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター<br>ダストモニタの値を②に採用  |
|     | 2. 燃料取出し用カバー隙間<br>(ダストモニタ: 燃料取出し用カバーフィルター入口の▲)<br>(ダスト測定箇所: 燃料取出し用カバーフィルター入口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | 3号機合計(Cs-134+Cs-137) |          |   |
|     | 3. 燃料取出し用カバー排気設備出口<br>(ダストモニタ: 燃料取出し用カバーフィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: 燃料取出し用カバーフィルター出口の■) | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 排気設備の定<br>格流量               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                |                      |          |   |
|     | 4. 機器ハッチ<br>(ダストモニタ: 機器ハッチ近傍の▲)<br>(ダスト測定箇所: 機器ハッチ近傍の■)                             | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                |                      |          |   |
|     | 5. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ: PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: PCVガス管理設備フィルター出口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 計測値の月間<br>平均値               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | Kr-85<br>(②×⑦)              |                         | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×3.0E-19×0.0022÷0.5×1E3) |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | 7.8E+08                     |                         | 9.0E-06 (ミリシーベルト/年)                              |                      |          |   |
| 4号機 | 1. 燃料取出し用カバー隙間<br>(ダストモニタ: 燃料取出し用カバーフィルター入口の▲)<br>(ダスト測定箇所: 燃料取出し用カバーフィルター入口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 参考2参照                       | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | Cs-134合計             | Cs-137合計 | 4号機原子炉建屋の開口部のイメージ<br><br>1.燃料取出し用<br>カバー-隙間<br>2.燃料取出し用<br>カバー-排気設備<br>※ 4号機原子炉建屋の開口部のイメージ<br>ダスト採取ポイント<br>(3ヶ所)<br>■ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター  |
|     | 2. 燃料取出し用カバー排気設備<br>(ダストモニタ: 燃料取出し用カバーフィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所: 燃料取出し用カバーフィルター出口の■)   | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)              | ②ダストモニタ<br>(月間平均)              | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率        | 排気設備の定<br>格流量               | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)       | Cs-137<br>(②×⑥×⑦)                                | 4号機合計(Cs-134+Cs-137) |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値 | <3.8E+02                    | <3.0E+02                | <4.7E+03   |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  |                  |               | 1~4号機<br>Cs-134合計           | 1~4号機<br>Cs-137合計       | 1~4号機合計(Cs-134+Cs-137)                           |                      |          |   |
|     |   |                                   |                                |                       |                      |                      |                  |                  |               | <6.2E+03                    | <5.2E+03                | <1.1E+04   |                      |          |   |





※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>であることを意味する。  
 ※ ND(〇.〇E-〇)とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>の検出限界値未満であることを意味する。  
 ※ <〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>未満であることを意味する。

【解説】1~4号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 【例】2020年4月 評価分（詳細データ）

| 機組  | 評価区分               | ダストモニタデータ<br>(図中の▲で採取) |                   | ダスト採取期間 |                      | ダスト採取日      | ダスト測定結果          |                  | 相対比              |                                   | 月間漏洩率評価                           |                                  | 放出量評価の号機ごとの合計値       |  |
|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     |                    | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)   | ②ダストモニタ<br>(月間平均) | ③ダスト採取日 | ④ダスト測定結果<br>(Cs-134) |             | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷②) | ⑦Cs-134<br>(③÷⑤) | ⑧Cs-137<br>(④÷⑥)                  | ⑨Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                | ⑩Cs-137<br>(②×⑥×⑧)               |                      |  |
| 1号機 | 2. 機器ハッチ           | 2.1E-06                | 2.5E-06           | 4月6日    | ND(8.4E-08)          | 2.1E-07     | 1.5E-02          | 9.7              | 1.5E+08          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><1.5E+01 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br>3.7      | Cs-134合計<br><1.9E+02             | Cs-137合計<br><4.2E+02 |  |
|     | 3. PCVガス管理システム     | 1.3E+01                | 1.3E+01           | 4月6日    | ND(1.2E-06)          | ND(1.4E-06) | 9.3E-08          | 1.0E-07          | 2.5E+07          | <3.0E+01                          | <3.3E+01                          | 1号機合計(Cs-134+Cs-137)<br><6.1E+02 |                      |  |
|     | 1. 原子炉直上部          |                        |                   |         |                      |             |                  |                  |                  |                                   |                                   |                                  |                      |  |
| 2号機 | 1. 排気設備出口          | 2.3E-06                | 6.2E-07           | 4月10日   | ND(8.7E-08)          | ND(8.6E-08) | 3.8E-02          | 3.8E-02          | 1.0E+10          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><2.4E+02 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br><2.3E+02 |                                  |                      |  |
|     | 2. 開口の隙間及びBOP隙間    |                        |                   |         |                      |             |                  |                  |                  |                                   |                                   |                                  |                      |  |
|     | 3. PCVガス管理システム     | 9.3E-06                | 9.2E-06           | 4月10日   | ND(9.5E-07)          | ND(6.8E-07) | 1.0E-01          | 7.3E-02          | 1.8E+07          |                                   |                                   |                                  |                      |  |
| 3号機 | 1. 原子炉直上部          | 4.6E-06                | 4.2E-06           | 4月3日    | ND(9.8E-08)          | 7.6E-07     | 2.1E-02          | 1.7E-01          | 1.8E+08          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><1.6E+01 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br>1.2E+02  | Cs-134合計<br><7.5E+03             | Cs-137合計<br><3.1E+04 |  |
|     | 2. 燃料取出し用カバ-隙間     | 5.3E-06                | 3.6E-06           | 4月3日    | ND(1.2E-07)          | 2.6E-07     | 2.3E-02          | 4.9E-02          | 3.8E+09          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><3.1E+02 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br>6.9E+02  | 3号機合計(Cs-134+Cs-137)<br><3.9E+04 |                      |  |
|     | 3. 燃料取出し用カバ-排気設備出口 | 6.6E-06                | 6.6E-06           | 4月3日    | ND(9.7E-08)          | ND(8.3E-08) | 1.5E-02          | 1.2E-02          | 3.0E+10          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><2.9E+03 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br><2.5E+03 |                                  |                      |  |
|     | 4. 機器ハッチ           | 4.4E-06                | 8.1E-06           | 4月3日    | ND(5.1E-07)          | 3.3E-06     | 1.2E-01          | 7.7E-01          | 4.5E+09          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><4.2E+03 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br>2.8E+04  |                                  |                      |  |
|     | 5. PCVガス管理システム     | 1.2E-05                | 1.1E-05           | 4月3日    | ND(8.9E-07)          | ND(9.4E-07) | 7.7E-02          | 8.2E-02          | 1.7E+07          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><1.5E+01 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br><1.6E+01 |                                  |                      |  |
| 4号機 | 1. 燃料取出し用カバ-隙間     | 3.2E-07                | 6.0E-07           | 4月13日   | ND(4.7E-08)          | ND(4.4E-08) | 1.5E-01          | 1.3E-01          | 6.9E+09          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><6.1E+02 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br><5.6E+02 | 1~4号機の合計値を<br>記載している。            |                      |  |
|     | 2. 燃料取出し用カバ-排気設備   | 7.1E-07                | 1.5E-07           | 4月13日   | ND(9.9E-09)          | ND(9.0E-09) | 1.4E-02          | 1.3E-02          | 5.0E+10          | Cs-134<br>(2)×(5)×(7)<br><1.0E+02 | Cs-137<br>(2)×(6)×(8)<br><9.2E+01 |                                  |                      |  |

※ 0.0E-0とは、0.0×10<sup>-0</sup>であることを意味する。  
 ※ ND(0.0E-0)とは、0.0×10<sup>-0</sup>の検出限界値未満であることを意味する。  
 ※ <0.0E-0とは、0.0×10<sup>-0</sup>未満であることを意味する。

|                   |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1~4号機<br>Cs-134合計 | 1~4号機<br>Cs-137合計 | 1~4号機合計(Cs-134+Cs-137) |
| <9.2E+03          | <4.3E+04          | <5.2E+04               |

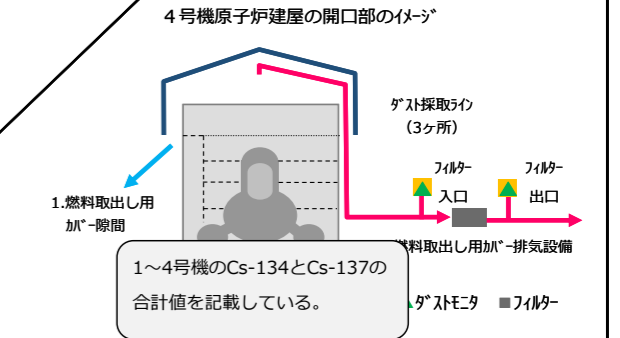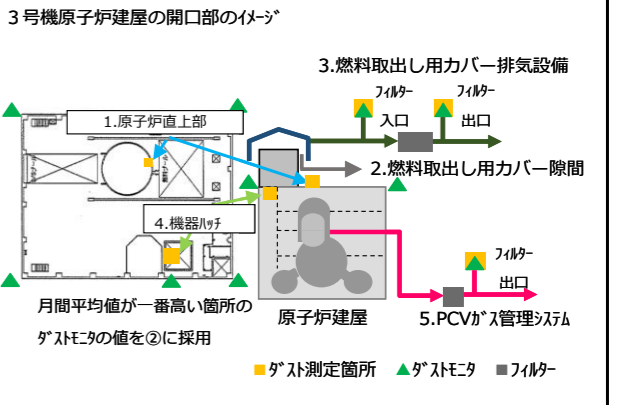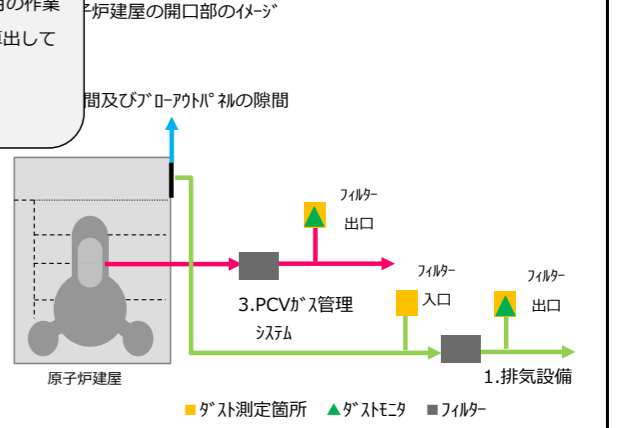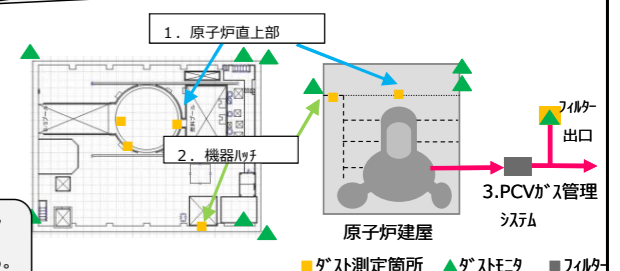




参考1 空气中放射性物質濃度の評価方法

月1回の空气中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価する。

●STEP1

月間の連続ダストモニタのトレンドを確認する。  
 ※連続ダストモニタは、全βのため被ばく評価に使用できないため。

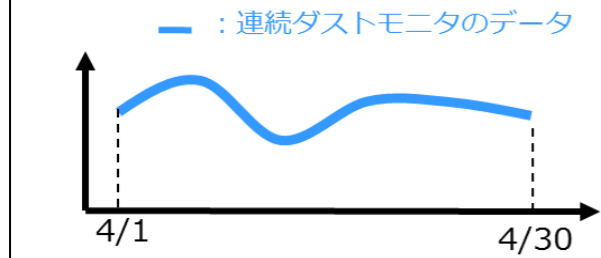


●STEP2

月1回の空气中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較する。

- 4月8日に月1回の空气中放射性物質濃度を測定・・・①
  - ⇒核種毎(Cs-134, Cs-137)にデータが得られる。
  - 同時刻の連続ダストモニタの値を確認する。・・・②
  - 上記2つのデータの相対比を評価する。・・・③
- ③相対比 = ①空气中放射性物質濃度 ÷ ②ダストモニタの値

● : 空气中放射性物質濃度測定結果  
 ● : 4月8日の連続ダストモニタデータ




●STEP3

連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価する。

- 連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価する。

— : 連続性を考慮した空气中放射性物質濃度  
 — : 連続ダストモニタデータ




参考2 建屋の開口部の月間漏洩率の評価方法

●評価方法  
 月間漏洩率は日々の外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

●計算条件  
 北北西 2.2m/s

1号機建屋の月間漏洩率の計算例

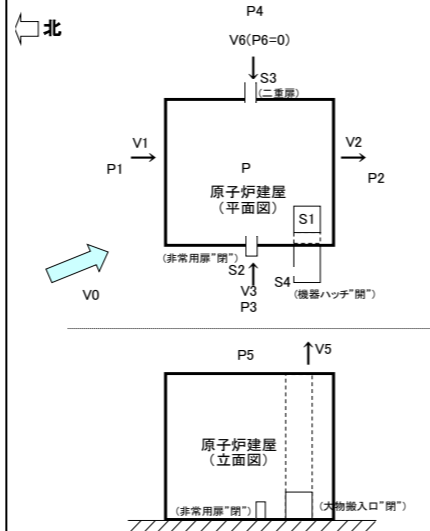

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: 上部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 機器ハッチ隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: R/B大物搬入口横扉 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(北風上側)
- C2: 風圧係数(北風下側)
- C3: 風圧係数(西風上側)
- C4: 風圧係数(西風下側)
- C5: 風圧係数(上部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北風): P1=C1 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (1)
- 下流側(北風): P2=C2 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (2)
- 上流側(西風): P3=C3 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (3)
- 下流側(西風): P4=C4 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (4)
- 上部部 : P5=C5 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- P1-P=ζ × ρ × V1<sup>2</sup> / (2g) ... (6)
- P-P2=ζ × ρ × V2<sup>2</sup> / (2g) ... (7)
- P3-P=ζ × ρ × V3<sup>2</sup> / (2g) ... (8)
- P-P4=ζ × ρ × V4<sup>2</sup> / (2g) ... (9)
- P-P5=ζ × ρ × V5<sup>2</sup> / (2g) ... (10)
- P6-P=ζ × ρ × V6<sup>2</sup> / (2g) ... (11)

空気流入量のマスバランス式は  
 (V1 × S4 + V3 × S2 + V6 × S3) × 3600 = (V2 × 0 + V4 × 0 + V5 × S1) × 3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると  
 Y = (V1 × S4 + V3 × S2 + V6 × S3) × 3600 - (V2 × 0 + V4 × 0 + V5 × S1) × 3600

V1, V2, V3, V4, V5, V6は(6), (7), (8), (9), (10), (11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

|                         |                         |                         |                         |       |       |      |                           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| V0<br>(m/s)             | C1                      | C2                      | C3                      | C4    | C5    | ζ    | ρ<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 2.20                    | 0.80                    | -0.50                   | 0.10                    | -0.50 | -0.40 | 2.00 | 1.20                      |
| S1<br>(m <sup>2</sup> ) | S2<br>(m <sup>2</sup> ) | S3<br>(m <sup>2</sup> ) | S4<br>(m <sup>2</sup> ) |       |       |      |                           |
| 0.73                    | 0.00                    | 0.29                    | 0.10                    |       |       |      |                           |

|            |            |            |            |            |            |           |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | P6<br>(Pa) | P<br>(Pa) |
| 0.237061   | -0.14816   | 0.029633   | -0.14816   | -0.11853   | 0          | -0.08078  |

|             |             |             |             |             |             |                          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | Y<br>(m <sup>3</sup> /h) |
| 1.61        | 0.74        | 0.95        | 0.74        | 0.56        | 0.81        | 0.00                     |
| IN          | OUT         | IN          | OUT         | OUT         | IN          | OK                       |


※IN : 流入  
 OUT: 流出

漏洩率 1.459 m<sup>3</sup>/h

2号機R/B-アウトR 隙間の月間漏洩率の計算例

●評価方法  
 月間漏洩率は日々の外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

●計算条件  
 北北西 2.2m/s

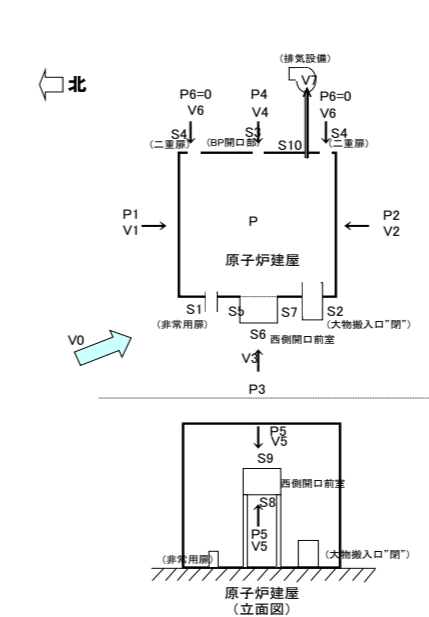

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- V7: 排気風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (南) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (東) (Pa)
- P5: 床面圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: 大物搬入口開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: BP隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: R/B二重扉(南北)開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S5: 西側開口前室北側開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S6: 西側開口前室西側開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S7: 西側開口前室南側開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S8: 西側開口前室床部開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S9: 西側開口前室上部開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S10: 排気ダクト面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(床面)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北): P1=C1 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (1)
- 下流側(南): P2=C2 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (2)
- 上流側(西): P3=C3 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (3)
- 下流側(東): P4=C4 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (4)
- 床面 : P5=C5 × ρ × V0<sup>2</sup> / (2g) ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- P1-P=ζ × ρ × V1<sup>2</sup> / (2g) ... (6)
- P2-P=ζ × ρ × V2<sup>2</sup> / (2g) ... (7)
- P3-P=ζ × ρ × V3<sup>2</sup> / (2g) ... (8)
- P4-P=ζ × ρ × V4<sup>2</sup> / (2g) ... (9)
- P5-P=ζ × ρ × V5<sup>2</sup> / (2g) ... (10)
- P6-P=ζ × ρ × V6<sup>2</sup> / (2g) ... (11)

空気流入量のマスバランス式は  
 (V1 × S5 + V2 × S7 + V3 × (S1 + S2 + S6) + V4 × S3 + V5 × (S8 + S9) + V6 × S4) × 3600 = V7 × S10 × 3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると  
 Y = (V1 × S5 + V2 × S7 + V3 × (S1 + S2 + S6) + V4 × S3 + V5 × (S8 + S9) + V6 × S4) × 3600 - V7 × S10 × 3600

V1 ~ V6は(6) ~ (11)により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                           |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| V0<br>(m/s)             | C1                      | C2                      | C3                      | C4                      | C5                      | ζ                       | ρ<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |                         |                          |
| 2.20                    | 0.80                    | -0.50                   | 0.10                    | -0.50                   | -0.40                   | 2.00                    | 1.20                      |                         |                          |
| S1<br>(m <sup>2</sup> ) | S2<br>(m <sup>2</sup> ) | S3<br>(m <sup>2</sup> ) | S4<br>(m <sup>2</sup> ) | S5<br>(m <sup>2</sup> ) | S6<br>(m <sup>2</sup> ) | S7<br>(m <sup>2</sup> ) | S8<br>(m <sup>2</sup> )   | S9<br>(m <sup>2</sup> ) | S10<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 0.000                   | 0.000                   | 0.340                   | 0.000                   | 0.010                   | 0.230                   | 0.226                   | 0.001                     | 0.000                   | 0.500                    |

|            |            |            |            |            |            |           |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | P6<br>(Pa) | P<br>(Pa) |
| 0.062586   | -0.03912   | 0.007823   | -0.03912   | -0.03129   | 0          | -1.47714  |


|             |             |             |             |             |             |             |                          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | V7<br>(m/s) | Y<br>(m <sup>3</sup> /h) |
| 3.55        | 3.43        | 3.48        | 3.43        | 3.44        | 3.47        | 5.56        | 0.00                     |
| IN          | IN          | IN          | IN          | IN          | IN          | OUT(排気)     | OK                       |

※IN : 流入  
 OUT: 流出

漏洩率 0 m<sup>3</sup>/h



3号機原子炉建屋機器ハッチの月間漏洩率の計算例

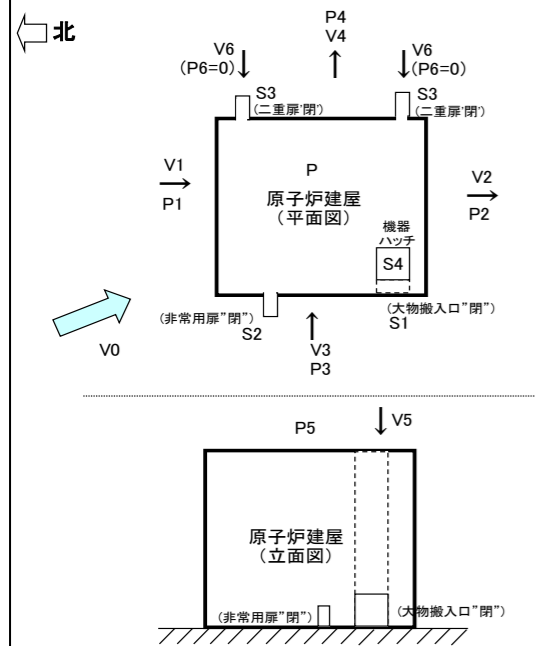

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力(北) (Pa)
- P2: 下流側圧力(南) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西) (Pa)
- P4: 下流側圧力(東) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: R/B大物搬入口面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: 機器ハッチ隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(上面部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。  
 上流側(北): P1=C1×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (1)  
 下流側(南): P2=C2×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (2)  
 上流側(西): P3=C3×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (3)  
 下流側(東): P4=C4×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (4)  
 上面部: P5=C5×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると  
 P1-P=ζ×ρ×V1<sup>2</sup>/(2g) ... (6)  
 P-P2=ζ×ρ×V2<sup>2</sup>/(2g) ... (7)  
 P3-P=ζ×ρ×V3<sup>2</sup>/(2g) ... (8)  
 P-P4=ζ×ρ×V4<sup>2</sup>/(2g) ... (9)  
 P5-P=ζ×ρ×V5<sup>2</sup>/(2g) ... (10)  
 P6-P=ζ×ρ×V6<sup>2</sup>/(2g) ... (11)

空気流入量のマスバランス式は  
 (V1×0+V3×(S1+S2)+V5×S4+V6×S3)×3600=(V2×0+V4×0)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると  
 Y=(V1×0+V3×(S1+S2)+V5×S4+V6×S3)×3600-(V2×0+V4×0)×3600

V1~V6は(6)~(11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0 (m/s)             | C1                   | C2                   | C3                   | C4    | C5    | ζ    | ρ (kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|------|------------------------|
| 2.20                 | 0.80                 | -0.50                | 0.10                 | -0.50 | -0.40 | 2.00 | 1.20                   |
| S1 (m <sup>2</sup> ) | S2 (m <sup>2</sup> ) | S3 (m <sup>2</sup> ) | S4 (m <sup>2</sup> ) |       |       |      |                        |
| 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.01                 |       |       |      |                        |


| P1 (Pa)  | P2 (Pa)  | P3 (Pa)  | P4 (Pa)  | P5 (Pa)  | P6 (Pa) | P (Pa)   |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 0.237061 | -0.14816 | 0.029633 | -0.14816 | -0.11853 | 0       | -0.11853 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | V6 (m/s) | Y (m <sup>3</sup> /h) |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1.70     | 0.49     | 1.10     | 0.49     | 0.00     | 0.98     | 0.00                  |
| IN       | OUT      | IN       | OUT      | IN       | IN       | OK                    |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率 0 m<sup>3</sup>/h

3号機燃料取出し用カバーの月間漏洩率の計算例

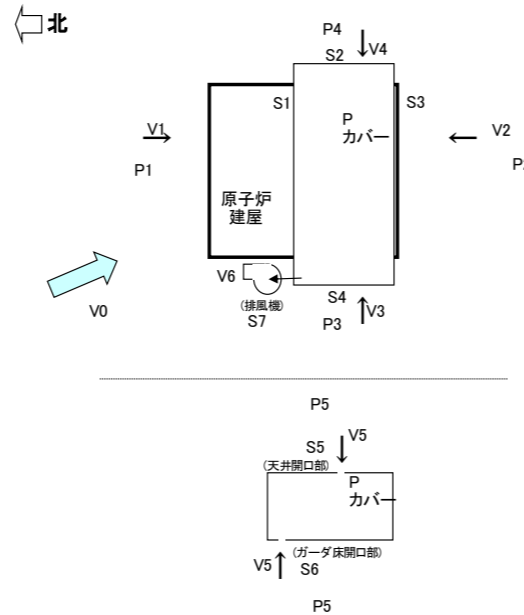

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流入風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流出風速 (m/s)
- V6: 排気風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力(北) (Pa)
- P2: 下流側圧力(南) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西) (Pa)
- P4: 下流側圧力(東) (Pa)
- P5: 上下部圧力 (Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S5: カバー天井部隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S6: ガータ床隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S7: 排気ダクト吸込口面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(風上側(北))
- C2: 風圧係数(風下側(南))
- C3: 風圧係数(風上側(西))
- C4: 風圧係数(風下側(東))
- C5: 風圧係数(上下部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。  
 上流側(北): P1=C1×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (1)  
 下流側(南): P2=C2×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (2)  
 上流側(西): P3=C3×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (3)  
 下流側(東): P4=C4×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (4)  
 上面部: P5=C5×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると  
 P1-P=ζ×ρ×V1<sup>2</sup>/(2g) ... (6)  
 P-P2=ζ×ρ×V2<sup>2</sup>/(2g) ... (7)  
 P3-P=ζ×ρ×V3<sup>2</sup>/(2g) ... (8)  
 P-P4=ζ×ρ×V4<sup>2</sup>/(2g) ... (9)  
 P5-P=ζ×ρ×V5<sup>2</sup>/(2g) ... (10)

空気流入量のマスバランス式は  
 (V1×S1+V2×S3+V3×S4+V4×S2+V5×(S5+S6))×3600=V6×S7×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると  
 Y=(V1×S1+V2×S3+V3×S4+V4×S2+V5×(S5+S6))×3600-V6×S7×3600

V1, V2, V3, V4, V5は(6), (7), (8), (9), (10)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0 (m/s)             | C1                   | C2                   | C3                   | C4                   | C5                   | ζ                    | ρ (kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.20                 | 0.80                 | -0.50                | 0.10                 | -0.50                | -0.40                | 2.00                 | 1.20                   |
| S1 (m <sup>2</sup> ) | S2 (m <sup>2</sup> ) | S3 (m <sup>2</sup> ) | S4 (m <sup>2</sup> ) | S5 (m <sup>2</sup> ) | S6 (m <sup>2</sup> ) | S7 (m <sup>2</sup> ) |                        |
| 2.56                 | 0.41                 | 2.56                 | 0.41                 | 0.36                 | 4.47                 | 4.76                 |                        |


| P1 (Pa)  | P2 (Pa)  | P3 (Pa)  | P4 (Pa)  | P5 (Pa)  | P (Pa)   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0.237061 | -0.14816 | 0.029633 | -0.14816 | -0.11853 | -0.15398 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | V6 (m/s) | Y (m <sup>3</sup> /h) |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1.79     | 0.22     | 1.22     | 0.22     | 0.54     | 1.75     | 0.00                  |
| IN       | IN       | IN       | IN       | IN       | OUT(排気)  | OK                    |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩量 0 m<sup>3</sup>/h

4号機燃料取出し用カバーの月間漏洩率の計算例

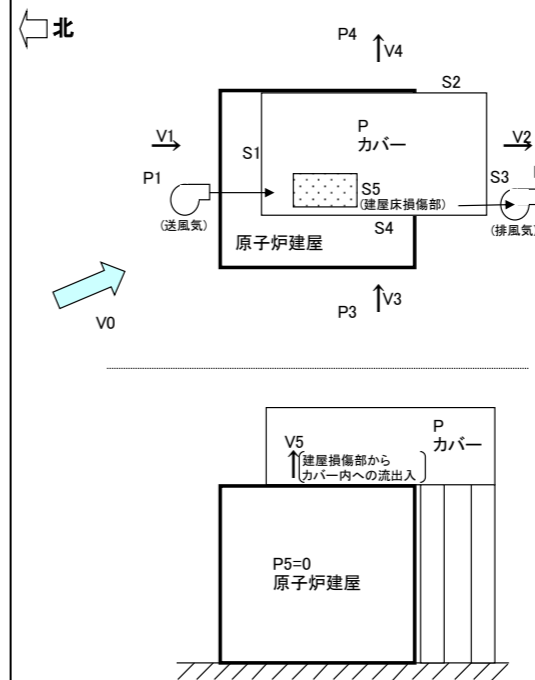

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流出風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流出風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力(北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力(北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力(西風) (Pa)
- P5: R/B内圧力 (0Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S5: 建屋床損傷部隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(北風上側)
- C2: 風圧係数(北風下側)
- C3: 風圧係数(西風上側)
- C4: 風圧係数(西風下側)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。  
 上流側(北風): P1=C1×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (1)  
 下流側(北風): P2=C2×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (2)  
 上流側(西風): P3=C3×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (3)  
 下流側(西風): P4=C4×ρ×V0<sup>2</sup>/(2g) ... (4)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると  
 P1-P=ζ×ρ×V1<sup>2</sup>/(2g) ... (5)  
 P-P2=ζ×ρ×V2<sup>2</sup>/(2g) ... (6)  
 P3-P=ζ×ρ×V3<sup>2</sup>/(2g) ... (7)  
 P-P4=ζ×ρ×V4<sup>2</sup>/(2g) ... (8)  
 P5-P=ζ×ρ×V5<sup>2</sup>/(2g) ... (9)

空気流入量のマスバランス式は  
 (V1×S1+V3×S4+V5×S5)×3600=(V2×S3+V4×S2)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると  
 Y=(V1×S1+V3×S4+V5×S5)×3600-(V2×S3+V4×S2)×3600

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0 (m/s)             | C1                   | C2                   | C3                   | C4                   | ζ    | ρ (kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------------------------|
| 2.20                 | 0.80                 | -0.50                | 0.10                 | -0.50                | 2.00 | 1.20                   |
| S1 (m <sup>2</sup> ) | S2 (m <sup>2</sup> ) | S3 (m <sup>2</sup> ) | S4 (m <sup>2</sup> ) | S5 (m <sup>2</sup> ) |      |                        |
| 0.44                 | 0.81                 | 0.46                 | 0.81                 | 4.00                 |      |                        |

| P1 (Pa)  | P2 (Pa)  | P3 (Pa)  | P4 (Pa)  | P5 (Pa) | P (Pa)   |
|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 0.237061 | -0.14816 | 0.029633 | -0.14816 | 0       | -0.00102 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | Y (m <sup>3</sup> /h) |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1.39     | 1.10     | 0.50     | 1.10     | 0.09     | 0.00                  |
| IN       | OUT      | IN       | OUT      | IN       | OK                    |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率 4,980 m<sup>3</sup>/h

# 1号機オペフロ連続ダストモニタの停止事象 に伴う放出量評価について

2022年1月25日



**TEPCO**

---


東京電力ホールディングス株式会社

- 2021年12月27日、1号機R/Bオペフロダストモニタ（A,B,E,F系）が停止し、停止期間中（※1）各モニタのダスト濃度が欠測した。
  - 以下の2点の事由から、ダストモニタ停止期間の1号機オペフロにおけるダスト濃度を、停止期間を除く2021年12月の平均ダスト濃度と同等なものとして放出量を評価する（※2）。
    - （1）ダストモニタが停止していた期間においては1号機オペフロ上で作業が実施されていないこと
    - （2）モニタリングポスト、敷地境界線ダストモニタ、構内連続ダストモニタ、及び構内線量表示器の指示値に変動が見られていないこと
- （※1） 停止期間：2021年12月27日 6：52～21：00
- （※2） 【発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針】では「欠測となった期間については、原則として、最小集計期間の平均濃度値が継続したものとして補正する」とある。放出量評価における最小集計期間は1ヶ月分の平均ダスト濃度であることから、欠測期間中も12月分の平均ダスト濃度が継続したものとして放出量を評価した。

- 1号機R/Bオペフロダストモニタ停止期間について、モニタリングポスト及び1号機付近の構内線量表示器に有意な変動なし

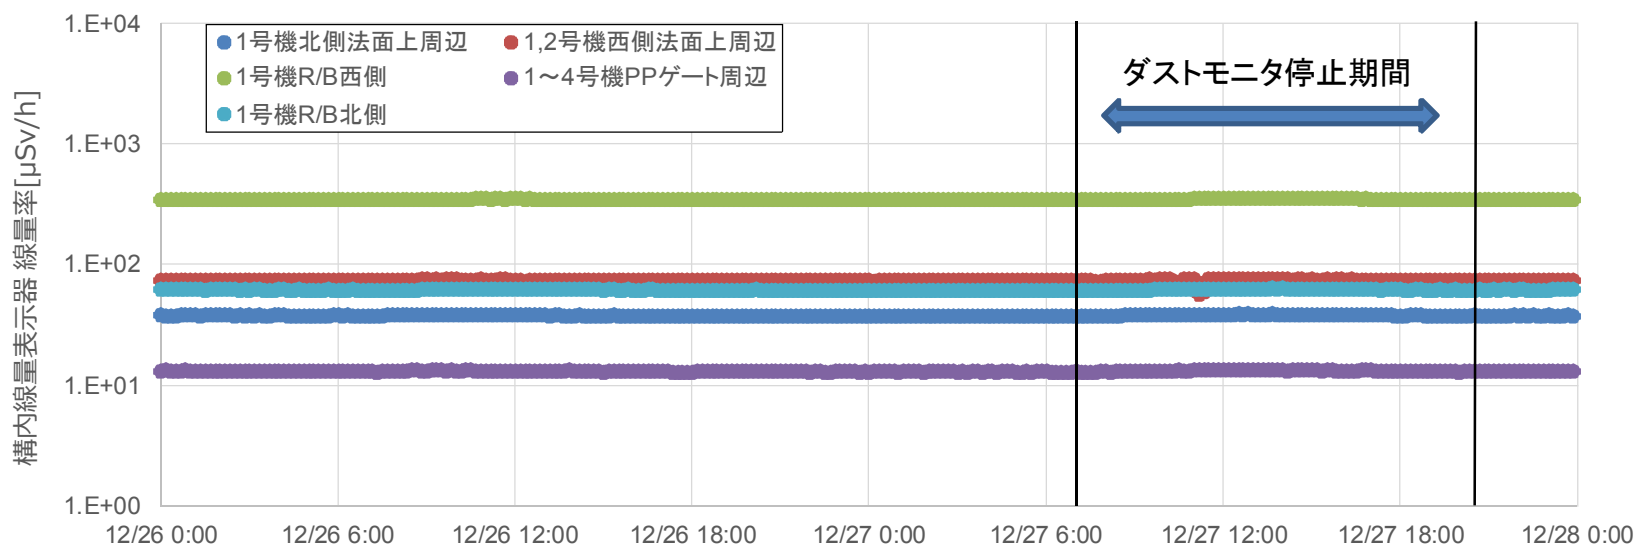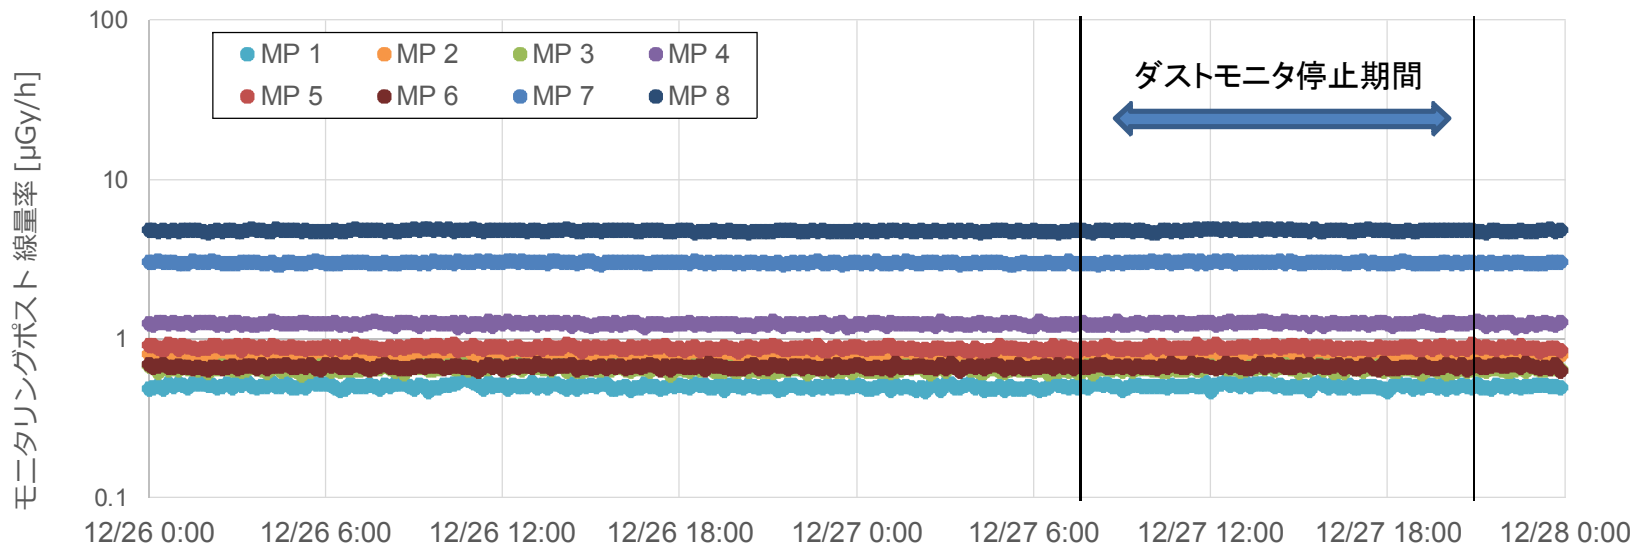

- 1号機R/Bオペフロダストモニタ停止期間について、1号機付近の構内連続ダストモニタに有意な変動なし

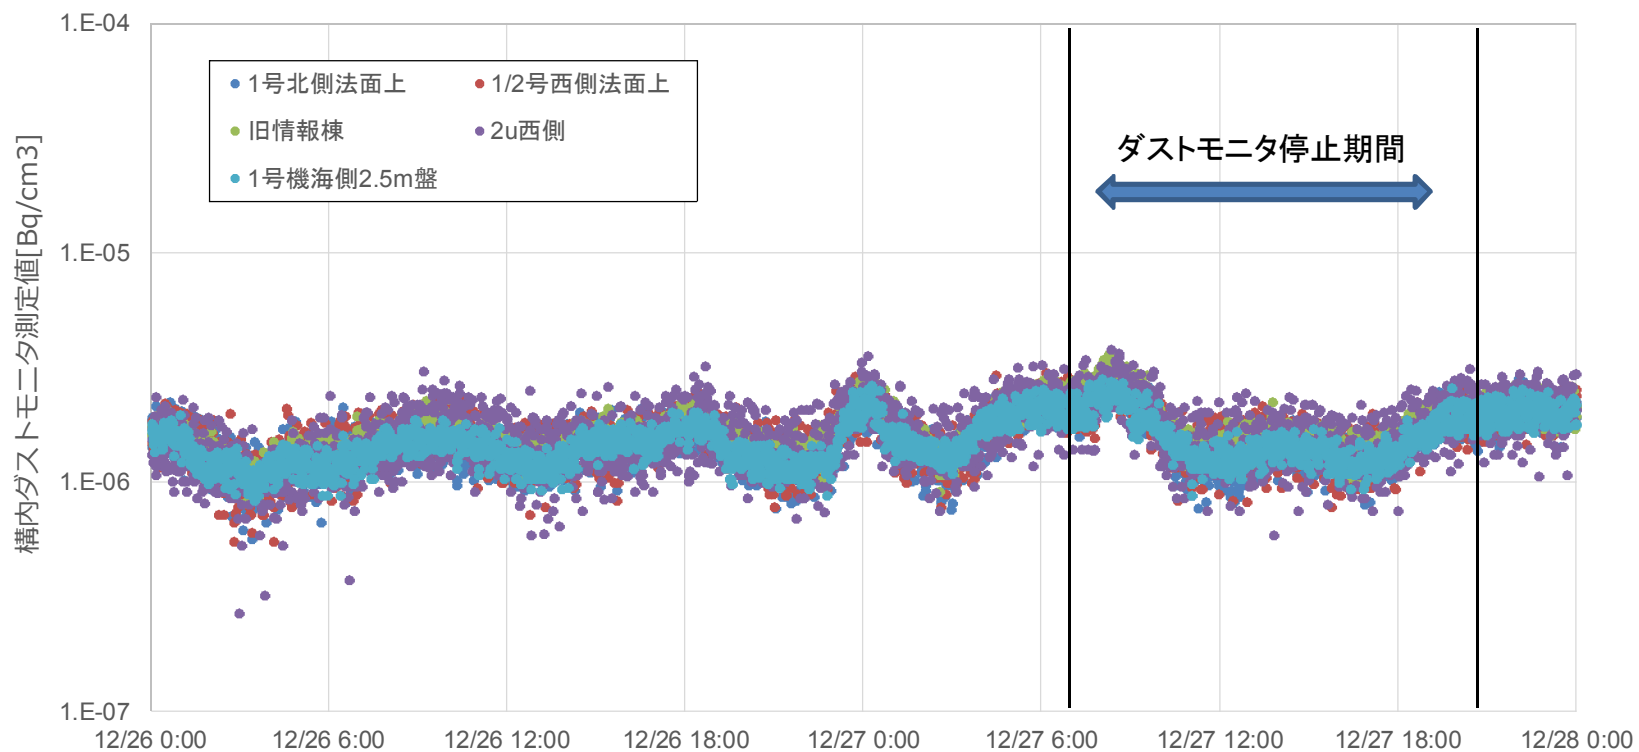



# 福島第一原子力発電所 護岸地下水サンプリング分析の変動調査について

< 参 考 資 料 >  
2022年1月20日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 護岸地下水のサンプリング分析結果において、2021年11月以降、9地点※で過去最高値の更新が発生しており、原因調査を実施しますので、お知らせします。  
※セシウム-137：8地点，全ベータ：1地点（当該観測孔の位置は次ページ参照）
- 観測孔付近で実施している防潮堤工事の振動等により、観測孔の底部に蓄積している粒子状物質（水中に浮遊し、水に溶けない固体粒子）の舞い上がることが影響している可能性があり、1月21日以降準備が整い次第、以下の調査を実施します。
  - ・ 調査①：護岸地下水の粒子状放射能濃度分析  
定例分析後の試料をろ過し、ガンマ核種分析（セシウム-134、セシウム-137）および全ベータ放射能濃度分析を実施します。
  - ・ 調査②：観測孔内部の確認  
観測孔底部およびサンプリング位置（底部から1m上）の状況（蓄積している懸濁物等）をカメラで確認します。
- また、1月13日の護岸地下水No.0-3-2のセシウム-137で過去最高値を更新したことを受け、上記の調査方法により、先行して分析を実施したところ、粒子状物質よりもイオン状物質の影響が有意であることを確認しました。
- なお、護岸には海側遮水壁や地盤改良を設置・施工し汚染水を漏らさない対策を実施しており、港湾内、特に1～4号機開渠内のサンプリングに有意な変動はありません。

## 【調査①】 護岸地下水の粒子状放射能濃度分析

調査対象※1の護岸地下水について、定例分析後の試料をろ過※2し、分析を行います。

- 調査期間：1ヶ月程度（最高値出現時の分析結果等を踏まえ、調査期間を判断）
- 分析内容：ガンマ核種分析（セシウム-134、セシウム-137）、全ベータ放射能濃度分析

## 【調査②】 観測孔内部の確認


調査対象※1の観測孔底部およびサンプリング位置（底部から1m上）の状況をカメラで確認します。

- 実施回数：各箇所 1回

※1 調査対象（5箇所）の護岸地下水観測孔

- ・ No.0-3-2（深さ約13m、毎週月・木曜サンプリング）
- ・ No.1（深さ約16m、毎週火・金曜サンプリング）
- ・ No.1-6（深さ約16m、毎週火・金曜サンプリング）
- ・ No.2-6（深さ約 5m、毎週水・金曜サンプリング） ←比較用
- ・ No.3-3（深さ約16m、毎週木曜サンプリング） ←比較用

※2 孔径0.45μmのフィルタでろ過しフィルタの粒子状物質の放射性物質を測定

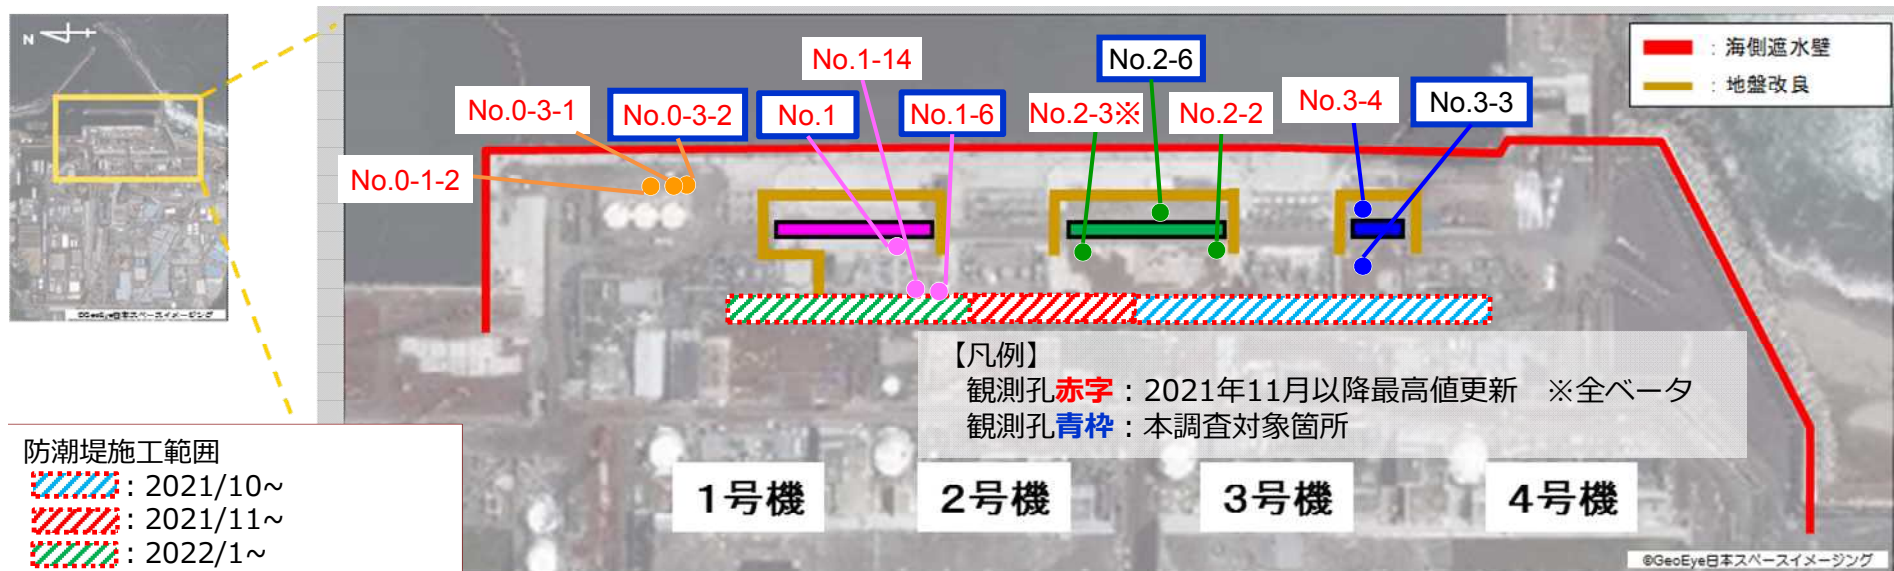

## <参考> 護岸地下水No.0-3-2の分析結果

- 護岸地下水観測孔No.0-3-2において、2022年1月13日にセシウム-137が過去最高値を更新したことから、先行して調査を実施しました。
- 分析の結果、粒子状物質よりもイオン状物質の影響が有意であることを確認しました。

### 【上昇前】

単位：Bq/L

| 試料名             | 採取日時      | Cs-134 | Cs-137 | 全β | H-3    |
|-----------------|-----------|--------|--------|----|--------|
| No.0-3-2        | 1/10 8:36 | <0.24  | 2.3    | 72 | 19,000 |
| No.0-3-2(粒子状物質) | 1/10 8:36 | <0.67  | <0.56  | 36 | -      |

### 【上昇後】

単位：Bq/L

| 試料名             | 採取日時      | Cs-134 | Cs-137 | 全β  | H-3    |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----|--------|
| No.0-3-2        | 1/13 7:15 | 2.4    | 75     | 350 | 11,000 |
| No.0-3-2(粒子状物質) | 1/13 7:15 | <0.67  | 1.5    | 94  | -      |
