資料１

泊３号炉　耐震設計方針説明スケジュール

2023年10月16日
北海道電力株式会社

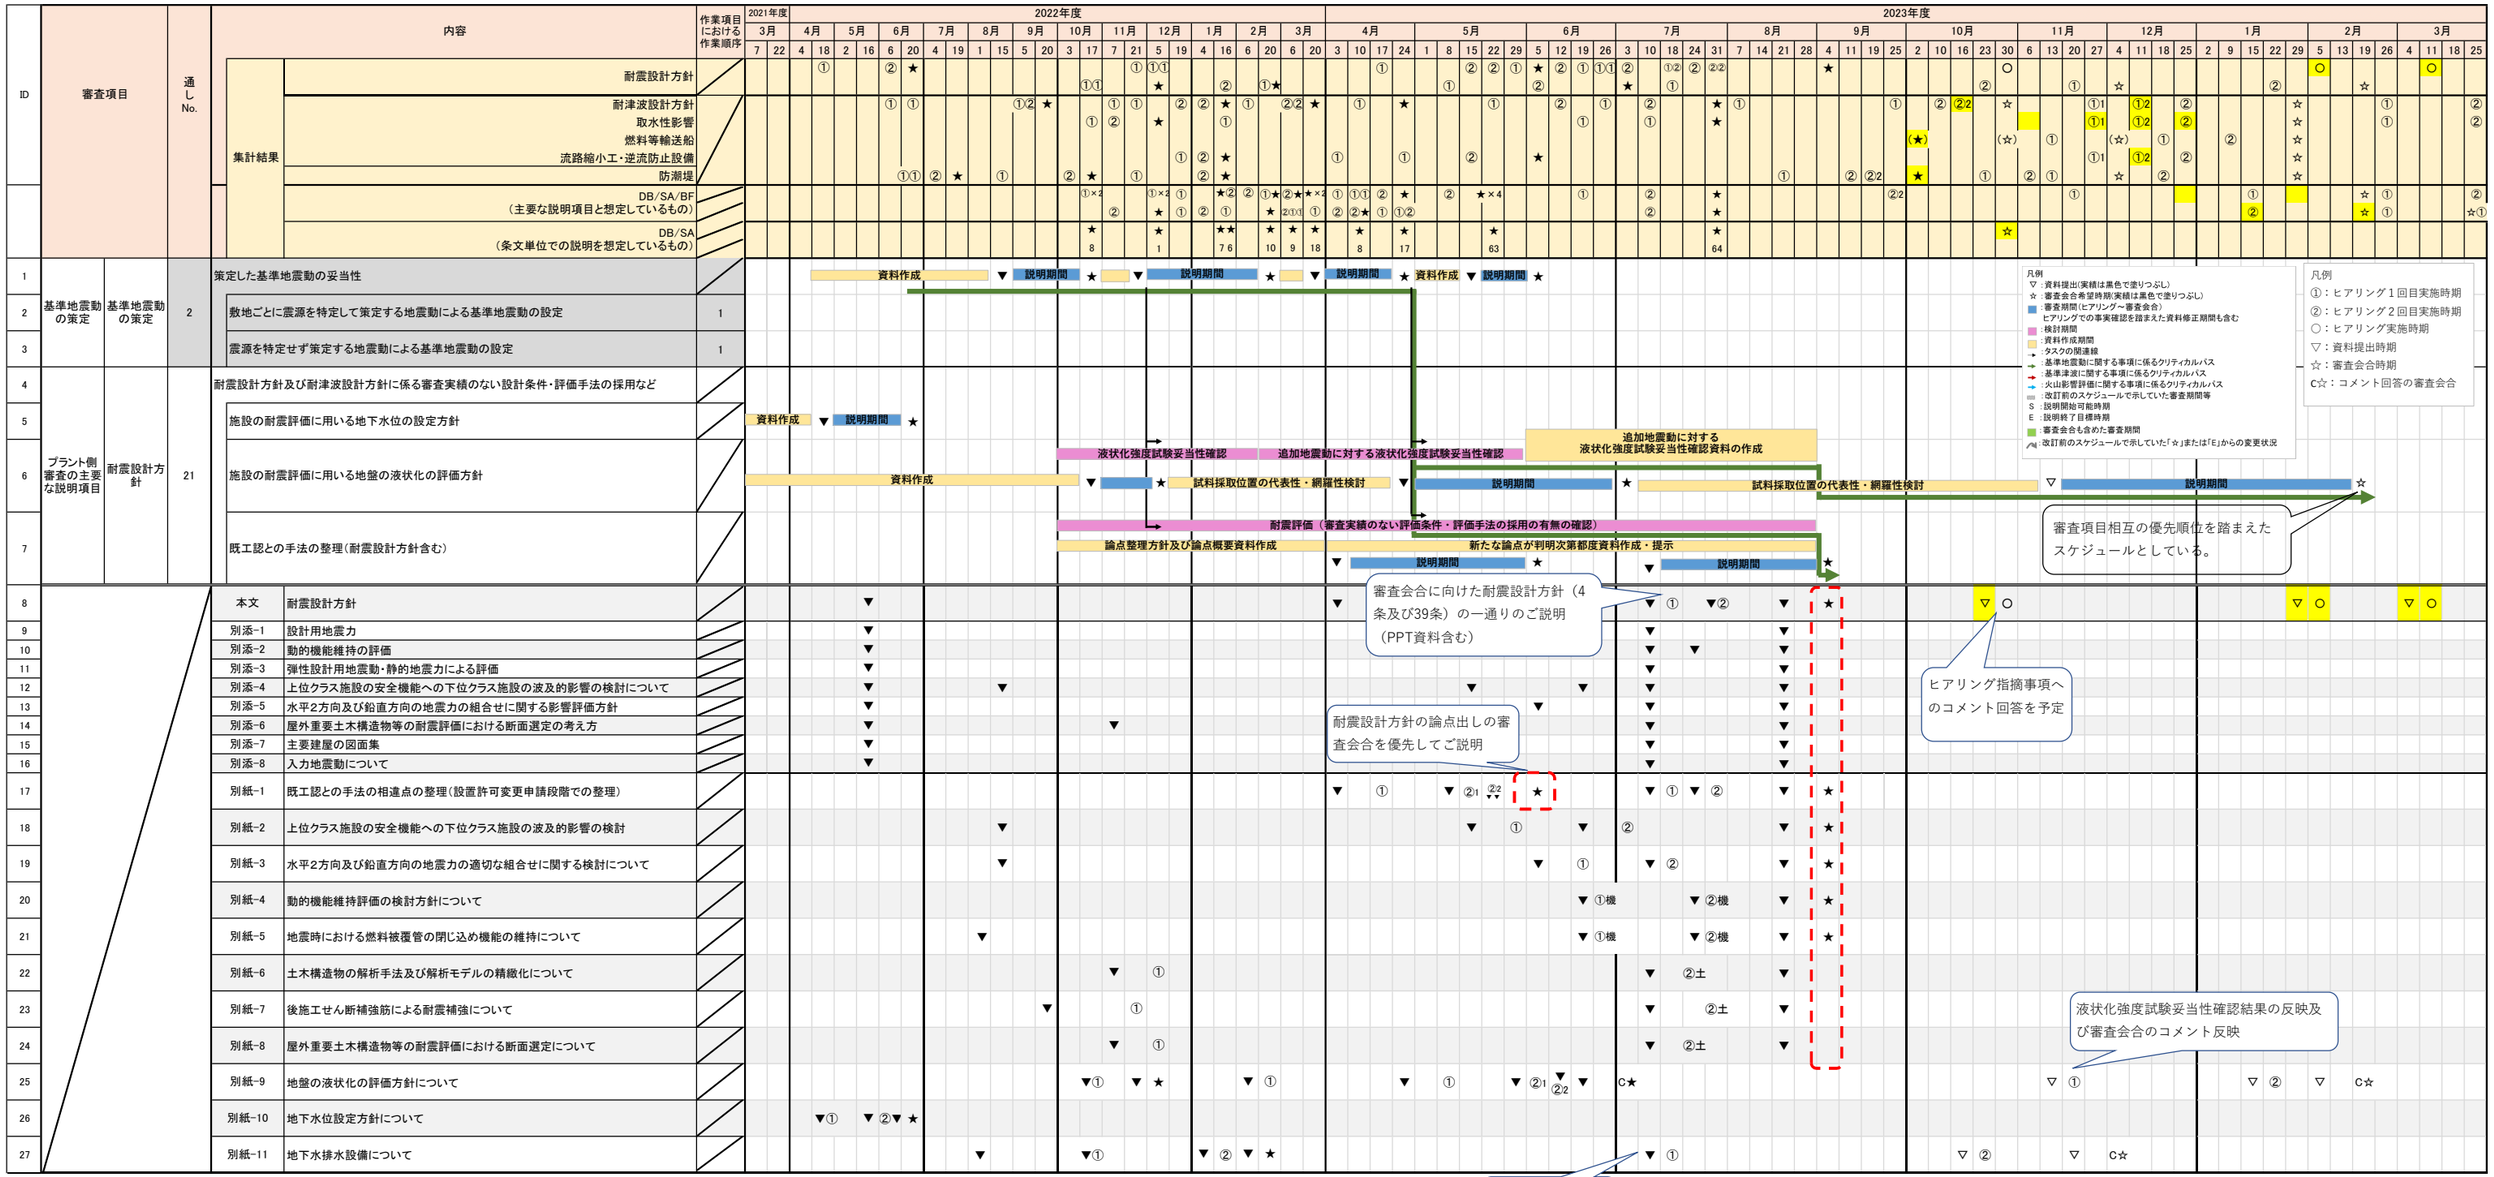

【スケジュールの作成方法について】
1. スケジュールの上段では審査会合で提示するスケジュールから，耐震設計方針及び耐津波設計方針に係る内容について抽出しております。
2. それを基にスケジュールの下段にて前タスクとなる事項との関連を考慮して資料提出，ヒアリング，審査会合の希望時期をプロットしたうえで，ヒアリングや審査会合が輻輳する時期を極力少なくするように配置しております。
3. その中でもクリティカルパスに係る箇所およびサブクリティカルとなり得る箇所については背景色を変えております。加えてクリティカルパスとなる箇所については下部に矢印も表記しております。
4. ヒアリングや審査会合の輻輳状況を確認するため，最上段に耐震設計方針と耐津波設計方針に係るヒアリング及び審査会合の状況がわかるように各々を集計した結果を示しております。
5. 上記の検討結果を踏まえて，スケジュール上段のバーを更新し，更新前のバーは灰色の影で示しております。

泊３号炉　耐津波設計方針説明スケジュール

2023年10月16日
北海道電力株式会社

ID	審査項目		通しNo.	内容	作業項目に対する作業順序
1	基準地震動の策定	基準地震動の策定	2	策定した基準地震動の妥当性	
2				敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動の設定	1
3				震源を特定せず策定する地震動による基準地震動の設定	1
4	基準津波の策定	基準津波の策定	7	日本海東縁部に想定される地震による津波と陸上地すべりによる津波の組合せの評価結果	
5				重畳の時間差の設定	1
6				同一波動場での一体計算	2
7			7'	茶津入構トンネル及びSAアクセスルートトンネル設置に伴う基準津波への影響評価	
8				日本海東縁部に想定される津波波源の再評価	1
9				同一波動場での一体計算	2
10	プラント側審査の主要な説明項目	耐津波設計方針	21	耐津波設計に係る解析工程	
11				耐津波設計方針	
12				取水性への影響評価	
13				漂流物の影響評価	
13-1				燃料等輸送船	
14				防波堤の取水口到達の可能性評価	
15				取放水路からの流入防止（1号及び2号炉の流路縮小工・逆流防止設備含む）	
16		防潮堤	22	防潮堤に係る残置する防潮堤や建屋からの影響など平面線形形状の決定に影響する事項について模擬を含めた網羅的な整理	
24				耐津波設計方針（第5条）	
25				本文	
26				1. 基本事項（グループ1）	
27				添付資料1 基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置【1. 1】※2	
28				添付資料2 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて【1. 3】※2	
29				添付資料3 地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について【1. 3】※2 添付資料5 管路解析の詳細について【1. 4】※2 添付資料6 入力津波に用いる潮位条件について【1. 5】※2	
30				添付資料4 港湾内の局所的な海面の励起について【1. 4】※2	
31				2. 設計基準対象施設の津波防護方針（グループ2）	
32				添付資料7 津波防護対策の設備の位置づけについて【2. 1】※2 添付資料8 内郭防護において考慮する浸水の遡上・流水量について【2. 4】※2 添付資料9 海水ポンプの水理試験について【2. 5】※2 添付資料11 流水荷重重点化範囲の策定における浸水対策の設置位置、実施範囲及び施工例【2. 4】※2 添付資料15 津波漂流物の調査要領について【2. 5】※2 添付資料20 津波監視設備の監視に関する考え方【2. 6】※2 添付資料30 輸送物及び輸送車両の漂流物評価について【2. 5】※2	
33				添付資料17 津波の流況を踏まえた防波堤の取水口到達の可能性評価について【2. 5】※2	
34				添付資料10 貯留量の算定について【2. 5】※2 添付資料29 屋外排水路に関する設計方針について【2. 2】※2	
35				添付資料12 基準津波に伴う砂移動評価について【2. 5】※2 添付資料13 泊発電所周辺海域における底質土砂の分析結果について【2. 5】※2 添付資料14 海水ポンプの軸受の浮遊砂耐性について【2. 5】※2 添付資料18 燃料等輸送船の係留索の耐力について【2. 5】※2 添付資料19 燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について【2. 5】※2	
36				3. 重大事故等対処施設の津波防護方針，4. 施設・設備の設計・評価の方針	
37				添付資料21 耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて【4. 1】※2 添付資料28 水密扉の運用管理について【4. 2】※2	
38				添付資料23 基準類における衝突荷重算定式について【4. 1】※2 添付資料26 貯留堰の構造及び仕様について【4. 1】※2 添付資料27 貯留堰補予部の漏水量評価について【4. 1】※2	
39				添付資料16 漂流物の評価に考慮する津波の流速・流向について【4. 4】※2 添付資料22 防潮堤及び貯留堰における津波波力の設定方針について【4. 1】※2 添付資料24 耐津波設計において考慮する余震荷重と津波荷重の組合せについて【4. 1】※2	
40				添付資料31　審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針）	
41				取水性への影響評価	
42				漂流物の影響評価	
42-1				燃料等輸送船	
43				防波堤の取水口到達の可能性評価	
44				取放水路からの流入防止（1号及び2号炉の流路縮小工・逆流防止設備含む）	
45				耐津波設計方針（第40条）	

※1　漂流物衝突荷重については方針を説明し、衝突荷重の算定は工事計画認可段階
※2　【】内は別添１目次を示す。

泊３号炉　耐津波設計方針説明スケジュール

2023年10月16日
北海道電力株式会社

ID	審査項目		通しNo.	内容	作業項目における作業順序
				集約結果 耐震設計方針	
				集約結果 耐津波設計方針	
				集約結果 取水性影響	
				集約結果 燃料等輸送船	
				集約結果 流路縮小工・逆流防止設備	
				集約結果 防潮堤	
1	基準地震動の策定	基準地震動の策定	2	策定した基準地震動の妥当性	
2				敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動の設定	1
3				震源を特定せず策定する地震動による基準地震動の設定	1
4	基準津波の策定	基準津波の策定	7	日本海東縁部に想定される地震による津波と陸上地すべりによる津波の組合せの評価結果	
5				重畳の時間差の設定	1
6				同一波動場での一体計算	2
7			7'	茶津入構トンネル及びSAアクセスルートトンネル設置に伴う基準津波への影響評価	
8				日本海東縁部に想定される津波波源の再評価	1
9				同一波動場での一体計算	2
10		耐津波設計方針	21	耐津波設計に係る解析工程	
16				防潮堤に係る残置する防潮堤や建屋からの影響など平面線形形状の決定に影響する事項について根拠を含めた網羅的な整理	
17	プラント側審査の主要な説明項目	防潮堤	22	防潮堤の設計方針・構造成立性評価 添付資料25　防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果について	
18					
19					
20					
21					
22				防潮堤への波及的影響	
23					
46				防潮堤	
47				要求機能と設計方針，構造成立性評価の基本方針，断面の選定	
48				解析条件について	
49				止水目地に関する検討方針	
50				屈曲部に関する設計方針	
51				人工岩盤の施設区分の整理	
52				防潮堤への波及的影響	
53				津波条件を踏まえた設計方針，構造成立性	
54				平面線形形状（入構トンネル他含む）	
55				他条文への影響	
